



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 20/07/2024 a 21/11/2024
				Nº MEDIÇÃO 3	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	130.423,90	207.576,10	338.000,00
1.	CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	-	-	-	338.000,00	-	-	-	130.423,90	207.576,10	338.000,00
1.1.	ESTRUTURAS	-	-	-	46.254,30	-	-	-	44.048,05	2.206,25	46.254,30
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	53,00	223,72	11.857,16	53,00	-	53,00	11.857,16	-	11.857,16
1.1.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,00	13,89	1.319,55	95,00	-	95,00	1.319,55	-	1.319,55
1.1.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	712,00	14,29	10.174,48	712,00	-	712,00	10.174,48	-	10.174,48
1.1.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,50	572,63	2.004,21	3,50	-	3,50	2.004,21	-	2.004,21
1.1.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00	63,99	9.598,50	125,00	25,00	150,00	7.998,75	1.599,75	9.598,50
1.1.6.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,00	62,94	2.202,90	35,00	-	35,00	2.202,90	-	2.202,90
1.1.7.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	150,00	60,65	9.097,50	140,00	10,00	150,00	8.491,00	606,50	9.097,50
1.2.	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	-	-	-	89.020,56	-	-	-	65.576,85	23.443,71	89.020,56
1.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	550,78	98,11	54.037,03	350,00	200,78	550,78	34.338,50	19.698,53	54.037,03
1.2.2.	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,20	891,71	3.745,18	-	4,20	4,20	-	3.745,18	3.745,18
1.2.3.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,00	567,97	31.238,35	55,00	-	55,00	31.238,35	-	31.238,35
1.3.	ESQUADRIAS	-	-	-	91.454,14	-	-	-	-	91.454,14	91.454,14
1.3.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	48,45	793,58	38.448,95	-	48,45	48,45	-	38.448,95	38.448,95
1.3.2.	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	19,50	1.045,62	20.389,59	-	19,50	19,50	-	20.389,59	20.389,59
1.3.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,20	1.198,12	30.192,62	-	25,20	25,20	-	30.192,62	30.192,62
1.3.4.	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	1.211,49	2.422,98	-	2,00	2,00	-	2.422,98	2.422,98
1.4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	3.941,96	-	-	-	-	3.941,96	3.941,96
1.4.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,28	55,28	-	1,00	1,00	-	55,28	55,28
1.4.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,60	29,20	-	2,00	2,00	-	29,20	29,20





BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24	
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 20/07/2024 a 21/11/2024	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	338.000,00	-	-	-	130.423,90	207.576,10	338.000,00
1.4.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	79,52	79,52	-	1,00	1,00	-	79,52	79,52
1.4.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	36,84	294,72	-	8,00	8,00	-	294,72	294,72
1.4.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,76	263,04	-	4,00	4,00	-	263,04	263,04
1.4.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	65,15	651,50	-	10,00	10,00	-	651,50	651,50
1.4.7.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	12,99	1.039,20	-	80,00	80,00	-	1.039,20	1.039,20
1.4.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	4,37	1.529,50	-	350,00	350,00	-	1.529,50	1.529,50
1.5.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E APARELHOS	-	-	-	26.509,40	-	-	-	-	26.509,40	26.509,40
1.5.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	170,00	13,04	2.216,80	-	170,00	170,00	-	2.216,80	2.216,80
1.5.2.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	16,75	670,00	-	40,00	40,00	-	670,00	670,00
1.5.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	5,82	168,78	-	29,00	29,00	-	168,78	168,78
1.5.4.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	4,61	73,76	-	16,00	16,00	-	73,76	73,76
1.5.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,07	156,84	-	12,00	12,00	-	156,84	156,84
1.5.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	559,20	6.710,40	-	12,00	12,00	-	6.710,40	6.710,40
1.5.7.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	749,88	5.249,16	-	7,00	7,00	-	5.249,16	5.249,16
1.5.8.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	576,87	2.307,48	-	4,00	4,00	-	2.307,48	2.307,48
1.5.9.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	253,01	1.518,06	-	6,00	6,00	-	1.518,06	1.518,06
1.5.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	96,08	192,16	-	2,00	2,00	-	192,16	192,16
1.5.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	65,00	23,31	1.515,15	-	65,00	65,00	-	1.515,15	1.515,15
1.5.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	165,00	29,51	4.869,15	-	165,00	165,00	-	4.869,15	4.869,15





BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	13/05/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
23/2024	CONSORA CONSTRUTORA LTDA	46.812.148/0001-21	(SELECIONAR)		3
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			20/07/2024 a 21/11/2024		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	130.423,90	207.576,10	338.000,00
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.5.13.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	11,22	258,06	-	23,00	23,00	-	258,06	258,06
1.5.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	28,38	312,18	-	11,00	11,00	-	312,18	312,18
1.5.15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	16,19	291,42	-	18,00	18,00	-	291,42	291,42
1.6.	REVESTIMENTO, PINTURA E ARGAMASSAS	-	-	-	67.578,91	-	-	-	20.799,00	46.779,91	67.578,91
1.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.061,56	5,16	5.477,65	450,00	611,56	1.061,56	2.322,00	3.155,65	5.477,65
1.6.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.061,56	41,06	43.587,65	450,00	611,56	1.061,56	18.477,00	25.110,65	43.587,65
1.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	1.061,56	17,44	18.513,61	-	1.061,56	1.061,56	-	18.513,61	18.513,61
1.7.	COBERTURA	-	-	-	11.740,89	-	-	-	-	11.740,89	11.740,89
1.7.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	87,80	91,78	8.058,28	-	87,80	87,80	-	8.058,28	8.058,28
1.7.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	85,58	6,49	555,41	-	85,58	85,58	-	555,41	555,41
1.7.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	52,12	3.127,20	-	60,00	60,00	-	3.127,20	3.127,20
1.8.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	-	-	1.499,84	-	-	-	-	1.499,84	1.499,84
1.8.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	688,00	2,18	1.499,84	-	688,00	688,00	-	1.499,84	1.499,84

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR 31879/D
ART/RRT: 1720242547560







Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº	23/2024
OBJETO	FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS E SANITÁRIOS
MEDICÃO Nº	03 - FINAL
DATA DA VISTORIA	21/11/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

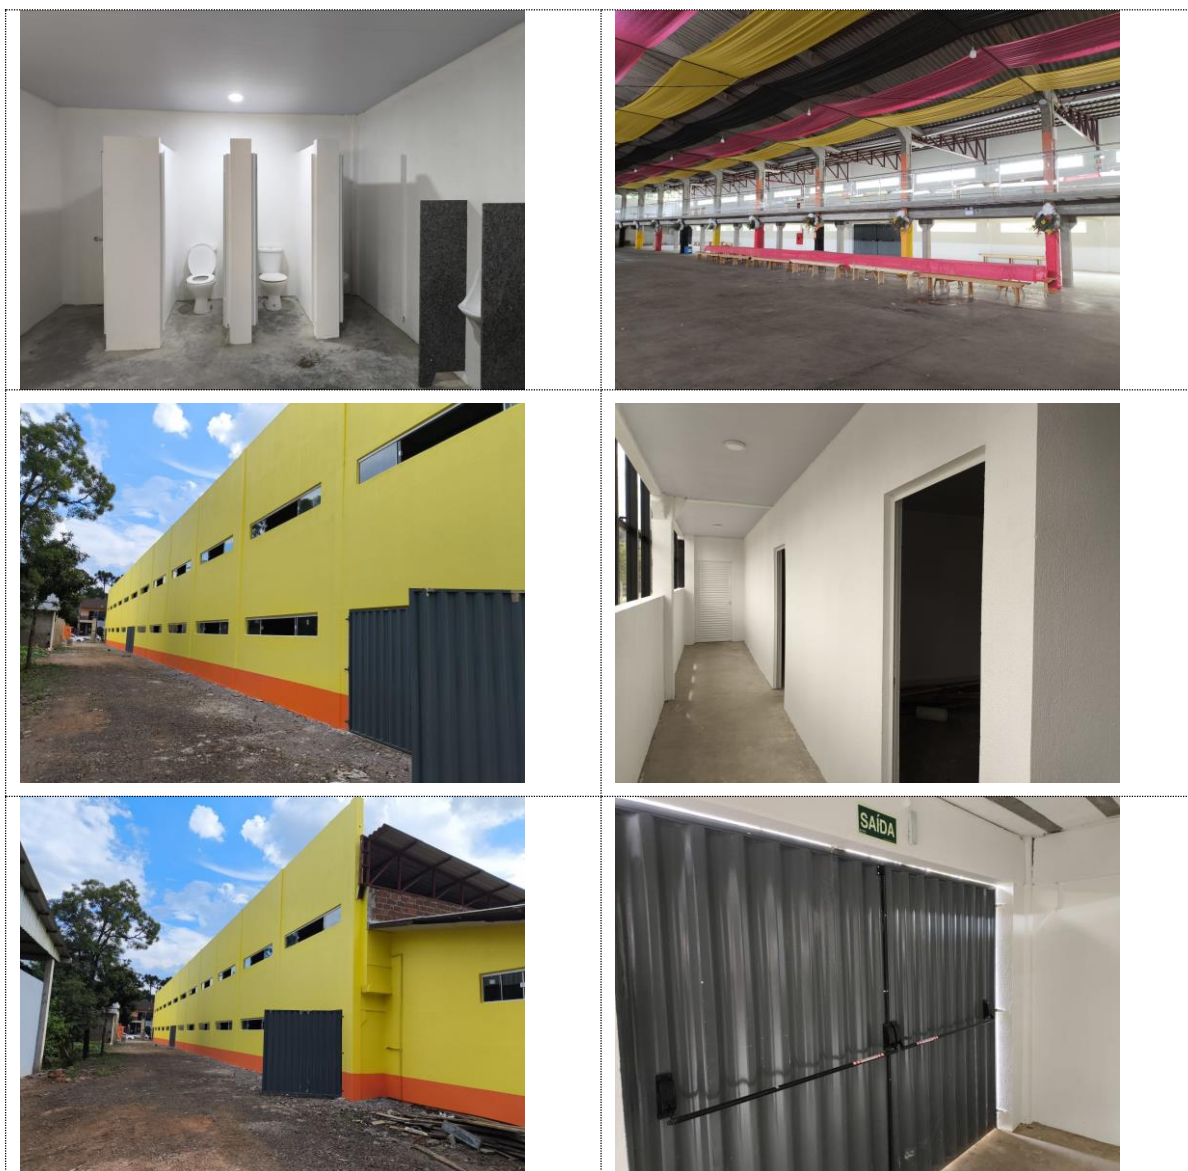


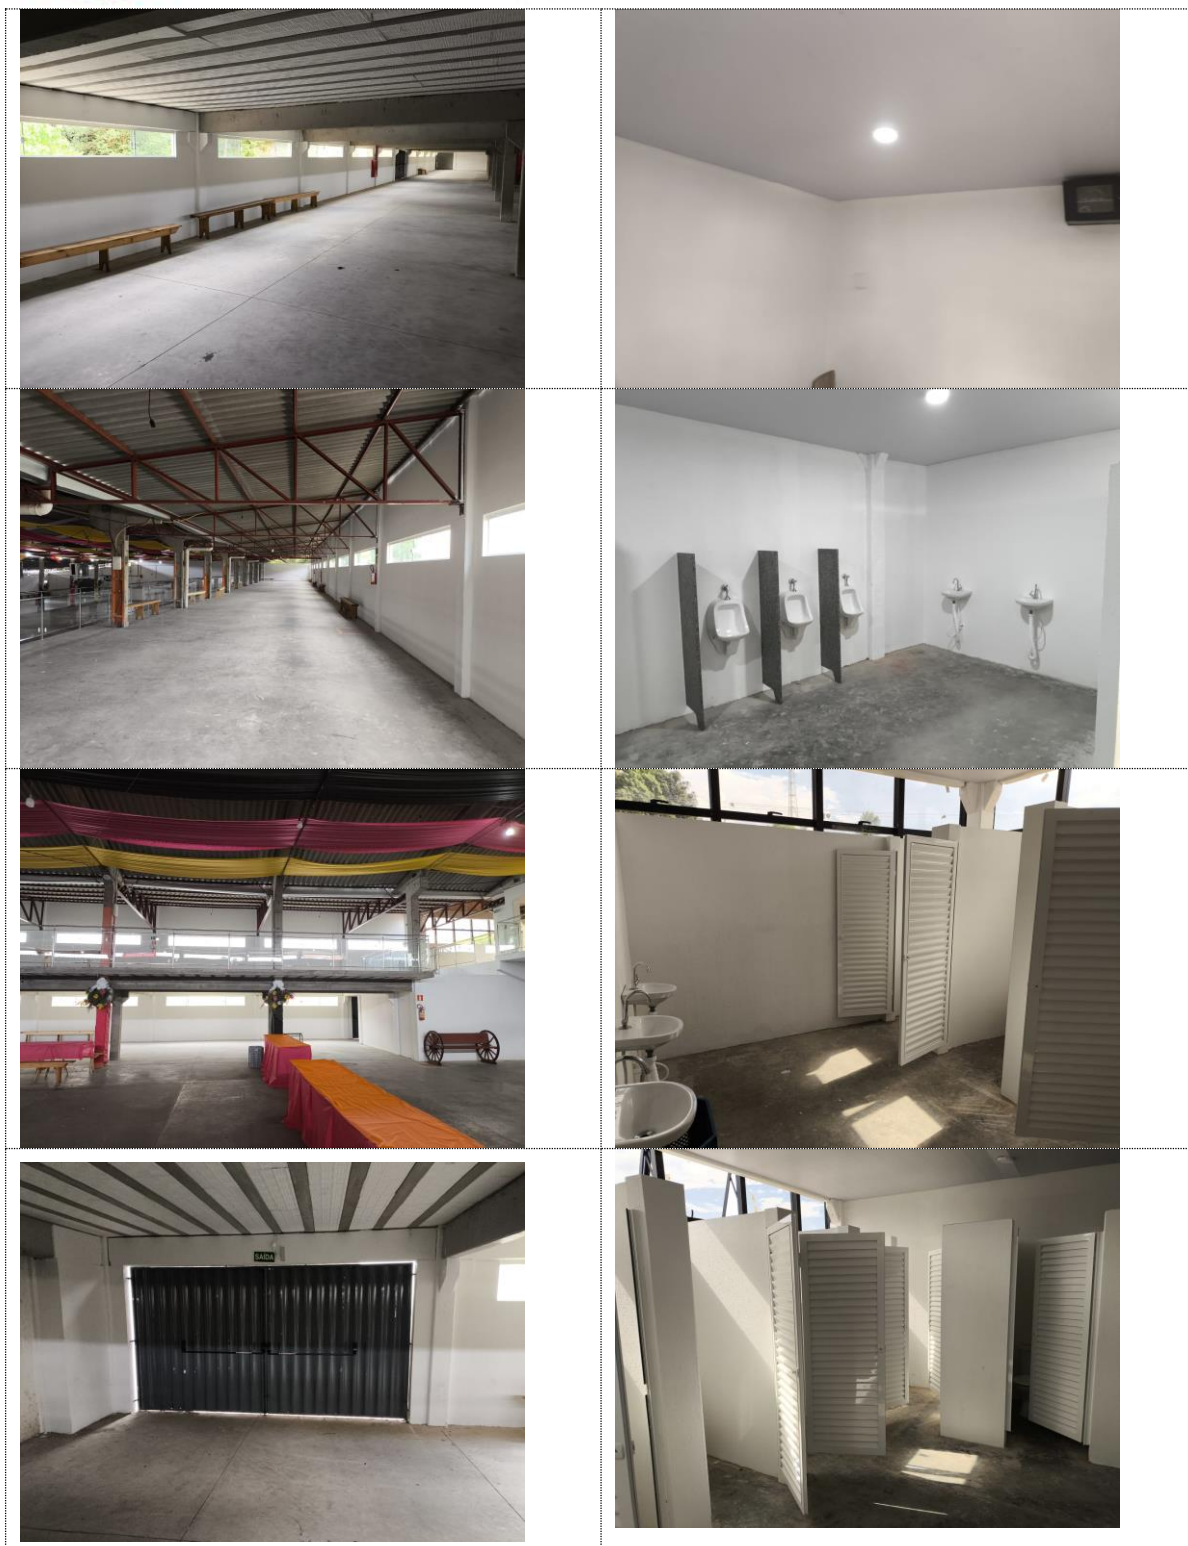



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

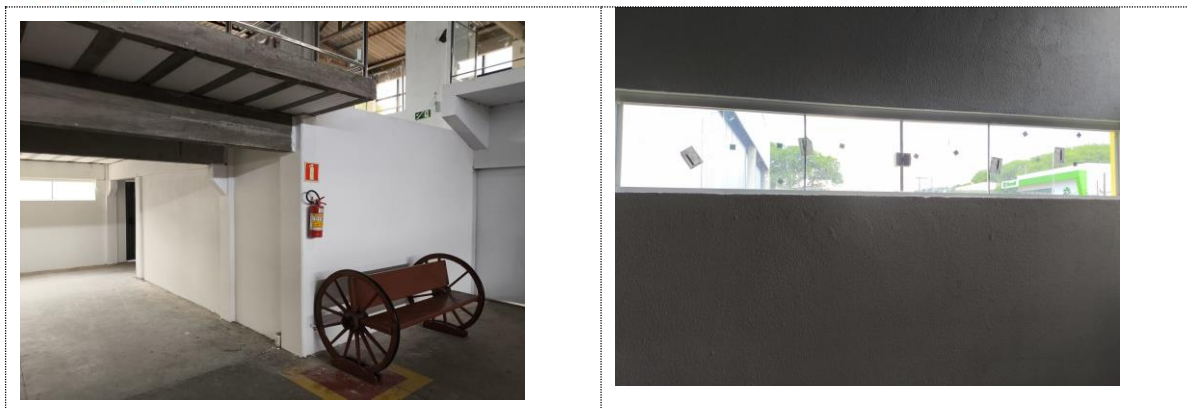

Sulina, 21 de novembro de 2024.

Luciano S. Santiago
Engenheiro Fiscal da Obra
ART: 1720242547560
CREA-PR 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C76C-03D4-676D-3DE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 21/11/2024 09:08:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CONSORA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 46.812.148/0001-21) em 21/11/2024 09:20:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 19/12/2024 13:07:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C76C-03D4-676D-3DE9>
