



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 16 de maio 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 15/2023-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 817.846,80	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 16/05/2023	38,86	317.843,84	61,14	R\$ 500.002,96
A liberar 2.ª Parcela em				
A liberar 3.ª Parcela em				
A liberar 4.ª Parcela em				

Valor a ser liberado em 16/05/2023 R\$ 317.843,84

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROPRIETÁRIO / TOMADOR

Nº CTEF

0

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO

0

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO

01 TROCA DE TELHADOS

Nº SICONV

0

PERÍODO DA MEDIÇÃO

00/01/1900 a 16/05/2023

Nº MEDICÃO

1

INÍCIO DE OBRA

00/01/00

Grav de Sigilo

#PÚBLICO

Realizado Acumulado: 32,55%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	976.474,12	-	-	-	317.843,84	317.843,84
1.	TELHADOS	-	-	-	976.474,12	-	-	-	-	317.843,84	317.843,84
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	872.088,60	-	-	-	-	295.545,60	295.545,60
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.950,00	62,00	120.900,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.950,00	4,00	7.800,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.950,00	7,00	13.650,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1.950,00	225,00	438.750,00	-	950,00	950,00	-	213.750,00	213.750,00
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	296,50	120,00	35.580,00	-	96,50	96,50	-	11.580,00	11.580,00
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	350,00	75,00	26.250,00	-	150,00	150,00	-	11.250,00	11.250,00
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	735,00	200,00	147.000,00	-	135,00	135,00	-	27.000,00	27.000,00
1.1.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.950,00	30,00	58.500,00	-	950,00	950,00	-	28.500,00	28.500,00
1.1.9.	GUIMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	140,00	86,64	12.129,60	-	40,00	40,00	-	3.465,60	3.465,60
1.1.10.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6.300,00	1,83	11.529,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	Fôrro de PVC	-	-	-	97.249,42	-	-	-	-	22.298,24	22.298,24
1.2.1.	Fôrro de PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.285,20	70,03	88.601,96	-	300,00	300,00	-	21.009,00	21.009,00
1.2.2.	REMOÇÃO DE FÔRROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.285,20	2,12	2.682,22	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FÔRRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	893,00	6,68	5.965,24	-	193,00	193,00	-	1.289,24	1.289,24
1.3.	OUTROS	-	-	-	7.136,10	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.950,00	2,60	5.070,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	213,00	9,70	2.066,10	-	-	-	-	-	-

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / Tomador		Nº Siconv		ApeLido do Empreendimento		Grau de Sigilo	
0		0		0 TROCA DE TELHADOS		#PUBLICO	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
0		0		(SELECIONAR)		00/01/00	
						Nº MEDIÇÃO	
						1	

Realizado Acumulado: 32,55%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Período	Acum. Incluido o Período
Objeto do CTEF:					376.474,12					
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.					TOTAL:					
										317.843,84
										317.843,84

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
terça-feira, 16 de maio de 2023
Data

Admundo
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERNANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RT: 0



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADOS – CMEI BAIRRO PLANALTO

CONTRATO Nº 15/2023/GP



Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 317.843,84.

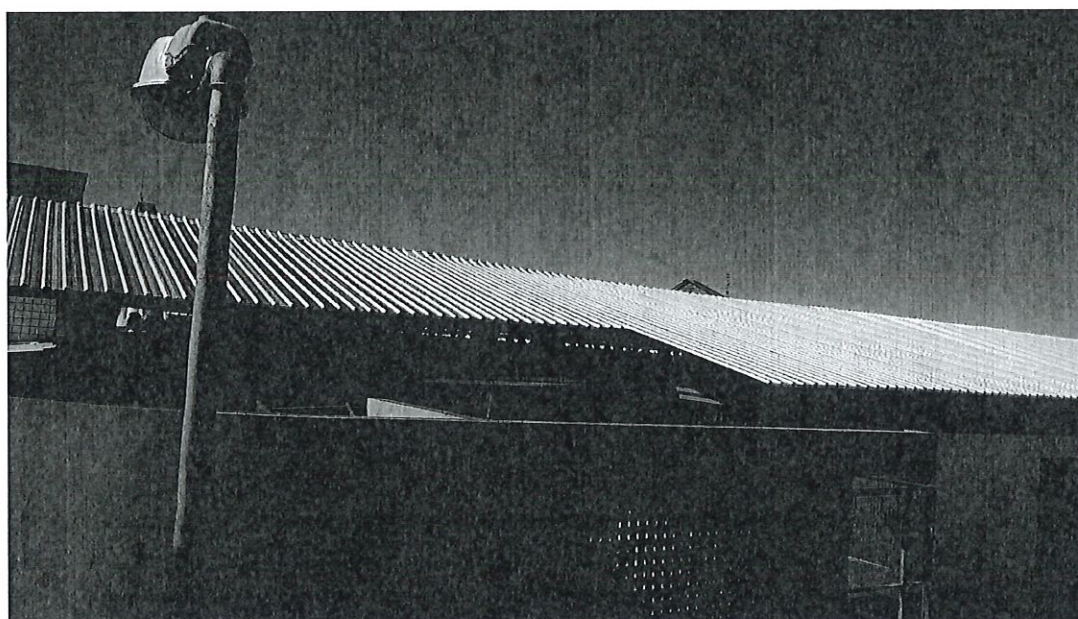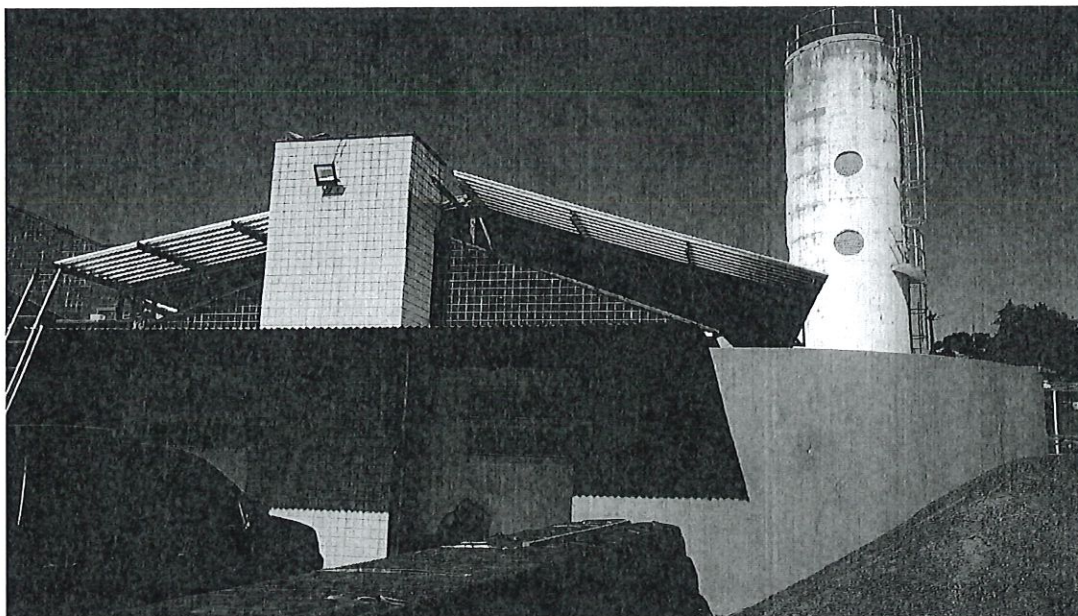

Armando



Fernanda

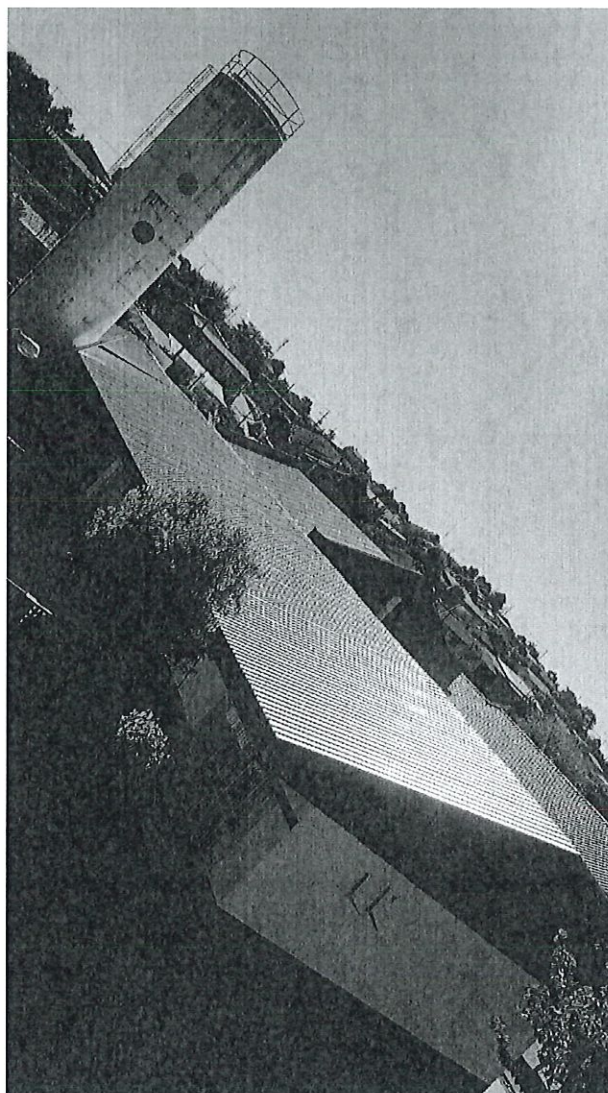

Pato Branco, 16 de maio de 2023.

Adernanda Paula dos Santos

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
