



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 09 de agosto 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 15/2023-GP


O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 976.474,12	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 16/05/2023	32,55	317.843,84	67,45	R\$ 658.630,28
A liberar 2.ª Parcela em 13/06/2023	66,64	332.879,20	33,36	R\$ 325.751,08
A liberar 3.ª Parcela em 06/07/2023	96,93	295.774,98	3,07	R\$ 29.976,10
A liberar 4.ª Parcela em 09/08/2023	3,07	29.976,10	-	-

Valor a ser liberado em 09/08/2023 R\$ 29.976,10

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato

PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0 TROCA DE TELHADOS	00/01/00
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	Nº MEDIÇÃO
0	0	0	07/07/2023 a 09/08/2023	4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1.	TELHADOS	-	-	TOTAL:	976.474,12	-	-	-	946.438,02	29.976,10	976.474,12	
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	872.088,60	-	-	-	844.188,60	27.900,00	872.088,60	
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.950,00	62,00	120.900,00	1.950,00	-	1.950,00	120.900,00	-	120.900,00	
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.950,00	4,00	7.800,00	1.950,00	-	1.950,00	7.800,00	-	7.800,00	
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.950,00	7,00	13.650,00	1.950,00	-	1.950,00	13.650,00	-	13.650,00	
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1.950,00	225,00	438.750,00	1.950,00	-	1.950,00	438.750,00	-	438.750,00	
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	296,50	120,00	35.580,00	126,50	170,00	296,50	15.180,00	20.400,00	35.580,00	
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	350,00	75,00	26.250,00	250,00	100,00	350,00	18.750,00	7.500,00	26.250,00	
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	735,00	200,00	147.000,00	735,00	-	735,00	147.000,00	-	147.000,00	
1.1.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.950,00	30,00	58.500,00	1.950,00	-	1.950,00	58.500,00	-	58.500,00	
1.1.9.	CUMEIEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	140,00	86,64	12.129,60	140,00	-	140,00	12.129,60	-	12.129,60	
1.1.10.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	6.300,00	1,83	11.529,00	6.300,00	-	6.300,00	11.529,00	-	11.529,00	
1.2.	Forro de PVC	-	-	-	97.249,42	-	-	-	97.249,42	-	97.249,42	
1.2.1.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.265,20	70,03	88.601,96	1.265,20	-	1.265,20	88.601,96	-	88.601,96	
1.2.2.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.265,20	2,12	2.682,22	1.265,20	-	1.265,20	2.682,22	-	2.682,22	
1.2.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	893,00	6,68	5.965,24	893,00	-	893,00	5.965,24	-	5.965,24	
1.3.	OUTROS	-	-	-	7.136,10	-	-	-	5.060,00	2.076,10	7.136,10	
1.3.1.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.950,00	2,60	5.070,00	1.200,00	750,00	1.950,00	3.120,00	1.950,00	5.070,00	
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	213,00	9,70	2.066,10	200,00	13,00	213,00	1.940,00	126,10	2.066,10	

Observações:

Adriana



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROPONENTE / TOMADOR		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
0		0		0 TROCA DE TELHADOS		00/01/00	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		Nº MEDIÇÃO	
0		0		0		4	
				PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2023 a 09/08/2023			

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:		-		976.474,12	976.474,12
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total. Medição.								946.498,02	29.976,10

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
Data
quinta-feira, 6 de julho de 2023

demando
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERLANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/IRT: 0



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – CMEI BAIRRO PLANALTO
CONTRATO Nº 15/2023/GP**



Relatório de Medição nº 04



Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA



Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 29.976,10.

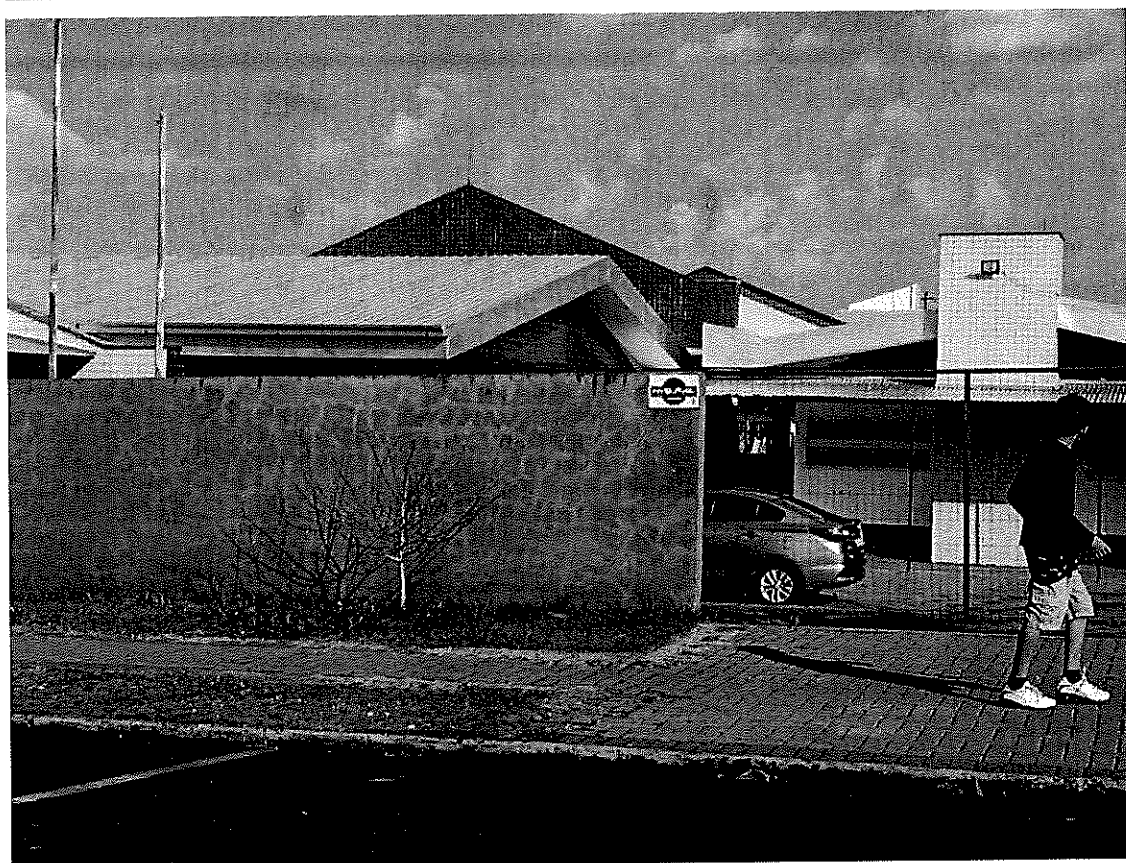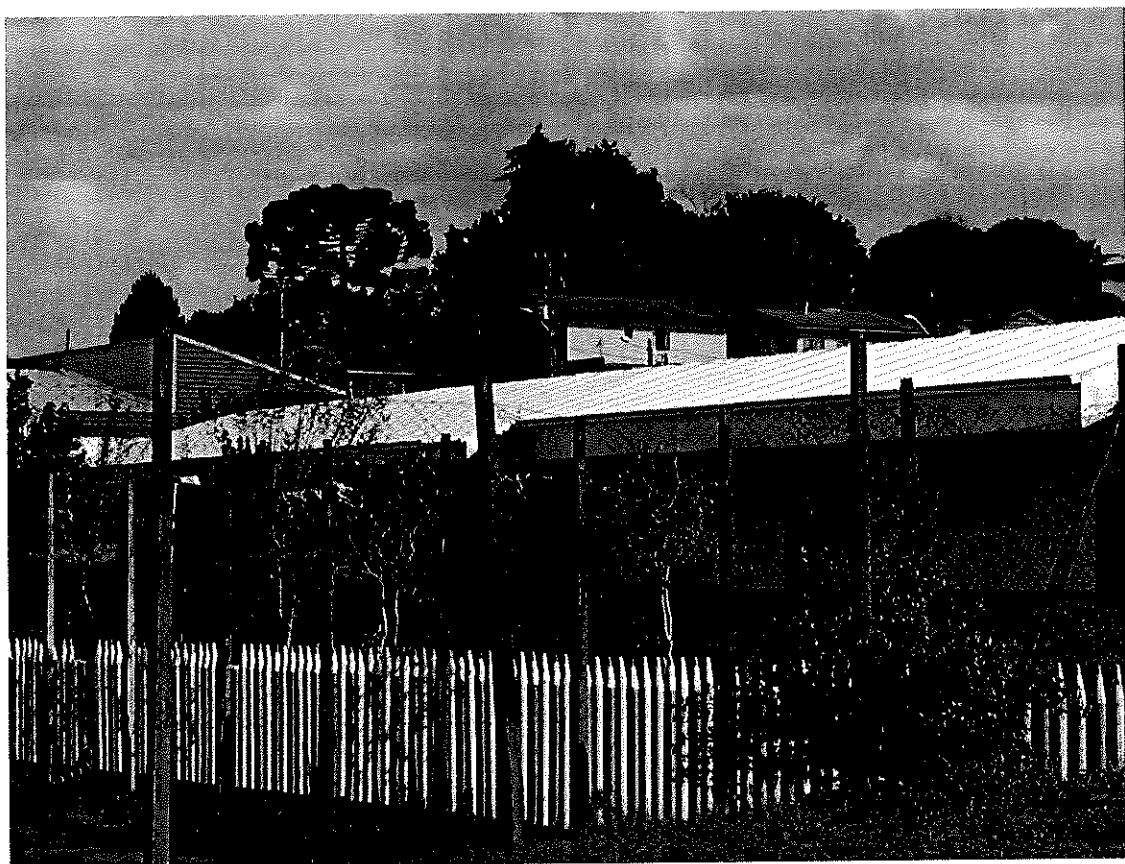

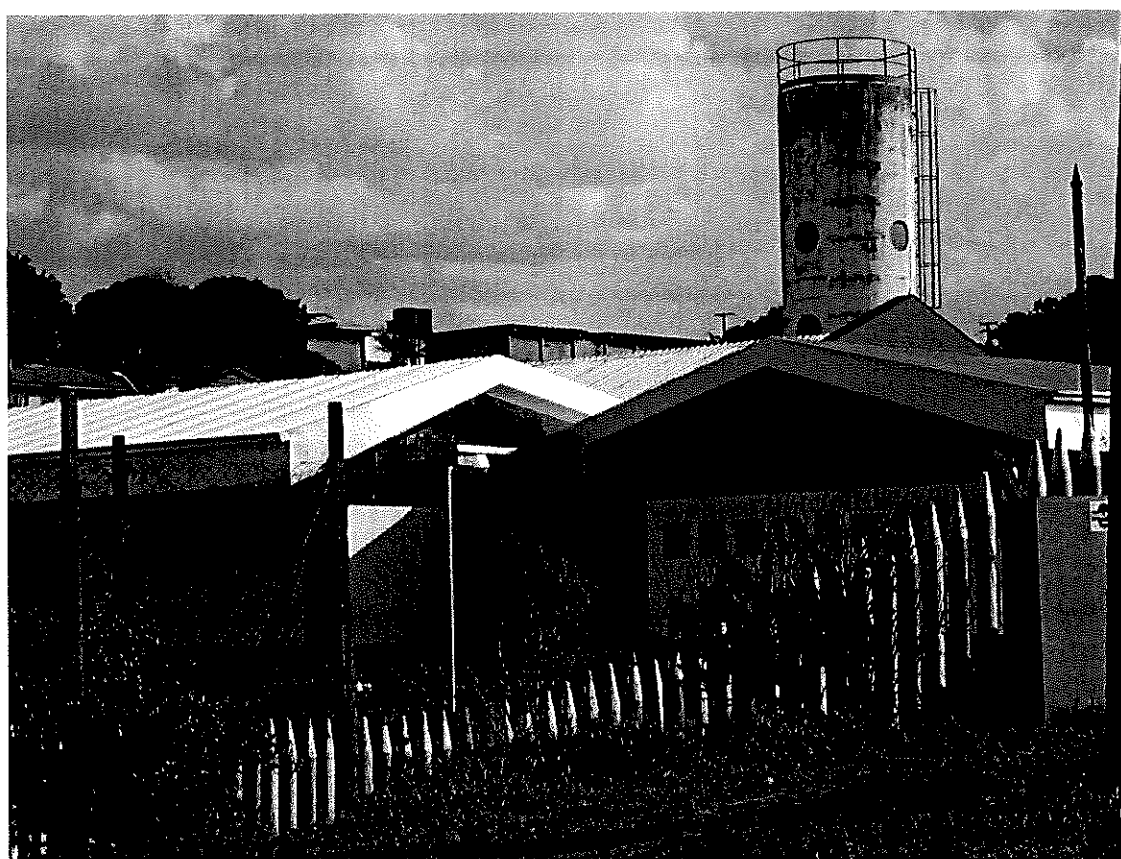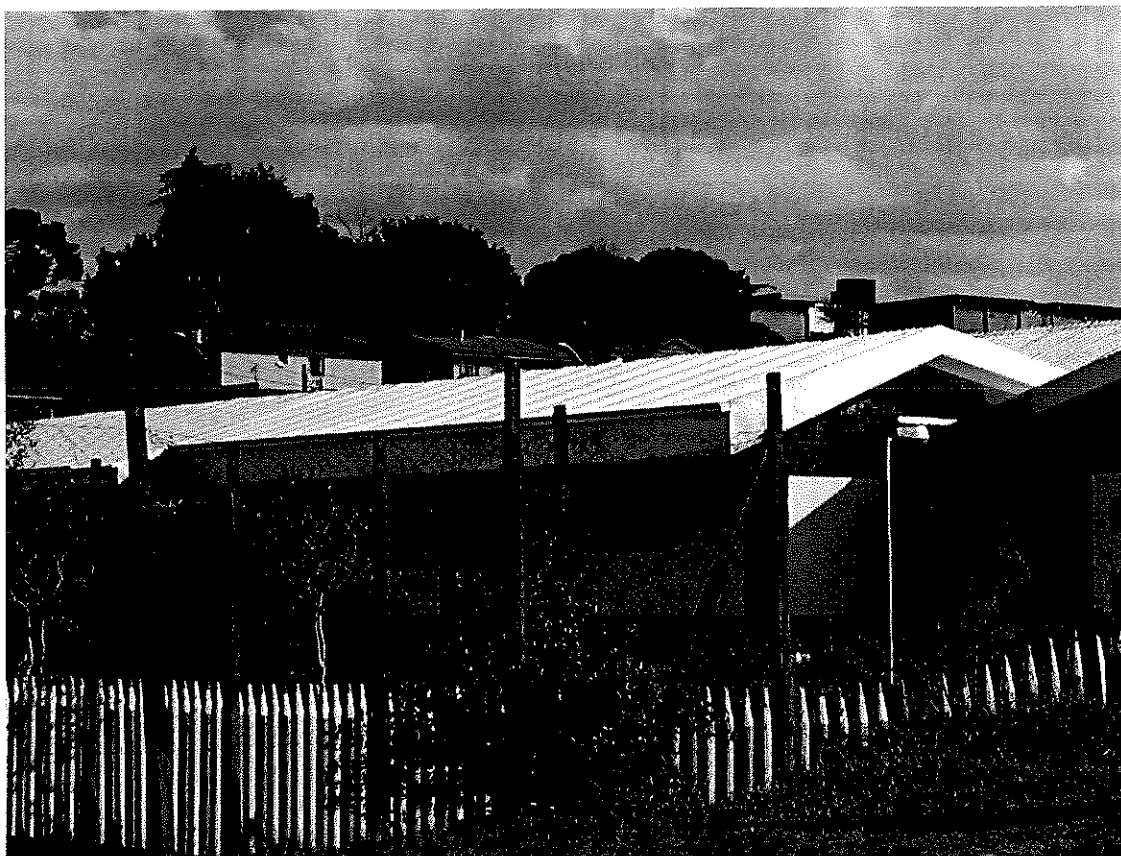

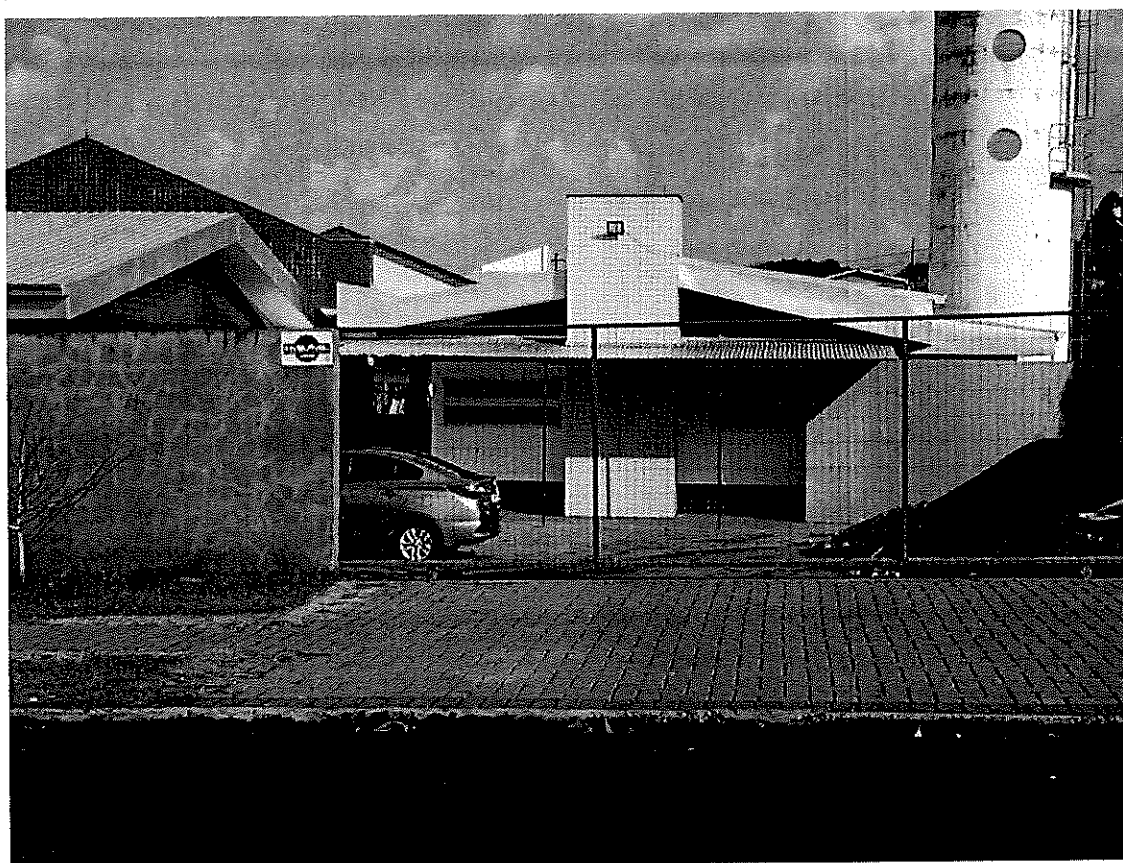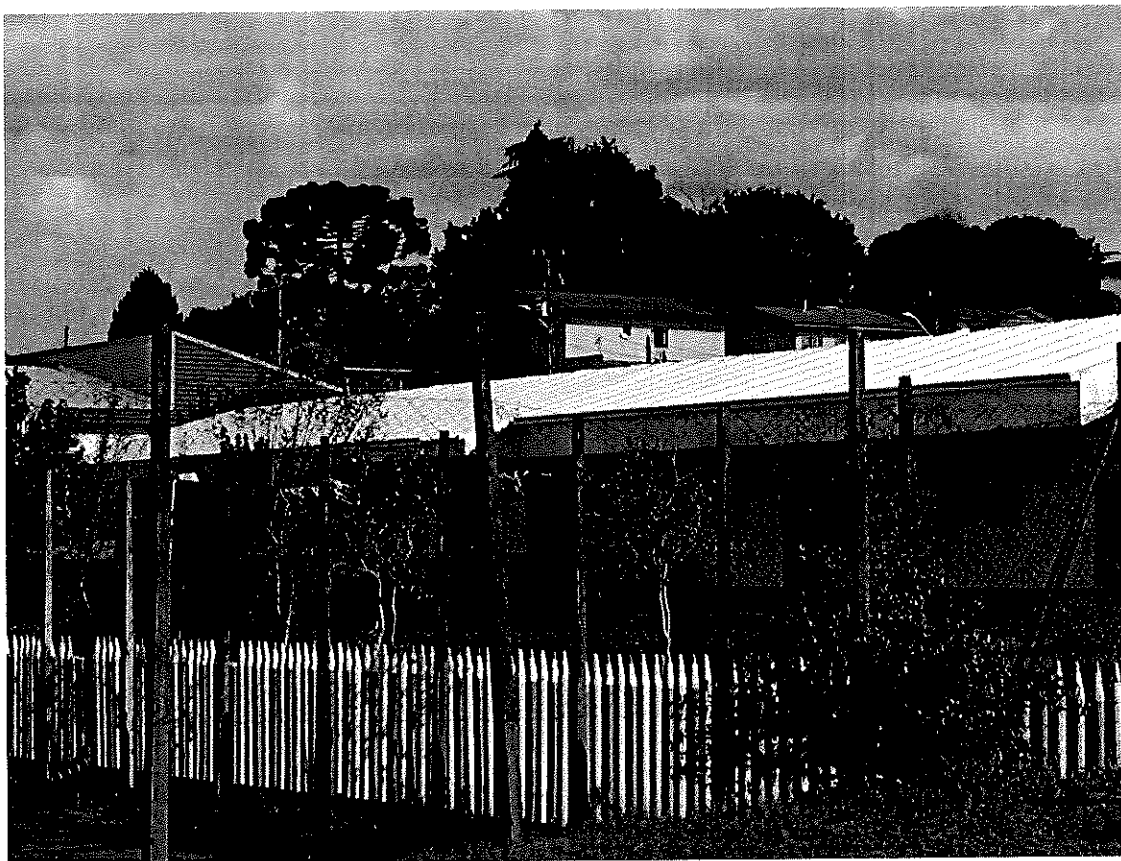

Pato Branco, 09 de agosto de 2023.



Aderhanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
