



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

MUNICIPIO : SULINA	MEDIÇÃO N.º: 1
PROJETO : ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	DATA DA MEDIÇÃO : 22/05/2023
CONVÊNIO : 	
CONTRATO EMPRESTIMO N.º : LUMINARE LED EIRELI	
EMPRESA VENCEDORA : 06/2023 DATA : 01/02/2023	ORDEM DE SERVIÇO N.º : 02 2023
CONTRATO EMPREITADA N.º : 01/02/2023	DATA : 02/02/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO : R\$ 292.111,25	
SAM : N 53	
LOTE : N 01	

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OB	50,00%	1.323,22	100,00%	2.646,44	2.646,44
02	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10,00%	25,48	100,00%	254,88	254,88
03	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROT	10,00%	28.865,33	100,00%	288.653,37	288.653,37
04	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS	-	-	100,00%	556,56	556,56
05			-	-		-	-
06			-	-		-	-
07			-	-		-	-
08			-	-		-	-
09			-	-		-	-
10			-	-		-	-
11			-	-		-	-
12			-	-		-	-
13			-	-		-	-
14			-	-		-	-
15			-	-		-	-
16			-	-		-	-
17			-	-		-	-
18			-	-		-	-
19			-	-		-	-
20			-	-		-	-
21			-	-		-	-
22			-	-		-	-
23			-	-		-	-
24			-	-		-	-
25			-	-		-	-
26			-	-		-	-

Importa a presente medição no valor total de **R\$ 292.111,25**
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação n.º, TP 0006/2022 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471 977	Assinado de forma digital por ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977 Dados: 2023.07.13 09:00:18 -03'00'	 Luciano S. Santiago Engenheiro Civil Fiscalização Municipal	 PAULO HORN Prefeito Municipal
---	---	---	--------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

ESTADO DO PARANÁ

		Mês	maio	REGIONAL	CASCADEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
MUNICÍPIO: SULINA		SAM	53	PARCELA	1	DATA	26/05/2023
SUBPROJETO: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		Lote	01	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITEIRA: LUMINARE LED EIRELI		Ano	2023	Nº	jun/23	Nº	02 2023
				DATA:	01/02/2023	DATA	02/02/2023

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO


Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							-	-	-
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-	-	-
COMPOSIÇÃO 113		PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS	UN	1,00	100,00%	0,0091	0,91%	2646,44	2.646,44	2.646,44	-
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-	-	-
5.1		ALVENARIA							-	-	-
5.1.12		ENCUNHAMENTO							-	-	-
103322		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPE	M2	4,00	100,00%	0,0009	0,09%	63,72	254,88	254,88	-
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA							-	-	-
8.1.7		POSTES							-	-	-
100588		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMI	UN	6,00	100,00%	0,0172	1,72%	839,38	5.036,28	5.036,28	-
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							-	-	-
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							-	-	-
101508		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM	UN	1,00	100,00%	0,0087	0,87%	2548,18	2.548,18	2.548,18	-
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							-	-	-
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							-	-	-
97668		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	900,00	100,00%	0,0382	3,82%	12,41	11.169,00	11.169,00	-
8.2.5		CABOS							-	-	-
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV							-	-	-
91931		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	2000,00	100,00%	0,0767	7,67%	11,20	22.400,00	22.400,00	-
91933		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAI	M	1500,00	100,00%	0,0900	9,00%	17,53	26.295,00	26.295,00	-
92988		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORN	M	150,00	100,00%	0,0288	2,88%	56,09	8.413,50	8.413,50	-
8.2.8		CAIXAS							-	-	-
97886		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS	UN	10,00	100,00%	0,0061	0,61%	179,01	1.790,10	1.790,10	-
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							-	-	-
101881		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BA	UN	1,00	100,00%	0,0049	0,49%	1436,09	1.436,09	1.436,09	-
8.2.11		DISJUNTORES							-	-	-
8.2.11.2		BIPOLARES							-	-	-
93662		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	78,19	78,19	78,19	-
8.2.11.3		TRIPOLARES							-	-	-
101894		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INST	UN	6,00	100,00%	0,0041	0,41%	197,99	1.187,94	1.187,94	-
8.2.11.4		OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR							-	-	-
101895		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN	UN	1,00	100,00%	0,0019	0,19%	546,21	546,21	546,21	-
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							-	-	-
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO							-	-	-
96986		HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00	100,00%	0,0083	0,83%	151,32	2.421,12	2.421,12	-
8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO							-	-	-
96988		MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	100,00%	0,0041	0,41%	199,84	1.199,04	1.199,04	-
8.3.4		CORDOALHA							-	-	-
96989		CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	100,00%	0,0034	0,34%	167,25	1.003,50	1.003,50	-



MUNICÍPIO	SULINA
PROJETO/LOTE	Nº 53 / LOTE Nº01
PROGRAMA	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
CONTRATADA	LUMINARE LED EIRELI
CONTRATO Nº	06/2023
OBJETO	ESTÁDIO MUNICIPAL
MEDIÇÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	26/05/2023

Iluminação do estádio municipal

MAPA / CROQUI / PLANTA BAIXA COM A MARCAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO

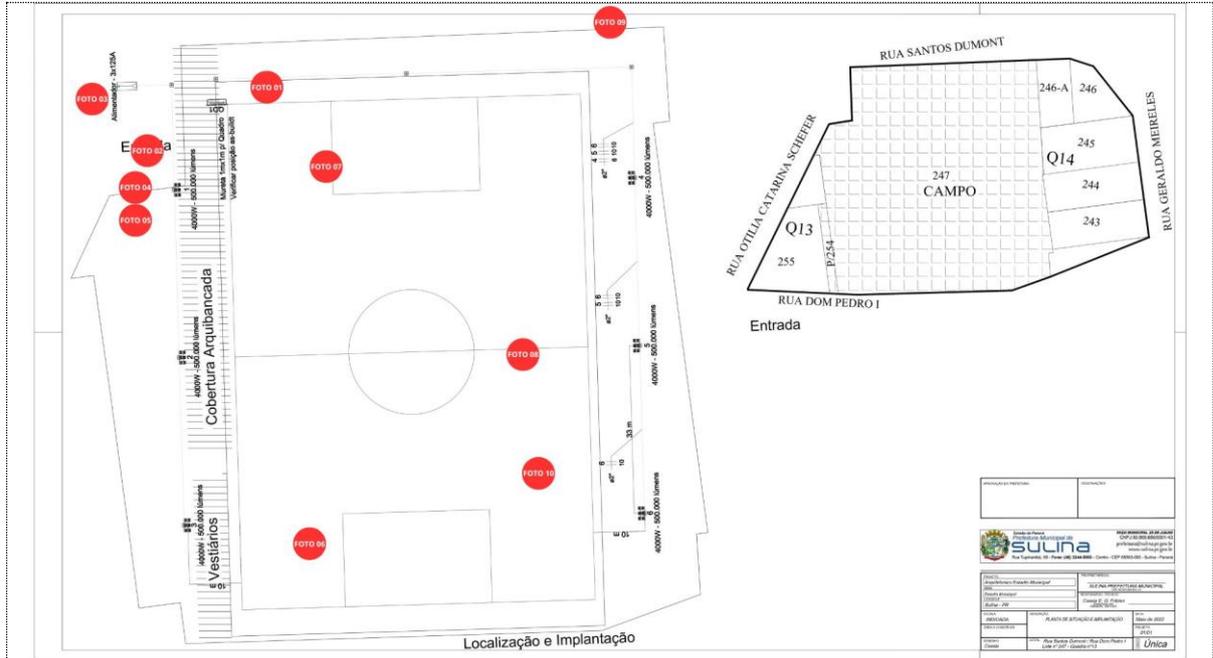



PLACA DA OBRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01

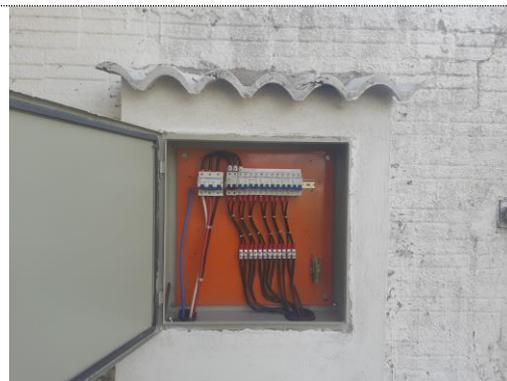


FOTO 02



25,698775 52,71714W
903 Avenida Iguaçu
Sulina
Paraná

FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



25,699425 52,71669W
233 Rua Dom Pedro I
Sulina
Paraná

FOTO 07



25,698775 52,71680W
535 Rua União da Vitória
Sulina
Paraná

FOTO 08



25,699085 52,71624W
535 Rua União da Vitória
Sulina
Paraná

FOTO 09



FOTO 10



10 de mai. de 2023 20:30:18
Rua Dom Pedro I
Sulina PR
85565-000
Brasil

FOTO 11



FOTO 12

Sulina, 26 de maio de 2023.

Luciano S. Santiago
CREA-PR: 31879/D
ART de fiscalização: 1720230729820
