





## RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRAS E/OU SERVIÇOS - CONVÊNIO

ERP

Nº 1

Data: 10/05/2024

Arquivo:

Convênio.....: 093 / 2023 Protocolo.....: 18.655.588-0  
Órgão Concedente.....: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
Município.....: SALTO DO LONTRA - PR Coordenadas.....: -25.465940 - -53.184310  
Endereço.....: RUA PRINCESA IZABEL, ESQUINA COM RUA ANTONIO DENIZ MULINARI, 373  
Empreendimento.....: INSTALAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL  
Objeto.....: Instalação  
Características.....: OBRA DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA NO PRONTO ATENDIMENTO  
Valor Convênio.....: R\$ 297.598,18  
Valor Aditivo.....: R\$ 0,00  
Valor Total.....: R\$ 267.000,00  
Valor Saldo.....: R\$ 30.598,18 Período Execução.....: 11/09/2023 a 11/09/2025  
Valor Contrapartida.....: R\$ 14.879,91 Período Vigência.....: 11/09/2023 a 11/09/2025

Órgão Conveniente.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA  
Contrato Obra.....: 02 / 2024 Regime de Contratação.....: Global  
Executora.....: DOUGLAS POSSAN EIRELI  
Valor Contrato.....: R\$ 267.000,00  
Total Aditivo Obra.....: R\$ 0,00  
Total Reajuste Obra.....: R\$ 0,00  
Total (Reajuste+Aditivo): R\$ 0,00 Período Execução.....: 01/02/2024 a 20/05/2024  
Total Obra.....: R\$ 297.598,18 Período Vigência.....: 01/02/2024 a 01/02/2025

## Avaliação da Obra ou Serviço

Situação da Obra: **Em Andamento** Desenvolvimento da Obra ou Serviço: **Bom**  
Qualidade dos Serviços: **Bom** Atendimento à Fiscalização: **Bom**  
Cumprimento do Cronograma Físico: **Bom** Desempenho Parcial: **48B**

ITEM	SERVIÇOS MEDIDOS	PESO	ITEM%	%PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,008	100	0,75
2	FIOS E CABOS	0,248	79,52	19,75
3	ELETRODUTOS	0,016	100	1,59
4	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	0,025	0	0
5	CAIXA DE PASSAGEM / QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / ENTRADA DE SERVIÇO	0,293	100	29,34
6	GERADOR	0,408	100	40,81
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,002	0	0
PERCENTUAL TOTAL		1		92,243

## OBSERVAÇÕES/NOTIFICAÇÃO:

VISTORIA REALIZADA NO DIA 09/05/2024, FECHAMENTO DAS DUAS PRIMEIRAS PARCELAS DO CRONOGRAMA. SERVIÇOS EXECUTADOS - PLACA DA OBRA, FIOS E CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E GERADOR.

Representante Conveniente

Fica Vossa Senhoria notificada que a não regularização dos itens apontados neste relatório em tempo hábil implicará nas providências legais constantes da Lei 8.666/93 e demais legislações de regência.

## Constatador

ERICO HIYOSHI IWATA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR-17331/D




FOTOS DA OBRA

PLACA DA OBRA



FIOS E CABOS

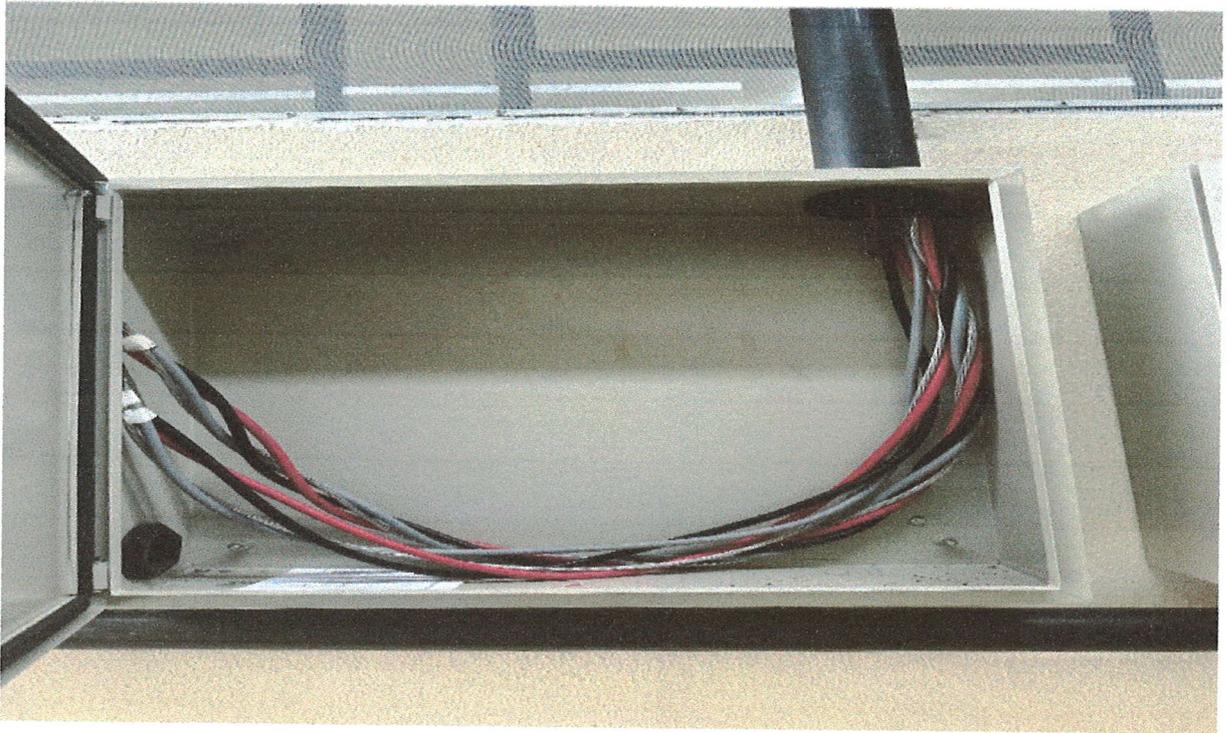

CAIXA DE PASSAGEM



ELETRODUTOS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

