



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
PROJETO : **BARRACÃO FEIRA**
CONVÊNIO : Nº **PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli**
CNPJ : **16.700.335/0001-52**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **51/2025** DATA ASSINATURA : **14/05/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **805.000,00**
SAM : Nº **58**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
DATA DA MEDIÇÃO : **21/10/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **2**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **09/05/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **10/11/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **003/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	15.040,25	100,00%	15.040,25	15.040,25	15.040,25	-	-
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	94,20%	1.271,58	94,20%	1.349,81	1.271,57	807,52	464,05	34,38%
3		ESTRUTURAS	10,80%	46.301,53	90,85%	428.590,64	389.395,29	50.901,99	338.493,30	78,98%
4		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	49,18%	32.802,62	16.133,25	-	16.133,25	49,18%
5		COBERTURA	-	-	100,00%	7.474,59	7.474,59	-	7.474,59	100,00%
6		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	33.031,79	-	-	-	-
7		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAC	-	-	-	61.301,31	-	-	-	-
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	-	31.825,59	-	-	-	-
9		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTU	-	-	-	190.143,40	-	-	-	-
10	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	3.440,00	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-
13			-	-	-	-	-	-	-	-
14			-	-	-	-	-	-	-	-
15			-	-	-	-	-	-	-	-
16			-	-	-	-	-	-	-	-
17			-	-	-	-	-	-	-	-
18			-	-	-	-	-	-	-	-
19			-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21			-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27			-	-	-	-	-	-	-	-
28			-	-	-	-	-	-	-	-
29			-	-	-	-	-	-	-	-
30			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				62.613,36		TOTAL MEDIÇÃO	429.314,95			
								OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								66.749,76	362.565,19	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$362.565,19

45,04 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 003/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA	% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	62.613,36
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	429.314,95 685,66%
META FINANCEIRA ATINGIDA	

MARCIO GALLINA
CONSTRUCAO CIVIL E
MATERIAIS DE
CO:16700335000152

Assinado de forma digital por
MARCIO GALLINA CONSTRUCAO
CIVIL E MATERIAIS DE
CO:16700335000152
Dados: 2025.10.30 09:11:23 -03'00'

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado digitalmente por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF AJ, OU=Presencial, OU=23824010000119,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO 81596189991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 07:52:42 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453
901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AJ, OU=SEM BRANCO, OU=1047626000147,
OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 07:53:02 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli
Arq. Rodrigo Pires Franco
CAU: A91039-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
Luciano Steinemann Santiago
ENGº CIVIL - CREA PR: 31879/D

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021											Mês	Out	MEDIÇÃO PARCELA	2	DATA	21/10/2025 - ter		
MUNICÍPIO:			SULINA								CÓDIGO SAM MUNIC.:		324		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:			BARRACÃO FEIRA								Lote		1		Nº		51/2025	
FIRMA EMPREITEIRA:			Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli						CNPJ:		16.700.335/0001-52				DATA:		14/05/2025	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																		
1		561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-				-		-	-				
	1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-				
	1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024			-	-				-	-	-	-				
	99058	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	un	140,00	-	140,00	100,00%	0,14%	0,14%	8,06	1.128,40	1.128,40	-				
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS			-	-				-	-	-	-				
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA			-	-				-	-	-	-				
	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m2	2,50	-	2,50	100,00%	0,31%	0,31%	982,19	2.455,48	2.455,48	-				
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	10,00	-	10,00	100,00%	1,15%	1,15%	922,52	9.225,20	9.225,20	-				
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO			-	-				-	-	-	-				
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,28%	0,28%	2.231,17	2.231,17	2.231,17	-				
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			-	-				-	-	-	-				
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA			-	-				-	-	-	-				
	2.1.1		ESCAVACAO MANUAL			-	-				-	-	-	-				
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024	m3	10,00	-	10,00	100,00%	0,12%	0,12%	92,81	928,10	928,10	-				
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA			-	-				-	-	-	-				
	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	34,80	-	34,80	100,00%	0,04%	0,04%	9,87	343,47	343,47	-				
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS			-	-				-	-	-	-				
	2.4.7		RALOS			-	-				-	-	-	-				
	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4,00	-	4,00		0,01%		19,56	-	78,24	78,24				
3		564	ESTRUTURAS			-	-				-	-	-	-				
	4.1		FORMAS			-	-				-	-	-	-				
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA			-	-				-	-	-	-				
	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	71,18	-	71,18	70,24%	0,88%	0,62%	99,83	4.991,50	7.105,90	2.114,40				
	101601	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXCLUSÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	m2	50,02	-	50,02	100,00%	0,16%	0,16%	25,11	1.256,01	1.256,01	-				
	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	33,36	-	33,36	74,94%	0,32%	0,24%	77,67	1.941,75	2.591,07	649,32				
	92472	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	10,00	-	10,00	70,00%	0,13%	0,09%	101,94	713,58	1.019,40	305,82				
	4.2		ARMADURAS			-	-				-	-	-	-				

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	4.2.3		ARMAÇAO CA-50 e CA-60			-	-				-	-	-	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	83,00	-	83,00	69,88%	0,15%	0,10%	14,97	868,26	1.242,51	374,25
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	253,40	-	253,40	69,85%	0,41%	0,29%	13,14	2.325,78	3.329,67	1.003,89
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	725,00	-	725,00	69,93%	0,87%	0,61%	9,66	4.897,62	7.003,50	2.105,88
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	320,00	-	320,00	70,00%	0,32%	0,22%	8,05	1.803,20	2.576,00	772,80
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES			-	-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO			-	-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS			-	-				-	-	-	-
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m3	2,00	-	2,00	50,00%	0,20%	0,10%	802,53	802,53	1.605,06	802,53
	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022. PS	m3	10,99	-	10,99	45,50%	0,68%	0,31%	497,95	2.489,75	5.472,47	2.982,72
	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m3	5,47	-	5,47	100,00%	0,39%	0,39%	570,65	3.121,45	3.121,45	-
	4.4		LASTROS			-	-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES			-	-				-	-	-	-
	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	m3	50,00	-	50,00		0,94%		151,33	-	7.566,50	7.566,50
	4.5		LAJES PRE-MOLDADAS			-	-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS			-	-				-	-	-	-
	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	m2	100,00	-	100,00	100,00%	1,99%	1,99%	160,19	16.019,00	16.019,00	-
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS			-	-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS			-	-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS			-	-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA			-	-				-	-	-	-
	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	m	14,80	-	14,80	100,00%	0,13%	0,13%	70,45	1.042,66	1.042,66	-
	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2024	m	2,60	-	2,60	100,00%	0,03%	0,03%	82,81	215,31	215,31	-
	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	m	14,80	-	14,80	100,00%	0,09%	0,09%	51,33	759,68	759,68	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS			-	-				-	-	-	-
	COT58_1_01	PM_324	PILAR PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO 0.35X0.35X6.50MT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	23,00	-	23,00	100,00%	6,32%	6,32%	2.213,13	50.901,99	50.901,99	-
	COT58_1_01	PM_324	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 21,40 M, PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMNIADO, E = 3MM, H = 125 MM, L = 50 MM PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METÁLICA, INCLUSO ICAMENTO	un.	10,00	-	10,00	100,00%	5,31%	5,31%	4.274,07	42.740,70	42.740,70	-
	COT58_1_03	PM_324	TERÇA METÁLICA, EM PERFIL "U" ENRIDECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,00 MM, H = 100 MM, L = 50 MM PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METÁLICA, INCLUSO ICAMENTO	m	1.130,00	-	1.130,00	100,00%	8,48%	8,48%	60,44	68.297,20	68.297,20	-
	COT58_1_04	PM_324	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA 0,43 MM, COM ESPESSURA DE EPS 30 MM OU SUPERIOR, FACE SUPEIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA COM PELÍCULA NA COR BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1.206,96	-	1.206,96	89,98%	25,43%	22,88%	169,62	184.207,32	204.724,56	20.517,24
4	5.1	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			-	-				-	-	-	-
	5.1.12		ALVENARIA			-	-				-	-	-	-
	103328	SINAPI	ENCUNHAMENTO			-	-				-	-	-	-
	5.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONFIRA. AF 12/2021	m2	325,00	-	325,00	53,85%	3,72%	2,00%	92,19	16.133,25	29.961,75	13.828,50
	5.2.2		DIVISORIAS E PAREDES			-	-				-	-	-	-
	102253	SINAPI	DIVISORIAS			-	-				-	-	-	-
	5	566	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m2	3,60	-	3,60		0,35%		789,13	-	2.840,87	2.840,87
	6.11		COBERTURA			-	-				-	-	-	-
	94228	SINAPI	CALHAS			-	-				-	-	-	-
			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	102,80	-	102,80	100,00%	0,93%	0,93%	72,71	7.474,59	7.474,59	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
6		567	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			-	-				-	-	-	-	
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS			-	-				-	-	-	-	
	7.1.6		PORTAS EM ALUMINIO			-	-				-	-	-	-	
	91341		SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	30,24	-	30,24		3,21%		854,21	-	25.831,31	25.831,31
	7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO			-	-				-	-	-	-	
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	7,00	-	7,00		0,89%		1.028,64	-	7.200,48	7.200,48	
7		568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			-	-				-	-	-	-	
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS			-	-				-	-	-	-	
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES			-	-				-	-	-	-	
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS			-	-				-	-	-	-	
	91846		SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	97,00	-	97,00		0,12%		9,91	-	961,27	961,27
	91879		SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	30,00	-	30,00		0,03%		7,68	-	230,40	230,40
	91893		SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	20,00	-	20,00		0,05%		19,16	-	383,20	383,20
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS			-	-				-	-	-	-	
	91863		SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	116,00	-	116,00		0,19%		13,00	-	1.508,00	1.508,00
	91864		SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	96,00	-	96,00		0,21%		17,72	-	1.701,12	1.701,12
	8.2.5		CABOS			-	-				-	-	-	-	
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V			-	-				-	-	-	-	
	91924		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	-	300,00		0,10%		2,77	-	831,00	831,00
	91926		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	-	300,00		0,15%		3,96	-	1.188,00	1.188,00
	91928		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3.400,00	-	3.400,00		2,55%		6,04	-	20.536,00	20.536,00
	8.2.6		CONDULETES			-	-				-	-	-	-	
	8.2.6.2		PVC			-	-				-	-	-	-	
	95806		SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	9,00	-	9,00		0,03%		29,95	-	269,55	269,55
	95811		SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	32,00	-	32,00		0,09%		23,84	-	762,88	762,88
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA			-	-				-	-	-	-	
	101879		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	-	1,00		0,05%		426,14	-	426,14	426,14
	8.2.11		DISJUNTORES			-	-				-	-	-	-	
	8.2.11.1		MONOPOLARES			-	-				-	-	-	-	
	93653		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	-	1,00				11,23	-	11,23	11,23
	93654		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00	-	3,00				11,92	-	35,76	35,76
	93656		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	-	4,00		0,01%		13,23	-	52,92	52,92
	8.2.11.2		BIPOLARES			-	-				-	-	-	-	
	93663		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	-	4,00		0,03%		57,53	-	230,12	230,12
	8.2.12		INTERRUPTORES			-	-				-	-	-	-	
	8.2.12.1		SIMPLES			-	-				-	-	-	-	
	91953		SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	-	1,00				30,65	-	30,65	30,65
	91967		SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	-	2,00		0,02%		62,47	-	124,94	124,94

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.2.13		TOMADAS			-	-				-	-	-	-
	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	un	34,00	-	34,00	0,26%			61,91	-	2.104,94	2.104,94
	8.2.18		LUMINARIAS			-	-				-	-	-	-
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	un	11,00	-	11,00	0,03%			18,51	-	203,61	203,61
	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un	22,00	-	22,00	0,11%			41,48	-	912,56	912,56
	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un	20,00	-	20,00	0,33%			132,15	-	2.643,00	2.643,00
	8.2.19		REFLETORES / PROJETOES			-	-				-	-	-	-
	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un	8,00	-	8,00	0,30%			306,06	-	2.448,48	2.448,48
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA			-	-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO			-	-				-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	un	20,00	-	20,00	0,15%			61,55	-	1.231,00	1.231,00
	8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO			-	-				-	-	-	-
	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	un	20,00	-	20,00	0,30%			118,94	-	2.378,80	2.378,80
	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	un	20,00	-	20,00	0,36%			146,07	-	2.921,40	2.921,40
	8.3.4		CORDOALHA			-	-				-	-	-	-
	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2024	m	60,00	-	60,00	0,25%			34,10	-	2.046,00	2.046,00
	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	m	200,00	-	200,00	1,19%			47,97	-	9.594,00	9.594,00
	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	un	3,00	-	3,00	0,05%			122,21	-	366,63	366,63
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	un	201,00	-	201,00	0,64%			25,71	-	5.167,71	5.167,71
8	569		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			-	-				-	-	-	-
	9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS			-	-				-	-	-	-
	9.2.10		EXTINTORES			-	-				-	-	-	-
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	un	4,00	-	4,00	0,09%			181,60	-	726,40	726,40
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			-	-				-	-	-	-
	9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS			-	-				-	-	-	-
	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	un	1,00	-	1,00	0,39%			3.145,72	-	3.145,72	3.145,72
	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un	1,00	-	1,00				32,55	-	32,55	32,55
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA			-	-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO			-	-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	m	160,00	-	160,00	0,23%			11,77	-	1.883,20	1.883,20
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA			-	-				-	-	-	-
	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	50,00	-	50,00	0,09%			14,39	-	719,50	719,50
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO			-	-				-	-	-	-
	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	20,00	-	20,00	0,03%			12,28	-	245,60	245,60
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA			-	-				-	-	-	-
	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	16,00	-	16,00	0,01%			5,37	-	85,92	85,92
	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	30,00	-	30,00	0,02%			4,17	-	125,10	125,10
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS			-	-				-	-	-	-
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	30,00	-	30,00	0,08%			22,12	-	663,60	663,60
	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	60,00	-	60,00	0,20%			27,31	-	1.638,60	1.638,60
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO			-	-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	40,00	-	40,00		0,05%		10,51	-	420,40	420,40
	89744	SINAPI	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	un	18,00	-	18,00		0,06%		25,22	-	453,96	453,96
	9.4		OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022			-	-				-	-	-	-
	9.4.5		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS LAVATORIOS			-	-				-	-	-	-
	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	8,00	-	8,00		0,22%		223,90	-	1.791,20	1.791,20
	9.4.7		SIFOES E VALVULAS			-	-				-	-	-	-
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	16,00	-	16,00		0,02%		10,55	-	168,80	168,80
	9.4.8		APARELHOS SANITARIOS			-	-				-	-	-	-
	86931	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	18,00	-	18,00		1,07%		478,46	-	8.612,28	8.612,28
	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00		0,19%		750,46	-	1.500,92	1.500,92
	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	11,00	-	11,00		0,91%		663,98	-	7.303,78	7.303,78
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00		0,01%		36,27	-	72,54	72,54
	9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS			-	-				-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	-	4,00		0,04%		84,16	-	336,64	336,64
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	-	4,00		0,02%		45,14	-	180,56	180,56
	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00		0,09%		360,90	-	721,80	721,80
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS			-	-				-	-	-	-
	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	un	4,00	-	4,00		0,04%		86,57	-	346,28	346,28
	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	un	2,00	-	2,00		0,08%		325,12	-	650,24	650,24
9		570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			-	-				-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			-	-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO			-	-				-	-	-	-
	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m2	650,00	-	650,00		0,39%		4,84	-	3.146,00	3.146,00
	10.1.3		EMBOCO			-	-				-	-	-	-
	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m2	650,00	-	650,00		3,10%		38,40	-	24.960,00	24.960,00
	10.1.9		CERAMICAS			-	-				-	-	-	-
	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	m2	270,00	-	270,00		2,08%		62,05	-	16.753,50	16.753,50
	10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES			-	-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS			-	-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	m2	82,45	-	82,45		0,40%		38,72	-	3.192,46	3.192,46
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS			-	-				-	-	-	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO			-	-				-	-	-	-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2021	m2	1.000,00	-	1.000,00		4,14%		33,32	-	33.320,00	33.320,00
	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12.0 CM. AF. 04/2022	m2	1.000,00	-	1.000,00		12,62%		101,59	-	101.590,00	101.590,00
	10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES			-	-				-	-	-	-
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	m	14,00	-	14,00		0,19%		106,56	-	1.491,84	1.491,84
	10.4		PINTURAS			-	-				-	-	-	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA			-	-				-	-	-	-
	10.4.12		PINTURA EM FACHADAS			-	-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m2	255,00	-	255,00		0,53%		16,72	-	4.263,60	4.263,60
	10.4.13		PINTURA EM TETOS			-	-				-	-	-	-
	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	100,00	-	100,00		0,18%		14,26	-	1.426,00	1.426,00
10	12	572	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			-	-				-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS			-	-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS			-	-				-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	1.000,00	-	1.000,00		0,43%		3,44	-	3.440,00	3.440,00
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	7,78%			% EXECUTADO :		53,33%	SOMAS	429.314,95	805.000,00	375.685,05

OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:	R\$805.000,00		
											Medição Acumulada:	429.314,95		
											Total Anterior:	66.749,76		
											Valor e % executado desta Medição :	R\$362.565,19	45,04 %	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

MARCIO GALLINA
CONSTRUCAO CIVIL E
MATERIAIS DE
CO:16700335000152

Assinado de forma digital por MARCIO GALLINA CONSTRUCÃO CIVIL E MATERIAIS DE CO:16700335000152
Dados: 2025.10.30 08:28:02 -03'00'

Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli
Arq. Rodrigo Pires Franco
CAU: A91039-2

LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:8159618
9991

Assinado digitalmente por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=23924010000119, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 07:53:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
Luciano Steinemann Santiago
ENGº CIVIL - CREA PR: 31879/D

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453
901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=81047508000147, OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 07:53:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medição:	58 / 1 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato N°:	51/2025
Data da Vistoria:	21/10/2025

Objeto:

Construção de Barracão Feira contendo área de circulação e sanitários.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **03/09/2025** até **21/10/2025**.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA



1 | QR CODE DA PLACA

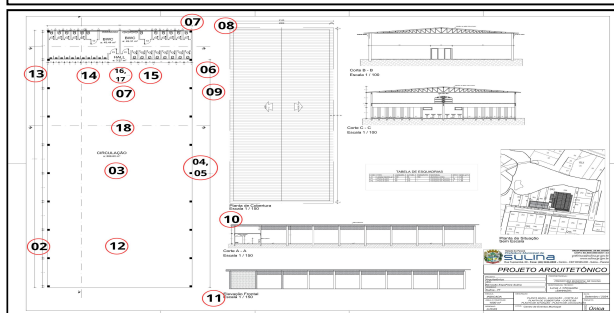

1 | LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



2 | SERVIÇOS EXECUTADOS



3 | SERVIÇOS EXECUTADOS



4 | SERVIÇOS EXECUTADOS



5 | SERVIÇOS EXECUTADOS



6 | SERVIÇOS EXECUTADOS



7 | SERVIÇOS EXECUTADOS



8 | SERVIÇOS EXECUTADOS




9 | SERVIÇOS EXECUTADOS



10 | SERVIÇOS EXECUTADOS



11 | SERVIÇOS EXECUTADOS

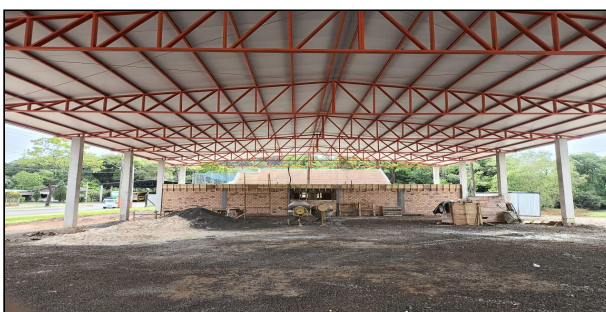

12 | SERVIÇOS EXECUTADOS



13 | SERVIÇOS EXECUTADOS



14 | SERVIÇOS EXECUTADOS



15 | SERVIÇOS EXECUTADOS



16 | SERVIÇOS EXECUTADOS



17 | SERVIÇOS EXECUTADOS



18 | SERVIÇOS EXECUTADOS

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/17035/lote/21415/medicao/17168/relatorio-fotografico/6207>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 03 de novembro de 2025.

Luciano Steinemann Santiago
engenheiro civil
Registro no Órgão de Classe: PR31879-D

Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (03/11/2025 07:41:08)

Nome/controle do arquivo:
2025110307410821.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110307410821>
