

Ofício 28- 673/2025

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/09/2025 às 16:45:16

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Segue.

—

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:
ADEQUACAO_PLE.pdf



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Medição:	1	Período:	15/05/2025 a 11/07/2025	% Realizado Período.:	43,41%	% Realizado Acum.:	43,41%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	--------	--------------------	--------

[illegible]

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Ricardo Scandolara
Profissão: Técnico Agrícola em Agropecuária
CREA/CAU: 08164537993
ART/RRT: BR20250701784





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A09-00BC-A62B-57D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 02/09/2025 16:45:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5A09-00BC-A62B-57D3>



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	Nº OPERAÇÃO 4105409/2023	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA EXECUÇÃO DE TST	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho	REPASSE 165.593,11	CONTRAPARTIDA 29.222,32	INVESTIMENTO 194.815,43	Nº RRE 1	

MENU →

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-25 100,00%
--------------------------------	---

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Para Metas preenchidas manual
valor medido nas colunas à direita

Valores Medidos (R\$)											Lista C
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL (3.484	Em Análise	24000	m²	03/2025	1	194.815,43	-	84.561,30	84.561,30	43,41%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(43,41%)	43,41%
							Repasse	165.593,11	-	71.877,10	
							Contrapartida	29.222,32	-	12.684,20	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	194.815,43	-	84.561,30	84.561,30

Chopinzinho
Local

terça-feira, 12 de agosto de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: Álvaro Dênis Ceni Scolaro
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Ricardo Scandolara
Profissão: Técnico Agrícola em Agropecuária
CREA/CAU: 08164537993
ART/RRT: BR20250701784

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: Juliana Dias de Castro
Cargo: Gestora do Contrato



Ofício 27- 673/2025

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2025 às 11:58:30

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Bom dia. Conforme solicitação via telefone do Senhor **Rodrigo Scussel - SMF-C-CNV**, segue referente ao despacho 16- 673/2025, **Relatório de medição** com as devidas correções solicitadas.

Atenciosamente,

—

Ricardo Scandolara

Técnico Agrícola

Anexos:

RELATORIO_DE_MEDICAO_1_READEQUACAO_corrigido.pdf

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO READEQUAÇÃO ESTRADA SANTA HELENA

PRIMEIRA MEDIÇÃO

REFERÊNCIA PROGRAMA	ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA EXECUÇÃO DE TST
CONTRATADA	MATINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 20.838.016/0001-85
CONTRATO Nº	Lote 01 do contrato 03/2025
OBJETO	Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra Readequação de Estrada, Pavimentação em TST e Construção de Terraços, no município de Chopinzinho, Paraná.

- Considerando a ordem de serviço para início dos trabalhos (REF.: Ofício 673/2025 [OS_009_2025_TST_adequacao.pdf](#));
- Considerando os eventos climáticos ocorridos desde o início da execução dos serviços, que não proporcionaram condições adequadas à execução em dados períodos de tempo;
- Considerando o andamento dos serviços e as necessidades que surgiram além do previsto no projeto e memorial descritivo com relação aos sistemas de drenagem das águas pluviais que eram compromisso do Município de Chopinzinho:
- **Seguem fotos das etapas previstas já concluídas.**



Procópio Kurpel, 3811 - São Miguel, Chopinzinho - PR, 85560-000, Brasil
(Imagem da placa do convênio instalada no Paço Municipal)



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ITAIPU
BINACIONAL
MAIS QUE ENERGIA

CAIXA

OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

Programa

Valor de Contrapartida
Valor **R\$332.700,00**

Valor Total **R\$2.218.000,00**

Início **24/11/2023**

Término **24/11/2025**

Município **Chopinzinho - PR**

Objeto **Manejo integrado de Água e Solo**

Atividade
Adequação de Estrada Rural
Construção de Terraço
Pavimentação em TST

29/08/2025
22J 346631 7140902

Estrada Sem Nome - Chopinzinho, PR, 85560-000, Brasil

(Imagem da placa da obra)



(Imagem da placa da obra à margem da estrada readequada)



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ETAPA 3 (Estaca 25 a 50 – 500 m)



(Imagens do início do trecho. Detalhe da medição do desnível do leito = média de 04%. Largura = 8m.)



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da altura de elevação do leito. Imagem à direita: detalhe da área adjacente.)



(Imagens da porção medial e final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito na porção medial. Imagem à direita: detalhe da superfície e largura do leito ao final do trecho.)

ETAPA 5

(Estaca 75 a 100 – 500 m)




(Imagens do início do trecho. Detalhe da superfície do leito, proporção da largura e a presença de lavouras nas áreas adjacentes)



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito. Imagem à direita: detalhe da lateral do leito.)

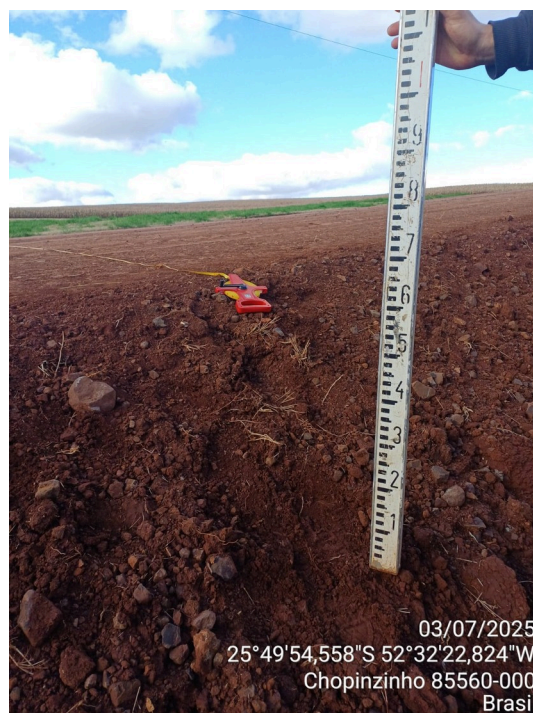

(Imagens da porção final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito e largura = 08 m. Imagem à direita: detalhe da altura de elevação do leito.)



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ETAPA 7

(Estaca 125 a 150 – 500 m)



(Imagens do início do trecho e porção medial. Imagem à esquerda: Detalhe da superfície do leito e da área de lavoura adjacente. Imagem à direita: detalhe da superfície do leito na porção medial do trecho.



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da lateral e superfície do leito em entrada de curva. Imagem à direita: detalhe da superfície do leito em saída de curva.)



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



03/07/2025
25°49'29,43"S 52°32'41,538"W
Chopinzinho 85560-000
Brasil



03/07/2025
25°49'29,736"S 52°32'41,586"W
Chopinzinho 85560-000
Brasil

(Imagens da porção final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da medição da inclinação e largura do leito. Imagem à direita: detalhe da altura de elevação do leito.)

RICARDO SCANDOLARA
Técnico Agrícola – CFTA 08164537993
Fiscal do Contrato 03/2025 – TRT N°: BR20250701784

Chopinzinho, 29 de Agosto de 2025.

Página 7 de 7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 215D-5446-B634-191A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 29/08/2025 12:00:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/215D-5446-B634-191A>
