

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2024	OBRAS SOBRE O RIO FORTE Esta intervenção foi concluída	Contrato 37/2024	90	26/05/2024	R\$ 156.000,00	100,00%
12	2024	OBRAS SOBRE O RIO FORTE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2025	90	26/05/2024	R\$ 156.000,00	100,00%

Nº12/2024
Data Inicial: 26/05/2024

OBRAS SOBRE O RIO FORTE

R\$ 156.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000607

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6598	2024	03/09/2024	12543
3787	2025	22/05/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	02/09/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/05/2025	37	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*4**18**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**09**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**09**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**62**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5706	R\$ 156.150,79	25/03/2024	
Contrato	37	2024	80.869.886/0001-43	5707	R\$ 156.000,00	08/05/2024	100,00%
Aditivo	5	2025	80.869.886/0001-43	5800	R\$ 30.560,40	12/05/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5708	Medição	1	Jurisdicionado	03/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	9,03%
5718	Medição	2	Jurisdicionado	10/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	23,70%
5728	Medição	3	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	43,74%
5752	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	57,04%
5760	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	70,29%
5771	Medição	6	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	89,57%
5783	Medição	7	Jurisdicionado	24/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	89,57%
5791	Medição	8	Jurisdicionado	30/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	89,57%
5801	Medição	9	Jurisdicionado	26/05/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2025	100,00%
5809	Medição	10	Jurisdicionado	24/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	100,00%
5820	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/07/2025			

Matrículas de Obras


Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900203988179					
0	900203988179	1	10/07/2025	06/01/2026	

Nº12/2024
Data Inicial: 26/05/2024

OBRAS SOBRE O RIO FORTE

Documentos

R\$ 156.000,00



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.6

Tipo de Orçamento

Acompanhamento

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 10-Monday.xlsm.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

MENU

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL
Município/UF:	SULINA/PR
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	01-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU:	31879/D
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	10/22/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	PAULO HORN
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	CONTRATO Nº 37/2024
Nome da empresa:	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ da empresa:	19.376.115/0001-03
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	10/22/2024

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	PR-31879/D
ART/RRT (para obras/projetos):	1720242786239

MENU

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ■ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Evento
<u>V3.0.1</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes de formatações. PO <ul style="list-style-type: none"> ■ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ■ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamen
<u>V3.0.2</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes de formatações. ■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. ORÇAMENTO <ul style="list-style-type: none"> ■ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 CRONOGRAMA <ul style="list-style-type: none"> ■ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros QCI <ul style="list-style-type: none"> ■ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. RRE <ul style="list-style-type: none"> ■ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. CÁLCULO <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	BDI <ul style="list-style-type: none"> ■ Correção da CPRB que exibía 4,5% mesmo quando não desonerado. CRONOGRAMA <ul style="list-style-type: none"> ■ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. QCI <ul style="list-style-type: none"> ■ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldi
<u>V3.0.5</u>	GERAL

■Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

V3.0.6

GERAL

■Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o Transfere

■A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usac

os.

to Licitado'.

o linhas.

o a reprogramar de CP).

GOV, altera na aba DADOS
do arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3.00%
Seguro e Garantia	SG	0.80%
Risco	R	0.97%
Despesas Financeiras	DF	1.23%
Lucro	L	7.40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20.73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26.77%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

Responsável Técnico

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT:

BDI 2

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0.00%

X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1 + DF) * (1 + I) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%



SULINA/PR	Tuesday, October 22, 2024
Local	Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT:

BDI 3

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0.00%

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1 + (1 - CP - ISS - CPRB))}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-	DATA BASE 01-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0SULINA/PR	BDI 1 027%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									-	
1.			REFORMA PONTE					-	-	
1.1.			ESTRUTURA					-	-	
-	Composição	001	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92882	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92885	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	002	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	4730	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	99839	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT:



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	----------------------	------------------	--

- REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
- ADICIONAR 8 FRENTES
- EXCLUIR 8 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	REFORMA PONTE		-	
1.1.	ESTRUTURA		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36	94 barras * 2,94(kg)
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96	306 barras * peso da barra
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00	

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT:



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Err:504

- REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
- ADICIONAR 8 FRENTES
- EXCLUIR 8 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.	REFORMA PONTE		-
1.1.	ESTRUTURA		-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT:

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento

VOLTAR

**ADICIONAR
LINHAS**

EXCLUIR LINHAS

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	0

ATUALIZAR LINHAS			PREENCHIMENTO POR EVENTOS					ADIC. 12 PARCELAS		EXC. 12 PARCELAS				
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	REFORMA PONTE	-	% Período:											
1.1.	ESTRUTURA	-	% Período:					32.73%	11.01%	10.00%	18.75%	18.75%	8.76%	
								32.73%	11.01%	10.00%	18.75%	18.75%	8.76%	
Total: R\$.00000														
	Período:	%:		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:	%:		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU: 31879/D
ART/IRRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

ATUALIZAR
LINHAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 04/25
1.	REFORMA PONTE	-	% Período:	
1.1.	ESTRUTURA	-	% Período:	
Total: R\$.00000			%:	#DIV/0!
Período:		Repasse:		-
		Contrapartida:		-
		Outros:		-
		Investimento:		-
Acumulado:		%:		#DIV/0!
		Repasse:		-
		Contrapartida:		-
		Outros:		-
		Investimento:		-

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO

ATUALIZAR LINHAS

[illegible][illegible]



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	0

MENÚ	Medicação:	1	Período:	28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat	% Realizado Período:	#DIV/0!	% Realizado Acum.:	#DIV/0!
-------------	------------	----------	----------	--------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------

 **ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**



Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	ESTRUTURA
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0

[illegible]

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

[illegible]



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	0

MENU

Medição:	1	Período:	28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat	% Realizado Período.:	#DIV/0!	% Realizado Acum.:	#DIV/0!
----------	---	----------	-------------------------------	-----------------------	---------	--------------------	---------

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

[illegible][illegible]



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	0

MENU

Medição: 1

Período: 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat

% Realizado Período.: #DIV/0!

% Realizado Acum.: #DIV/0!

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

→

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Tuesday, October 22, 2024

Data

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRT: 1720242786239



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	SULINA/PR	RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO					0.00	0.00 0.00
REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE						

MENU

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

CP QCI = CP CONTRATO

Saldo a Reprogramar

Repasse (R\$)

Contrapartida (R\$)

Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			REFORMA PONTE				LOTE 1	-	-	-	-
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)

Observações:

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

Representante Tomador
Nome: PAULO HORN
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 30/12/99
Nº CTEF CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	MUNICÍPIO / UF SULINA/PR		PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/06/Thursday a 06/07/Tuesday
					Nº MEDIÇÃO 3

MENU



Habilitar Modo CAIXA

Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	-	-	-
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00	-	-	55.00	25.00	80.00	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36	-	-	88.00	95.00	183.00	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96	-	-	1,398.40	1,550.00	2,948.40	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48	-	-	13.00	8.00	21.00	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00	-	-	22.20	-	22.20	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

Tuesday, October 22, 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRT: 1720242786239



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	MUNICÍPIO / UF SULINA/PR	REPASSE 0.00	CONTRAPARTIDA 0.00	INVESTIMENTO 0.00	Nº RRE 3	

MENU



Situação do TC/CR: #DIV/0!	Percentual previsto em: Oct-24 #DIV/0!
-------------------------------	---

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Para Metas preenchidas manua
valor medido nas colunas à dir

Valores Medidos (R\$)											Lista C
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REFORMA PONTE	0	0		LOTE 1	3	-	-	-	-	0.00%
2.		0	0				-	-	-	-	0.00%
3.		0	0				-	-	-	-	0.00%
4.		0	0				-	-	-	-	0.00%
5.		0	0				-	-	-	-	0.00%
6.		0	0				-	-	-	-	0.00%
7.		0	0				-	-	-	-	0.00%
8.		0	0				-	-	-	-	0.00%
9.		0	0				-	-	-	-	0.00%
10.		0	0				-	-	-	-	0.00%
							(%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	0.00%
							Repasse	-	-	-	
							Contrapartida	-	-	-	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

SULINA/PR
Local

Representante Tomador
Nome: PAULO HORN
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Tuesday, October 22, 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRT: 1720242786239

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Grau de Sigilo # PÚBLICO

MENU



INSERIR BRASÃO

Ofício nº:

SULINA/PR, 20 de Tishri de Tuesday

À
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
 REF: Contrato de Financiamento - Operação nº

Objeto: 0
 Proponente /
 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0.00%	0.00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

 PAULO HORN
 PREFEITO MUNICIPAL

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000
 CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48
 e-mail jgderivados@gmail.com Telefone (46) 991355105

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 05/2024
 PLANILHA ORÇAMENTARIA

							26,77%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PONTE									
156.000,00									
1.		OBRA							
1.1.			ESTRUTURA					-	156.000,00
1.1.1.	Composição	001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=10 MM	M2	264,00	64,06	BDI 1	81,21	R\$ 21.439,14
1.1.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	276,36	13,21	BDI 1	16,75	R\$ 4.628,01
1.1.3.	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4737,96	10,99	BDI 1	13,93	R\$ 66.009,37
1.1.4.	Composição	002	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	M3	48,48	594,21	BDI 1	753,28	R\$ 36.519,02
1.1.5.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	61,71	BDI 1	78,23	R\$ 17.367,01
1.1.6.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	16,00	494,87	BDI 1	627,34	R\$ 10.037,46

NORTON CESAR SPANIOL
 CPF 077.738.169-99
 SÓCIO PROPRIETARIO / RESPONSÁVEL TÉCNICO

SULINA, 08 DE MAIO DE 2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (DES.)	NOME DA EMPRESA J G DERIVADOS DE CIMENTO	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	Nº CTEF CONTRATO Nº

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									30.560,40	
1.			REFORMA PONTE					-	30.560,40	
1.1.			ESTRUTURA					-	30.560,40	
1.1.1.	Composição	001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	62,72			81,01	5.080,95	RA
1.1.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,66			16,47	1.081,42	RA
1.1.3.	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.125,73			13,97	15.726,45	RA
1.1.4.	Composição	002	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	11,52			753,24	8.677,32	RA
-	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	-			78,01	-	RA
-	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	-			627,32	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SULINA/PR
Local
quarta-feira, 7 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 0

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: DF52-E96E-4E52-ACB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 12/05/2025 09:20:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DF52-E96E-4E52-ACB3>



















BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 03/09/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 9,03%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	-	14.081,82	14.081,82
TOTAL:						-	-	-	-	14.081,82	14.081,82
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,00	-	-	-	-	14.081,82	14.081,82
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,00	-	-	-	-	14.081,82	14.081,82
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	263,90	81,02	21.381,18	-	25,00	25,00	-	2.025,50	2.025,50
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,50	4.559,94	-	27,50	27,50	-	453,75	453,75
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	-	437,00	437,00	-	6.104,89	6.104,89
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,26	36.518,04	-	5,00	5,00	-	3.766,30	3.766,30
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	77,99	17.313,78	-	22,20	22,20	-	1.731,38	1.731,38
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,36	10.037,76	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

quarta-feira, 4 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRT: 1720242786239



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAG. MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	37/2024
OBJETO	EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
MEDICÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	03/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PÁGO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 03 de setembro de 2024.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C927-4CD0-45D0-3A00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 05/09/2024 09:05:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 05/09/2024 09:06:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 05/09/2024 13:31:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C927-4CD0-45D0-3A00>



















BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/09/2024 a 18/09/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 23,70%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	14.081,82	22.885,69	36.967,51
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,00	-	-	-	14.081,82	22.885,69	36.967,51
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,00	-	-	-	14.081,82	22.885,69	36.967,51
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	263,90	81,02	21.381,18	25,00	30,00	55,00	2.025,50	2.430,60	4.456,10
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,50	4.559,94	27,50	60,50	88,00	453,75	998,25	1.452,00
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	437,00	961,40	1.398,40	6.104,89	13.430,76	19.535,65
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,26	36.518,04	5,00	8,00	13,00	3.766,30	6.026,08	9.792,38
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	77,99	17.313,78	22,20	-	22,20	1.731,38	-	1.731,38
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,36	10.037,76	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRT: 1720242786239



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de

SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO

CONTRATADA

CONTRATO Nº

OBJETO

MEDIÇÃO Nº

DATA DA VISTORIA

SULINA

J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

37/2024

EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO

02

18/09/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 18 de setembro de 2024.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D







BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/09/2024 a 08/10/2024
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 43,74%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	36.967,51	31.272,58	68.240,09
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,00	-	-	-	36.967,51	31.272,58	68.240,09
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,00	-	-	-	36.967,51	31.272,58	68.240,09
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	263,90	81,02	21.381,18	55,00	25,00	80,00	4.456,10	2.025,50	6.481,60
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,50	4.559,94	88,00	95,00	183,00	1.452,00	1.567,50	3.019,50
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	1.398,40	1.550,00	2.948,40	19.535,65	21.653,50	41.189,15
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,26	36.518,04	13,00	8,00	21,00	9.792,38	6.026,08	15.818,46
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	77,99	17.313,78	22,20	-	22,20	1.731,38	-	1.731,38
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,36	10.037,76	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

terça-feira, 8 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRT: 1720242786239



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAG. MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	37/2024
OBJETO	EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
MEDICÃO Nº	03
DATA DA VISTORIA	08/10/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAGU MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 08 de outubro de 2024.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 3099-BB8D-EA75-4E7F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 08/10/2024 09:56:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) VIA PORTADOR JOAO PAULO MATIELO (CPF 019.XXX.XXX-40) em 08/10/2024 14:19:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC DOCCLOUD RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) VIA PORTADOR JOAO PAULO MATIELO (CPF 019.XXX.XXX-40) em 08/10/2024 14:20:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC DOCCLOUD RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/3099-BB8D-EA75-4E7F>



























BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/11/2024 a 20/12/2024
					Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 70,29%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	88.979,24	20.678,92	109.658,16
TOTAL:						-	-	-	88.979,24	20.678,92	109.658,16
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,01	-	-	-	88.979,24	20.678,92	109.658,16
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,01	-	-	-	88.979,24	20.678,92	109.658,16
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	264,00	81,01	21.386,64	105,00	50,00	155,00	8.506,05	4.050,50	12.556,55
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,47	4.551,65	208,00	50,00	258,00	3.425,76	823,50	4.249,26
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	3.548,40	700,00	4.248,40	49.571,15	9.779,00	59.350,15
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	O	48,48	753,24	36.517,08	29,00	8,00	37,00	21.843,96	6.025,92	27.869,88
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	78,01	17.318,22	72,20	-	72,20	5.632,32	-	5.632,32
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,32	10.037,12	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RTT: 1720242786239



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAG. MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	37/2024
OBJETO	EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
MEDIÇÃO Nº	05
DATA DA VISTORIA	20/12/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PÁGO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 20 de dezembro de 2024.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7D44-114E-2CCD-FFCC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 20/12/2024 14:32:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 20/12/2024 14:42:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ARI PEDRO LORINI (CPF 603.XXX.XXX-68) em 26/12/2024 08:23:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/7D44-114E-2CCD-FFCC>





















Prefeitura Municipal de
Sulina

Proc. Administrativo 47- 5.035/2024

De: Luciano S. - DE

Para: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Data: 03/02/2025 às 11:02:28

Setores envolvidos:

PREF-VICE, DC, DCO, DE, SMVOS, DF, DE

EMPENHO CONTRATO 37/2024 - OBRAS SOBRE O RIO FORTE

Bom dia, segue em anexo documentos referente a Medição 06 da referida obra no **valor total de R\$ 30.069,07**.
Favor encaminhar todas as certidões da empresa juntamente com a NF.

—
Luciano Steinemann Santiago

Anexos:

Medicao_06.pdf

Relatorio_Fotografico.pdf

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO e GILBERTO JOÃO ROSSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5DA2-1A4D-638C-BA67> e informe o código 5DA2-1A4D-638C-BA67





BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/12/2024 a 03/02/2025
				Nº MEDIÇÃO 6	

Realizado Acumulado: 89,57%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					156.000,01	-	-	-	109.658,16	30.069,07	139.727,23
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,01	-	-	-	109.658,16	30.069,07	139.727,23
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,01	-	-	-	109.658,16	30.069,07	139.727,23
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	264,00	81,01	21.386,64	155,00	109,00	264,00	12.556,55	8.830,09	21.386,64
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,47	4.551,65	258,00	18,36	276,36	4.249,26	302,39	4.551,65
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	4.248,40	489,56	4.737,96	59.350,15	6.839,15	66.189,30
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	O	48,48	753,24	36.517,08	37,00	5,48	42,48	27.869,88	4.127,76	31.997,64
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	78,01	17.318,22	72,20	127,80	200,00	5.632,32	9.969,68	15.602,00
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,32	10.037,12	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRT: 1720242786239



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAGU MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	37/2024
OBJETO	EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
MEDICÃO Nº	06
DATA DA VISTORIA	03/02/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PÁGO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 03 de fevereiro de 2025.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 5DA2-1A4D-638C-BA67

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 03/02/2025 11:03:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILBERTO JOÃO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 05/02/2025 08:03:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5DA2-1A4D-638C-BA67>



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		Nº MEDIÇÃO 1
				PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 26/05/2025	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	-	-	-
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	30.560,40	-	-	-	-	30.560,40	30.560,40
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	30.560,40	-	-	-	-	30.560,40	30.560,40
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	62,72	81,01	5.080,95	-	62,72	62,72	-	5.080,95	5.080,95
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,66	16,47	1.081,42	-	65,66	65,66	-	1.081,42	1.081,42
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.125,73	13,97	15.726,45	-	1.125,73	1.125,73	-	15.726,45	15.726,45
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	11,52	753,24	8.677,32	-	11,52	11,52	-	8.677,32	8.677,32
-	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	-	78,01	-	-	-	-	-	-	-
-	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	-	627,32	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRT: 1720242786239

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C698-ABBE-8662-5D07

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 26/05/2025 07:55:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 26/05/2025 08:19:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 27/05/2025 08:13:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C698-ABBE-8662-5D07>



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de

SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO

CONTRATADA

CONTRATO Nº

OBJETO

DATA DA VISTORIA

SULINA

J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

37/2024

EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO

07/05/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ADITIVO DE VALOR




Assinado por 1 pessoa: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DF52-E96E-4E52-ACB3> e informe o código DF52-E96E-4E52-ACB3



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

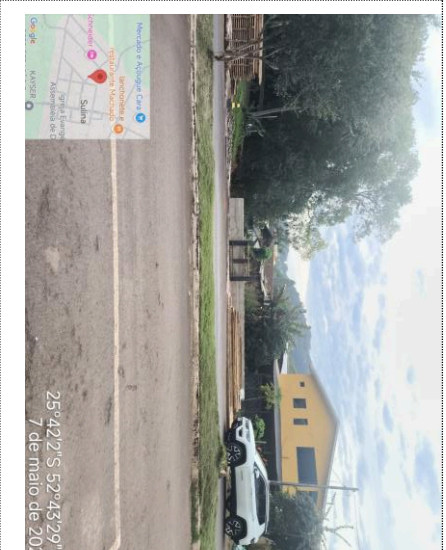

Sulina, 09 de maio de 2025.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: DF52-E96E-4E52-ACB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 12/05/2025 09:20:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DF52-E96E-4E52-ACB3>























BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/02/2025 a 24/06/2025
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	139.727,23	6.220,10	145.953,60
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	145.953,60	-	-	-	139.727,23	6.220,10	145.953,60
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	145.953,60	-	-	-	139.727,23	6.220,10	145.953,60
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	264,00	81,01	21.386,64	264,00	-	264,00	21.386,64	-	21.386,64
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,47	4.551,65	276,36	-	276,36	4.551,65	-	4.551,65
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	4.737,96	-	4.737,96	66.189,30	-	66.189,30
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,24	36.517,08	42,48	6,00	48,48	31.997,64	4.519,44	36.517,08
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	78,01	17.318,22	200,00	22,00	222,00	15.602,00	1.716,22	17.318,22

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR
Local

terça-feira, 24 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-31879/D
ART/RRRT: 1720242786239



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	37/2024
OBJETO	EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
MEDIÇÃO Nº	07 - FINAL
DATA DA VISTORIA	24/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




24 de junho de 2025 08:25



24 de junho de 2025 08:25



24 de junho de 2025 08:25

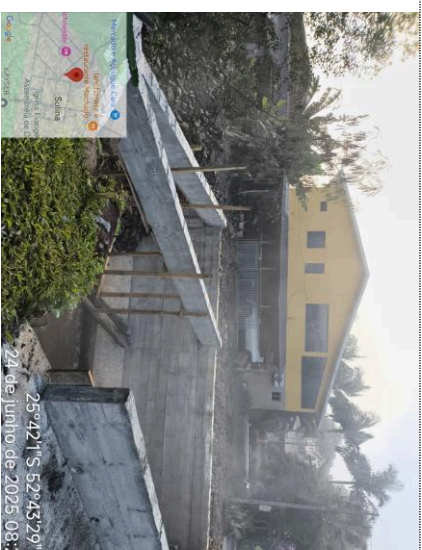

24 de junho de 2025 08:25



24 de junho de 2025 08:26



24 de junho de 2025 08:26



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de

SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PÁGO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 24 de junho de 2025.

Luciano S. Santiago

CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 680D-0CB7-7877-0F43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 25/06/2025 08:11:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 25/06/2025 08:15:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/680D-0CB7-7877-0F43>



















Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - PROVISÓRIO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este **Termo de Recebimento de Obra Provisório**, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo **Licitatório Concorrência Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 37/2024**, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Objeto: EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO

Empresa Executora: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 19.376.115/0001-03.

Valor total do contrato: R\$ 145.953,60 (Cento e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Vigência do contrato: o prazo contratual, vigora até a data de 11 de setembro de 2025.

Prazo de execução: O prazo de vigência de execução vigorou até a data 10 de fevereiro de 2025, conforme termo aditivo ao contrato de 16 de outubro de 2024.

ART de Execução: 1720244531807.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 25 de junho de 2025.

Gilberto J. Rossi
Prefeito Municipal

Luciano S. Santiago
Engenheiro Civil Fiscal da Obra

Moacir da Rosa
Gestor do Contrato

Assinado por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, GILBERTO JOAO ROSSI e MOACIR DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C4C6-5E6E-C288-DBA2> e informe o código C4C6-5E6E-C288-DBA2



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C4C6-5E6E-C288-DBA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 25/06/2025 08:23:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 25/06/2025 13:00:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ MOACIR DA ROSA (CPF 866.XXX.XXX-34) em 25/06/2025 14:35:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C4C6-5E6E-C288-DBA2>
