

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2024	OBRAS SOBRE O RIO FORTE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 37/2024	90	26/05/2024	R\$ 156.000,00	100,00%
12	2024	OBRAS SOBRE O RIO FORTE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 5/2025	90	26/05/2024	R\$ 156.000,00	100,00%

Nº12/2024  
Data Inicial: 26/05/2024

## OBRAS SOBRE O RIO FORTE

R\$ 156.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000607

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6598	2024	03/09/2024	12543
3787	2025	22/05/2025	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	02/09/2024

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/05/2025	37	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*4**18**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**09**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**09**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**62**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5706	R\$ 156.150,79	25/03/2024	
Contrato	37	2024	80.869.886/0001-43	5707	R\$ 156.000,00	08/05/2024	100,00%
Aditivo	5	2025	80.869.886/0001-43	5800	R\$ 30.560,40	12/05/2025	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5708	Medição	1	Jurisdicionado	03/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	9,03%
5718	Medição	2	Jurisdicionado	10/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	23,70%
5728	Medição	3	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	43,74%
5752	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	57,04%
5760	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	70,29%
5771	Medição	6	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	89,57%
5783	Medição	7	Jurisdicionado	24/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	89,57%
5791	Medição	8	Jurisdicionado	30/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	89,57%
5801	Medição	9	Jurisdicionado	26/05/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2025	100,00%
5809	Medição	10	Jurisdicionado	24/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2024	100,00%
5820	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/07/2025			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900203988179					
0	900203988179	1	10/07/2025	06/01/2026	

Nº12/2024  
Data Inicial: 26/05/2024

# OBRAS SOBRE O RIO FORTE

## Documentos

R\$ 156.000,00

**CAIXA** **PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.6**

Tipo de Orçamento  Acompanhamento

**DADOS DO CONTRATO** **NOVIDADES DA VERSÃO**

**DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

**BDI** **ORÇAMENTO** **MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ**

**QCI** **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 10-Monday.xlsm.

**PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**

**ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**

MENU

## A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL
Município/UF:	SULINA/PR
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	01-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	LUCIANO S. SANTIAGO
CREA/CAU:	31879/D
ART/IRRT:	
Data do preenchimento:	10/22/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	PAULO HORN
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

## B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	CONTRATO Nº 37/2024
Nome da empresa:	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ da empresa:	19.376.115/0001-03
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

## C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	10/22/2024

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	PR-31879/D
ART/IRRT (para obras/projetos):	1720242786239

## MENU

## Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Event</li> </ul>
<u>V3.0.1</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajustes de formatações.</li> </ul> <p><b>PO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correção da aplicação do BDI não desonerado.</li> <li>■ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamen</li> </ul>
<u>V3.0.2</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajustes de formatações.</li> <li>■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>ORÇAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.</li> </ul> <p><b>RRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.</li> </ul>
<u>V3.0.3</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>CÁLCULO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.</li> </ul>
<u>V3.0.4</u>	<p><b>BDI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldi</li> </ul>
<u>V3.0.5</u>	<p><b>GERAL</b></p>

- Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

V3.0.6

**GERAL**

- Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o Transfere
- A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usac

os.

to Licitado'.

í linhas.

o a reprogramar de CP).

⇒GOV, altera na aba DADOS  
do arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm



## Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
------------------	----------------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /
---

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

## BDI 1

<b>TIPO DE OBRA</b> Construção e Reforma de Edifícios
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3.00%
Seguro e Garantia	SG	0.80%
Risco	R	0.97%
Despesas Financeiras	DF	1.23%
Lucro	L	7.40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20.73%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26.77%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SULINA/PR  
Local

Tuesday, October 22, 2024  
Data



## Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		5.00%

Responsável Técnico  
**Nome:** LUCIANO S. SANTIAGO  
**CREA/CAU:** 31879/D  
**ART/RRT:**

## BDI 2

## TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>0.00%</b>

**X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



## Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%


 SULINA/PR  
 Local

 Tuesday, October 22, 2024  
 Data

 Responsável Técnico  
 Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
 CREA/CAU: 31879/D  
 ART/RRT:

## BDI 3

 TIPO DE OBRA  
 (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0.00%

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1 + DF) * (1 + ) - 1$$



## Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
------------------	----------------------	--

## APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

## Observações:

 SULINA/PR  
 Local

 Tuesday, October 22, 2024  
 Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-	DATA BASE 01-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/SULINA/PR	BDI 1 027%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

ADICIONAR  
LINHAS

EXCLUIR LINHAS

FIXAR  
DESCRIÇÕES

RECUPERAR  
FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										
1.			REFORMA PONTE							
1.1.			ESTRUTURA							
-	Composição	001	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92882	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92885	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	002	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	4730	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	99839	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SULINA/PR

Local

Tuesday, October 22, 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

CREA/CAU: 31879/D

ART/IRRT:

RECURSO  
↓


**MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
 - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL
---	-----------------------------	-------------------------	---

 REDEFINIR AGRUPADORES DE  
 EVENTOS

 ADICIONAR 8  
 FRENTES

 EXCLUIR 8  
 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	<b>REFORMA PONTE</b>		-	
1.1.	<b>ESTRUTURA</b>		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36	94 barras * 2,94(kg)
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96	306 barras * peso da barra
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00	

 SULINA/PR  
 Local

Tuesday, October 22, 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT:


**MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
 - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
 REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE

**Nº TransfereGOV**  
 0

**Nº OPERAÇÃO**  
 0

**PROPONENTE / TOMADOR**  
 PREFEITURA MUNICIPAL

Err:504

**REDEFINIR AGRUPADORES DE  
EVENTOS**
**ADICIONAR 8  
FRENTES**
**EXCLUIR 8  
FRENTES**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.	<b>REFORMA PONTE</b>		-
1.1.	ESTRUTURA		-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00

 SULINA/PR  
 Local

 Tuesday, October 22, 2024  
 Data

 Responsável Técnico  
 Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
 CREA/CAU: 31879/D  
 ART/RRT:

**AGRUPADORES DE EVENTOS**

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento

**VOLTAR**

**ADICIONAR  
LINHAS**

**EXCLUIR LINHAS**

**Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.**


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 (SELECIONAR)

 Grau de  
 #PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	--	---	------------------------

**ATUALIZAR  
LINHAS**
**PREENCHIMENTO POR  
EVENTOS**
**ADIC. 12  
PARCELAS**
**EXC. 12  
PARCELAS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	REFORMA PONTE	-	% Período:											
1.1.	ESTRUTURA	-	% Período:					32.73%	11.01%	10.00%	18.75%	18.75%	8.76%	
<b>Total: R\$ .00000</b>				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Período:	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SULINA/PR

Local

Tuesday, October 22, 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

CREA/CAU: 31879/D

ART/IRRT:



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
(SELECIONAR) **LÍCIDO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
------------------	--------------	--

**ATUALIZAR  
LINHAS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 04/25
1.	REFORMA PONTE	-	% Período:	
1.1.	ESTRUTURA	-	% Período:	
<b>Total: R\$ .00000</b>			%:	#DIV/0!
Período:		Repasse:		-
		Contrapartida:		-
		Outros:		-
		<b>Investimento:</b>		-
Acumulado:		%:		#DIV/0!
		Repasse:		-
		Contrapartida:		-
		<b>Investimento:</b>		-

SULINA/PR

Local

Tuesday, October 22, 2024

Data









PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------------	--	---	------------------------

MENU

Medição: **1** Período: **28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat** % Realizado Período.: **#DIV/0!** % Realizado Acum.: **#DIV/0!**

← **ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO  
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**

→

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Tuesday, October 22, 2024

Data

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-31879/D  
ART/RRT: 1720242786239



## QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF SULINA/PR	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 0.00	CONTRAPARTIDA 0.00	INVESTIMENTO 0.00

MENU

ADICIONAR  
LINHAS

EXCLUIR LINHAS

CP QCI = CP  
CONTRATOSaldo a  
ReprogramarRepasse (R\$)  
-Contrapartida (R\$)  
-Para inclusão de metas de outras  
Plan. Mult., digite a descrição e  
valores manualmente ao lado.

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			REFORMA PONTE				LOTE 1	-	-	-	-
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								- ( 0.00%)	- ( 0.00%)	- ( 0.00%)	- ( 0.00%)

Observações:

SULINA/PR

Local

Tuesday, October 22, 2024

Data

Representante Tomador

Nome: PAULO HORN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



BM - Boletim de Medição  
 Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 30/12/99
Nº CTEF CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	MUNICÍPIO / UF SULINA/PR	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/06/Thursday a 06/07/Tuesday
				Nº MEDIÇÃO 3

MENU



Habilitar Modo CAIXA

Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 000%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
<b>TOTAL:</b>						-	-	-	-	-	-	-
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	264.00	-	-	55.00	25.00	80.00	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	276.36	-	-	88.00	95.00	183.00	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	4,737.96	-	-	1,398.40	1,550.00	2,948.40	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	48.48	-	-	13.00	8.00	21.00	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	222.00	-	-	22.20	-	22.20	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Monday.xlsm)	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

Tuesday, October 22, 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRT: 1720242786239



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	MUNICÍPIO / UF SULINA/PR	REPASSE 0.00	CONTRAPARTIDA 0.00	INVESTIMENTO 0.00	Nº RRE 3	

MENU

Situação do TC/CR:  
#DIV/0!Percentual previsto em:  
Oct-24 #DIV/0!Saldo a  
ReprogramarRepasse (R\$)  
-Contrapartida (R\$)  
-Para Metas preenchidas manua  
valor medido nas colunas à dir

Valores Medidos (R\$)

Lista C

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REFORMA PONTE	0	0		LOTE 1	3	-	-	-	-	0.00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
							(%)	( 0.00% )	( 0.00% )	( 0.00% )	( 0.00% )	
							Repasse	-	-	-	-	
							Contrapartida	-	-	-	-	0.00%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	-	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

SULINA/PR

Local

Tuesday, October 22, 2024

Data

Representante Tomador

Nome: PAULO HORN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRT: 1720242786239

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Grau de Sigilo # PÚBLICO
-----------------------------

MENU



INSERIR BRASÃO

Ofício nº: 

SULINA/PR, 20 de Tishri de Tuesday

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desembolso de Recursos.  
REF: Contrato de Financiamento - Operação nº

Objeto: 0  
Proponente /  
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0.00%	0.00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

---

PAULO HORN  
PREFEITO MUNICIPAL

**JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME**

Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000  
 CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48  
 e-mail [jgderivados@gmail.com](mailto:jgderivados@gmail.com) Telefone (46) 991355105

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 05/2024  
 PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
								26,77%		
<b>REFORMA PONTE</b>									156.000,00	
<b>1.</b>			<b>OBRA</b>							
<b>1.1.</b>			<b>ESTRUTURA</b>						-	156.000,00
1.1.1.	Composição	001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=10 MM	M2	264,00	64,06	BDI 1	81,21	R\$ 21.439,14	
1.1.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	276,36	13,21	BDI 1	16,75	R\$ 4.628,01	
1.1.3.	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4737,96	10,99	BDI 1	13,93	R\$ 66.009,37	
1.1.4.	Composição	002	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	M3	48,48	594,21	BDI 1	753,28	R\$ 36.519,02	
1.1.5.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	61,71	BDI 1	78,23	R\$ 17.367,01	
1.1.6.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	16,00	494,87	BDI 1	627,34	R\$ 10.037,46	

NORTON CESAR SPANIOL

CPF 077.738.169-99

SÓCIO PROPRIETARIO / RESPONSÁVEL TÉCNICO

SULINA, 08 DE MAIO DE 2024



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-24 (DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> J G DERIVADOS DE CIMENTO	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> (SELECIONAR)
			<b>Nº CTEF</b> CONTRATO Nº

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									30.560,40	
1.			<b>REFORMA PONTE</b>					-	30.560,40	
1.1.			<b>ESTRUTURA</b>					-	30.560,40	
1.1.1.	Composição	001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	62,72			81,01	5.080,95	RA
1.1.2.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,66			16,47	1.081,42	RA
1.1.3.	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.125,73			13,97	15.726,45	RA
1.1.4.	Composição	002	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	11,52			753,24	8.677,32	RA
-	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	-			78,01	-	RA
-	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	-			627,32	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SULINA/PR

Local

quarta-feira, 7 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT: 0



VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS



Código para verificação: DF52-E96E-4E52-ACB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 12/05/2025 09:20:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DF52-E96E-4E52-ACB3>



















**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 03/09/2024	Nº MEDIÇÃO 1

**Realizado Acumulado: 9,03%**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
<b>TOTAL:</b>					<b>156.000,00</b>	-	-	-	-	14.081,82	14.081,82
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,00	-	-	-	-	14.081,82	14.081,82
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,00	-	-	-	-	14.081,82	14.081,82
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	263,90	81,02	21.381,18	-	25,00	25,00	-	2.025,50	2.025,50
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,50	4.559,94	-	27,50	27,50	-	453,75	453,75
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	-	437,00	437,00	-	6.104,89	6.104,89
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,26	36.518,04	-	5,00	5,00	-	3.766,30	3.766,30
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	77,99	17.313,78	-	22,20	22,20	-	1.731,38	1.731,38
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,36	10.037,76	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

quarta-feira, 4 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRR: 1720242786239



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>37/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>01</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>03/09/2024</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

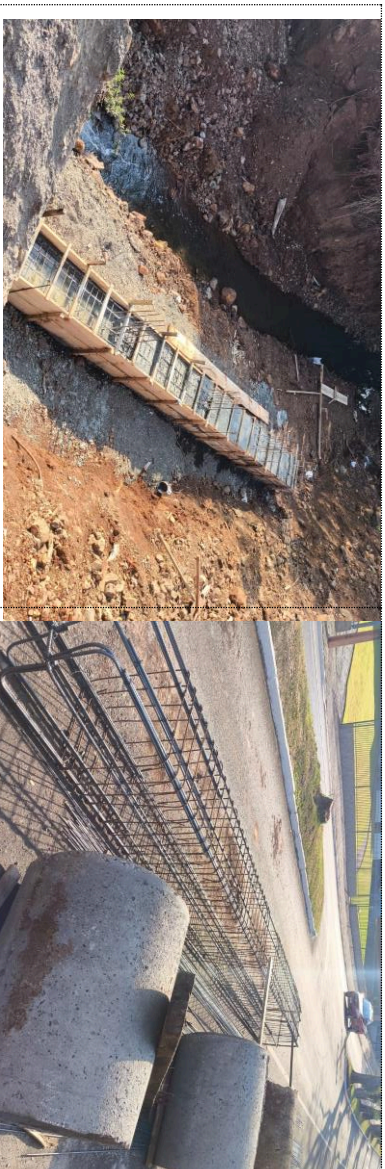

Sulina, 03 de setembro de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: C927-4CD0-45D0-3A00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 05/09/2024 09:05:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 05/09/2024 09:06:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 05/09/2024 13:31:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C927-4CD0-45D0-3A00>



















**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/09/2024 a 18/09/2024	Nº MEDIÇÃO 2

**Realizado Acumulado: 23,70%**

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	14.081,82	22.885,69	36.967,51
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,00	-	-	-	14.081,82	22.885,69	36.967,51
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,00	-	-	-	14.081,82	22.885,69	36.967,51
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	263,90	81,02	21.381,18	25,00	30,00	55,00	2.025,50	2.430,60	4.456,10
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,50	4.559,94	27,50	60,50	88,00	453,75	998,25	1.452,00
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	437,00	961,40	1.398,40	6.104,89	13.430,76	19.535,65
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,26	36.518,04	5,00	8,00	13,00	3.766,30	6.026,08	9.792,38
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	77,99	17.313,78	22,20	-	22,20	1.731,38	-	1.731,38
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,36	10.037,76	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRRT: 1720242786239



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de

**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>37/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>02</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>18/09/2024</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 18 de setembro de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D







**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/09/2024 a 08/10/2024	Nº MEDIÇÃO 3

**Realizado Acumulado: 43,74%**

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	36.967,51	31.272,58	68.240,09
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,00	-	-	-	36.967,51	31.272,58	68.240,09
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,00	-	-	-	36.967,51	31.272,58	68.240,09
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	263,90	81,02	21.381,18	55,00	25,00	80,00	4.456,10	2.025,50	6.481,60
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,50	4.559,94	88,00	95,00	183,00	1.452,00	1.567,50	3.019,50
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	1.398,40	1.550,00	2.948,40	19.535,65	21.653,50	41.189,15
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,26	36.518,04	13,00	8,00	21,00	9.792,38	6.026,08	15.818,46
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	77,99	17.313,78	22,20	-	22,20	1.731,38	-	1.731,38
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,36	10.037,76	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

terça-feira, 8 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRRT: 1720242786239




Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>37/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>03</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>08/10/2024</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

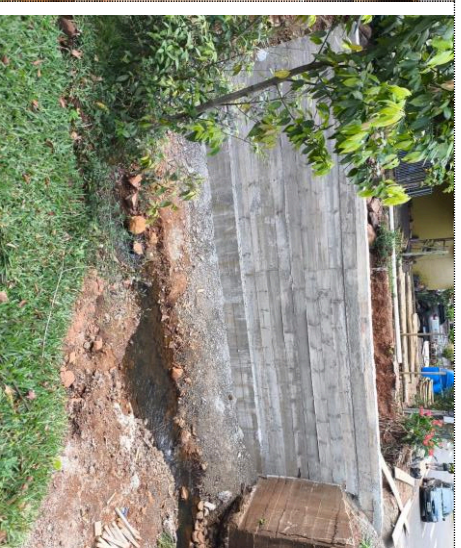



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 08 de outubro de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 3099-BB8D-EA75-4E7F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 08/10/2024 09:56:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) VIA PORTADOR JOAO PAULO MATIELO (CPF 019.XXX.XXX-40) em 08/10/2024 14:19:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC DOCCLOUD RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) VIA PORTADOR JOAO PAULO MATIELO (CPF 019.XXX.XXX-40) em 08/10/2024 14:20:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC DOCCLOUD RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/3099-BB8D-EA75-4E7F>



























BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/11/2024 a 20/12/2024	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 70,29%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
<b>TOTAL:</b>					<b>156.000,01</b>	-	-	-	88.979,24	20.678,92	109.658,16
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,01	-	-	-	88.979,24	20.678,92	109.658,16
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,01	-	-	-	88.979,24	20.678,92	109.658,16
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	264,00	81,01	21.386,64	105,00	50,00	155,00	8.506,05	4.050,50	12.556,55
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,47	4.551,65	208,00	50,00	258,00	3.425,76	823,50	4.249,26
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	3.548,40	700,00	4.248,40	49.571,15	9.779,00	59.350,15
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,24	36.517,08	29,00	8,00	37,00	21.843,96	6.025,92	27.869,88
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	78,01	17.318,22	72,20	-	72,20	5.632,32	-	5.632,32
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 . GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,32	10.037,12	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

sexta-feira, 20 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRT: 1720242786239



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>37/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>05</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>20/12/2024</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 20 de dezembro de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D44-114E-2CCD-FFCC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 20/12/2024 14:32:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 20/12/2024 14:42:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ARI PEDRO LORINI (CPF 603.XXX.XXX-68) em 26/12/2024 08:23:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/7D44-114E-2CCD-FFCC>





















Prefeitura Municipal de  
**Sulina**

## Proc. Administrativo 47- 5.035/2024

**De:** Luciano S. - DE

**Para:** J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

**Data:** 03/02/2025 às 11:02:28

**Setores envolvidos:**

PREF-VICE, DC, DCO, DE, SMVOS, DF, DE

### EMPENHO CONTRATO 37/2024 - OBRAS SOBRE O RIO FORTE

Bom dia, segue em anexo documentos referente a Medição 06 da referida obra no **valor total de R\$ 30.069,07**. Favor encaminhar todas as certidões da empresa juntamente com a NF.

—  
Luciano Steinemann Santiago

**Anexos:**

Medicao\_06.pdf

Relatorio\_Fotografico.pdf





BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/12/2024 a 03/02/2025	Nº MEDIÇÃO 6

Realizado Acumulado: 89,57%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	156.000,01	-	-	-	109.658,16	30.069,07	139.727,23
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	156.000,01	-	-	-	109.658,16	30.069,07	139.727,23	
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	156.000,01	-	-	-	109.658,16	30.069,07	139.727,23	
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	264,00	81,01	21.386,64	155,00	109,00	264,00	12.556,55	8.830,09	21.386,64	
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,47	4.551,65	258,00	18,36	276,36	4.249,26	302,39	4.551,65	
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	4.248,40	489,56	4.737,96	59.350,15	6.839,15	66.189,30	
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,24	36.517,08	37,00	5,48	42,48	27.869,88	4.127,76	31.997,64	
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	78,01	17.318,22	72,20	127,80	200,00	5.632,32	9.969,68	15.602,00	
1.1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 . GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,00	627,32	10.037,12	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRT: 1720242786239



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>37/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>06</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>03/02/2025</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 03 de fevereiro de 2025.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DA2-1A4D-638C-BA67

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 03/02/2025 11:03:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GILBERTO JOÃO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 05/02/2025 08:03:05 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5DA2-1A4D-638C-BA67>



**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 26/05/2025	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
<b>TOTAL:</b>					<b>30.560,40</b>	-	-	-	-	30.560,40	30.560,40
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	30.560,40	-	-	-	-	30.560,40	30.560,40
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	30.560,40	-	-	-	-	30.560,40	30.560,40
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	62,72	81,01	5.080,95	-	62,72	62,72	-	5.080,95	5.080,95
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,66	16,47	1.081,42	-	65,66	65,66	-	1.081,42	1.081,42
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.125,73	13,97	15.726,45	-	1.125,73	1.125,73	-	15.726,45	15.726,45
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	11,52	753,24	8.677,32	-	11,52	11,52	-	8.677,32	8.677,32
-	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	-	78,01	-	-	-	-	-	-	-
-	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	-	627,32	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRT: 1720242786239

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: C698-ABBE-8662-5D07

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 26/05/2025 07:55:54 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 26/05/2025 08:19:15 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 27/05/2025 08:13:58 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C698-ABBE-8662-5D07>



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>37/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>07/05/2025</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ADITIVO DE VALOR



Assinado por 1 pessoa: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DF52-E96E-4E52-ACB3> e informe o código DF52-E96E-4E52-ACB3






Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)  
[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)



25°42'2\"/>

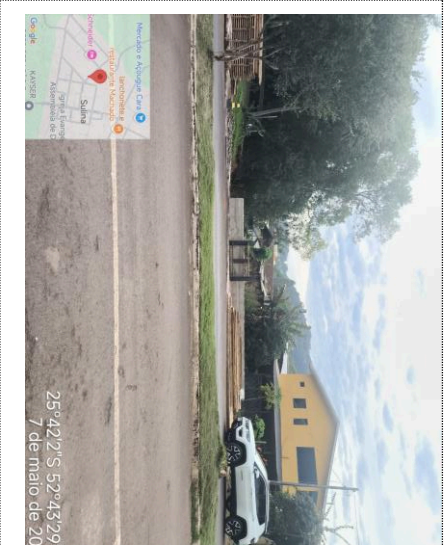

25°42'2\"/>

Sulina, 09 de maio de 2025.

---

Luciano S. Santiago  
 CREA-PR 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS



Código para verificação: DF52-E96E-4E52-ACB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 12/05/2025 09:20:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DF52-E96E-4E52-ACB3>























**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PONTE SOBRE RIO FORTE	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA J G DERIVADOS DE CIMENTO	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/02/2025 a 24/06/2025	Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
<b>TOTAL:</b>					145.953,60	-	-	-	139.727,23	6.220,10	145.953,60
1.	REFORMA PONTE	-	-	-	145.953,60	-	-	-	139.727,23	6.220,10	145.953,60
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	145.953,60	-	-	-	139.727,23	6.220,10	145.953,60
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10MM.	M2	264,00	81,01	21.386,64	264,00	-	264,00	21.386,64	-	21.386,64
1.1.2.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	276,36	16,47	4.551,65	276,36	-	276,36	4.551,65	-	4.551,65
1.1.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.737,96	13,97	66.189,30	4.737,96	-	4.737,96	66.189,30	-	66.189,30
1.1.4.	CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	0	48,48	753,24	36.517,08	42,48	6,00	48,48	31.997,64	4.519,44	36.517,08
1.1.5.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	222,00	78,01	17.318,22	200,00	22,00	222,00	15.602,00	1.716,22	17.318,22

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

terça-feira, 24 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-31879/D

ART/RRRT: 1720242786239




Estado do Paraná  
**Prefeitura Municipal de**  
**SULINA**

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>37/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>07 - FINAL</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>24/06/2025</b>

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

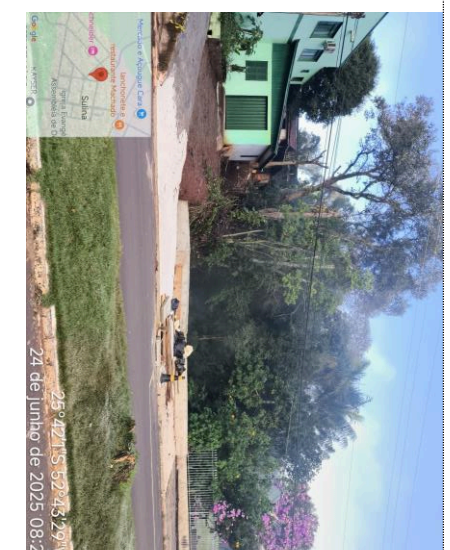




Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

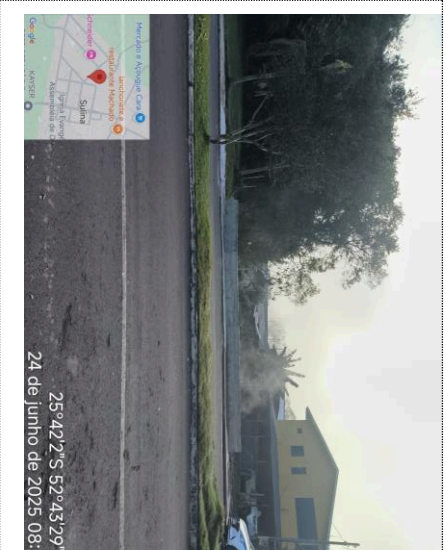

Sulina, 24 de junho de 2025.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 680D-0CB7-7877-0F43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 25/06/2025 08:11:27 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 19.376.115/0001-03) em 25/06/2025 08:15:18 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/680D-0CB7-7877-0F43>



















Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



### TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - PROVISÓRIO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este **Termo de Recebimento de Obra Provisório**, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo **Licitatório Concorrência Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 37/2024**, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

**Objeto:** EXECUÇÃO DE ALA E GALERIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO

**Empresa Executora:** J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 19.376.115/0001-03.

**Valor total do contrato:** R\$ 145.953,60 (Cento e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

**Vigência do contrato:** o prazo contratual, vigora até a data de 11 de setembro de 2025.

**Prazo de execução:** O prazo de vigência de execução vigorou até a data 10 de fevereiro de 2025, conforme termo aditivo ao contrato de 16 de outubro de 2024.

**ART de Execução:** 1720244531807.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

*Sulina, 25 de junho de 2025.*

Gilberto J. Rossi  
Prefeito Municipal

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Civil Fiscal da Obra

Moacir da Rosa  
Gestor do Contrato

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: C4C6-5E6E-C288-DBA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 25/06/2025 08:23:21 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 25/06/2025 13:00:56 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MOACIR DA ROSA (CPF 866.XXX.XXX-34) em 25/06/2025 14:35:56 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C4C6-5E6E-C288-DBA2>
