


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	COBERTURA PARQUINHOS CMEI E ESCOLA MUNICIPAL, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BUSSATO E GINÁSIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 46/2024	150	29/05/2024	R\$ 269.500,00	100,00%
10	2024	COBERTURA PARQUINHOS CMEI E ESCOLA MUNICIPAL, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BUSSATO E GINÁSIO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	150	29/05/2024	R\$ 269.500,00	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1211

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
5835	2024	09/08/2024	12543
5901	2024	14/08/2024	12543
9503	2024	13/12/2024	12543
9502	2024	13/12/2024	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/08/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
29/05/2025	46	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*4**75**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*4*.6**-12	RRT (CAU)	14**5*3*	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**40**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**40**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5691	R\$ 300.890,94	23/02/2024	
Contrato	46	2024	80.869.886/0001-43	5692	R\$ 269.499,95	29/04/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.869.886/0001-43	5729	R\$ 72.435,94	25/11/2024	100,00%


Acompanhamentos


Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5693	Medição	1	Jurisdicionado	12/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	57,32%
5702	Medição	2	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	57,32%
5716	Medição	3	Jurisdicionado	07/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	97,09%
5726	Medição	4	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	97,09%
5748	Medição	5	Jurisdicionado	05/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
5749	Medição	6	Jurisdicionado	05/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	100,00%
5750	Conclusão	7	Jurisdicionado	06/12/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900194324473



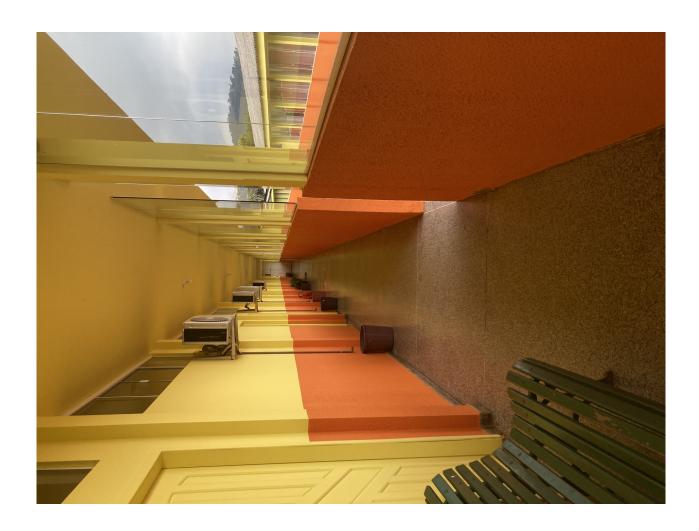

Município de Sulina

CAIXA

BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONE	NTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV APELIDO DO EMPREENI	DIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITUR	RA MUNICIPAL	0	0 COBERTURA DE PARQU	INHOS CMEI E ARNALDO E REFORMA ESCOLA ARNADO	05/06/24
N° CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
46/2024	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	05/06/2024 a 08/082024	1

Realizado Acumulado: 57,32%

	Orçamento Contratado						ução Física (0	Qtde.)	Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do	CTEF:			TOTAL:	269.499,95	-	-	-	-	154.471,60	154.471,60
1.	COBERTURA PARQUINHOS E REFORMA ARNALDO	-	-	-	269.499,95	-	-	-	-	154.471,60	154.471,60
1.1.	COBERTURA PARQUINHOS	-	-	-	104.403,22	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	606,35	75,68	45.888,57	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	197,58	52,41	10.355,17	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00	759,08	2.277,24	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	14,00	849,91	11.898,74	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	1.212,73	3.638,19	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	8,00	1.696,42	13.571,36	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00	1.943,26	5.829,78	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PA	KG	420,88	16,21	6.822,46	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	56,20	73,34	4.121,71	-	-	-	-	-	-
1.2.	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL	-	-	-	125.870,13	-	-	-	-	124.530,73	124.530,73
1.2.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.755,98	14,76	25.918,26	-	1.755,98	1.755,98	-	25.918,26	25.918,26
1.2.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	107,28	32,01	3.434,03	-	107,28	107,28	-	3.434,03	3.434,03
1.2.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	97,38	908,62	88.481,42	-	97,38	97,38	-	88.481,42	88.481,42
1.2.4.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	7,20	1.116,17	8.036,42	-	6,00	6,00	-	6.697,02	6.697,02
1.3.	JARDINAGEM - CMEI	-	-	-	8.941,50	-	-	-	-	1.388,70	1.388,70
1.3.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	315,00	15,16	4.775,40	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	30,00	138,87	4.166,10	-	10,00	10,00	-	1.388,70	1.388,70
1 /	FECHAMENTO - CMEI				15 244 70					13 511 77	13 511 77

o por 4 pessoas: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN, PAULO HORN , MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE RUÇÃO EIRELI e CLECILDE FABIANE Ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A50E-1E53-2D18-2690 e informe o código A50E-1E53-2D18-2690

Município de Sulina

CAIXA

BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONEN	NTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA
PREFEITUR	RA MUNICIPAL	0	0	COBERTURA DE PARQUINHOS CMEI E A	RNALDO E REFORMA ESCOLA ARNADO	05/06/24
N° CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇ	ÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
46/2024	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		05/06/2024 a 08/082024	1

Realizado Acumulado: 57,32%

	Orçamento Contratado						ução Física (C	Qtde.)	Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do C	TEF:			TOTAL:	269.499,95	-	-	-		154.471,60	154.471,60
1.4.2.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	5,47	1.116,17	6.105,45	-	4,90	4,90	-	5.469,23	5.469,23
1.5.	BANCADA DE MADEIRA PARA ARQUIBANCA DO GINÁSIO MUNICIPAL	-	-	-	15.040,40	-	-	-	-	15.040,40	15.040,40
1.5.1.	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	М	400,00	28,85	11.540,00	-	400,00	400,00	-	11.540,00	11.540,00
1.5.2.	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	700,00	0,60	420,00	-	700,00	700,00	-	420,00	420,00
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	120,00	25,67	3.080,40	-	120,00	120,00	-	3.080,40	3.080,40

O	bs	er	va	сõ	es	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e específicações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR Local quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Responsável Técnico pela Fiscalização Nome: Cassia Eduarda Goularte Fritzen

Profissão: Engenheira Civil CREA/CAU: CREA RS: 208163/D

ART/RRT: 0



prefeitura@sulina.pr.gov.br PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná www.sulina.pr.gov.br

CONTRATADA **MUNICÍPIO**

CONTRATO Nº OBJETO

MEDIÇÃO Nº DATA DA VISTORIA


> MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP SULINA

46/2024

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BUSATO E COBERTURA DOS PARQUINHOS DA ESCOLA E CMEI

08/08/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

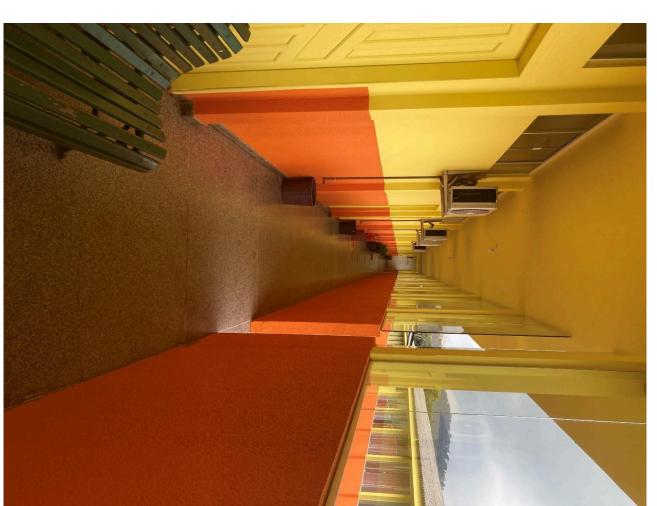



Pintura externa





Pintura Externa





Esquadrias Biblioteca



Esquadrias Sala de Informática






prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br




Porta Sala de Informática







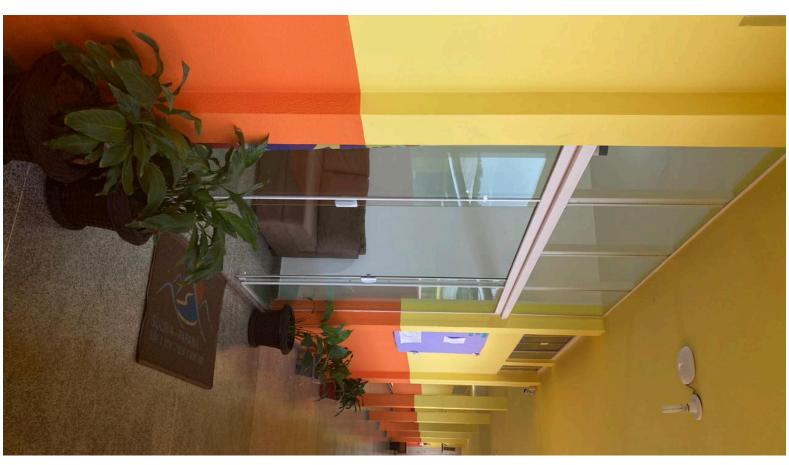

Esquadria Porta da Secretária



prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br






Esquadria Superior



Esquadrias Superior






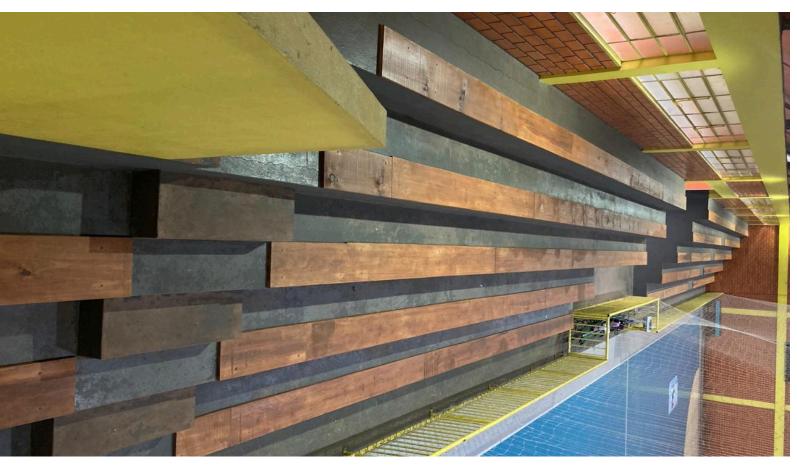

Tabuas da Arquibancada





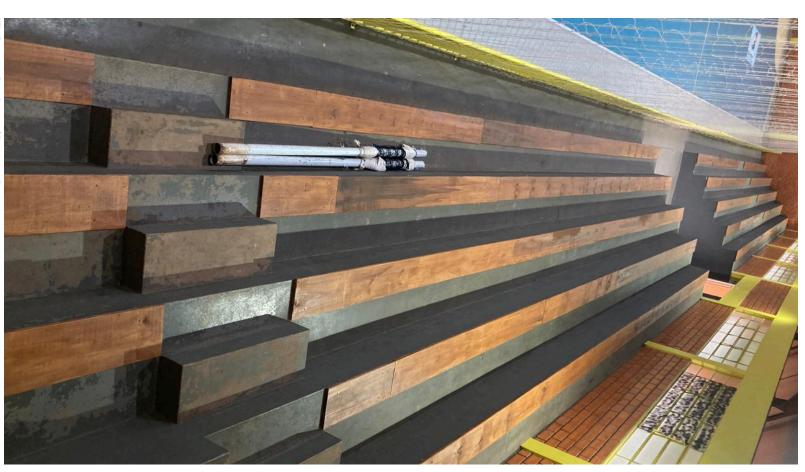

Tabuas da Arquibancada





Grades do CMEI





Sulina, 19 de julho de 2024.

Eng. (CREA-RS 20816 Cassia E. G. Fri



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A50E-1E53-2D18-2690

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN (CPF 054.XXX.XXX-55) em 09/08/2024 11:25:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 09/08/2024 12:51:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 16.700.335/0001-52) em 09/08/2024 14:25:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 12/08/2024 10:14:56 (GMT-03:00)

Papel: Parte


Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)


Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A50E-1E53-2D18-2690





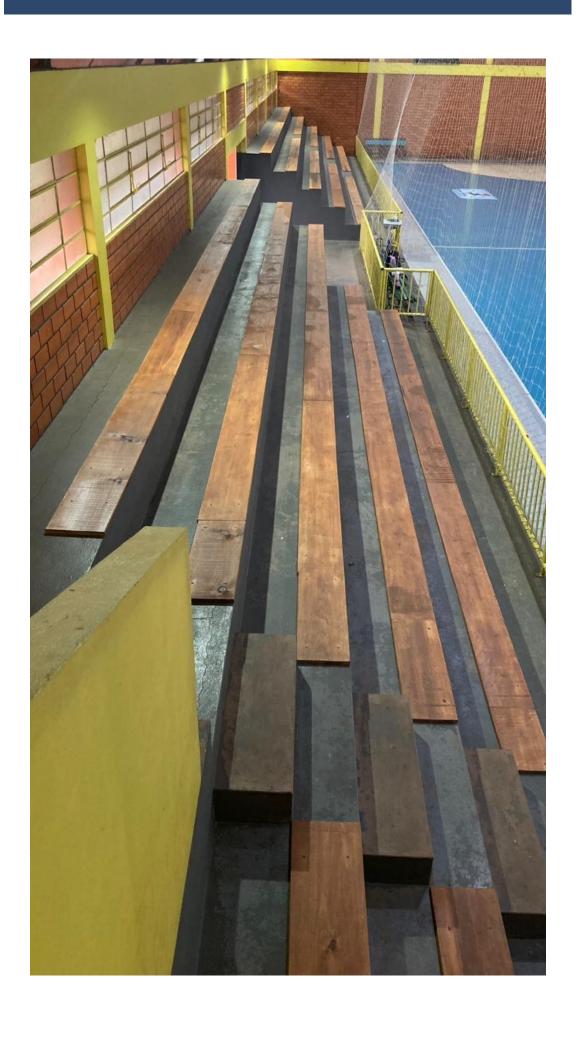

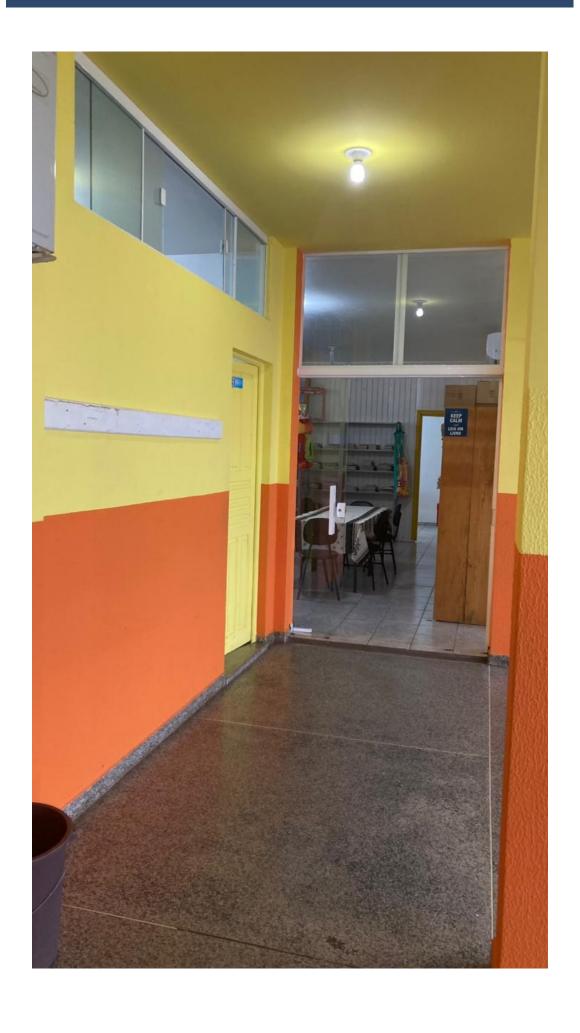







PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA - PR.

SUBPROJETO: COBERTURA PARQUINHOS CMEI E ESCOLA MUNICIPAL, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BUSSATO E GINÁSIO

EMPRESA CONTRATADA: Marcio Gallina Construção Civil e materiais de Construção - EIRELI

VALOR REAL:

CONTRATO Nº:

R\$ 269.500,00

46/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BUSATO E COBERTURA DOS PARQUINHOS DA ESCOLA E CMEI E DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MADEIRA NAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 02/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização da segunda medição

Aos 04 (Quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento, porém com a medição 2ª ainda não finalizada.

Prefeito Municipal

Sulina - PR, 04 de setembro de 2024.

Município de Sulina

CAIXA

BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONE	NTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL		0		COBERTURA DE PARQUINHOS CMEI E ARNALDO E REFORMA ESCOLA ARNADO	05/06/24
N° CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECU	ÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
46/2024	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	#VALOR!	2

Realizado Acumulado: 97,09%

						1			, 1		
	Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do 0	CTEF:		<u> </u>	TOTAL:	269.499,95	-	-	-	154.471,60	107.180,62	261.652,22
1.	COBERTURA PARQUINHOS E REFORMA ARNALDO	-	-	-	269.499,95	-	-	-	154.471,60	107.180,62	261.652,22
1.1.	COBERTURA PARQUINHOS	-	-	-	104.403,22	-	-	-	-	104.403,22	104.403,22
1.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	606,35	75,68	45.888,57	-	606,35	606,35	-	45.888,57	45.888,57
1.1.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	197,58	52,41	10.355,17	-	197,58	197,58	-	10.355,17	10.355,17
1.1.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00	759,08	2.277,24	-	3,00	3,00	-	2.277,24	2.277,24
1.1.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF 12/2015	UN	14,00	849,91	11.898,74	-	14,00	14,00	-	11.898,74	11.898,74
1.1.5.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00	1.212,73	3.638,19	-	3,00	3,00	-	3.638,19	3.638,19
1.1.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	8,00	1.696,42	13.571,36	-	8,00	8,00	-	13.571,36	13.571,36
1.1.7.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICÁ, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00	1.943,26	5.829,78	-	3,00	3,00	-	5.829,78	5.829,78
1.1.8.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PA	KG	420,88	16,21	6.822,46	-	420,88	420,88	-	6.822,46	6.822,46
1.1.9.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	56,20	73,34	4.121,71	-	56,20	56,20	-	4.121,71	4.121,71
1.2.	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL	-	-	-	125.870,13	-	-	-	124.530,73	-	124.530,73
1.2.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.755,98	14,76	25.918,26	1.755,98	-	1.755,98	25.918,26	-	25.918,26
1.2.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	107,28	32,01	3.434,03	107,28	-	107,28	3.434,03	-	3.434,03
1.2.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	97,38	908,62	88.481,42	97,38	-	97,38	88.481,42	-	88.481,42
1.2.4.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	7,20	1.116,17	8.036,42	6,00	-	6,00	6.697,02	-	6.697,02
1.3.	JARDINAGEM - CMEI	-	-	-	8.941,50	-	-	-	1.388,70	2.777,40	4.166,10
1.3.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	315,00	15,16	4.775,40	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	30,00	138,87	4.166,10	10,00	20,00	30,00	1.388,70	2.777,40	4.166,10
1.4	FECHAMENTO - CMEL				15 244 70				13 511 77		13 511 77

o por 4 pessoas: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN, RODRIGO PIRES FRANCO, PAULO HORN e MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/3047-042D-2D12-1D07 e informe o código 3047-042D-2D12-1D07

Município de Sulina

CAIXA

BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPOI	IENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA
PREFEI	URA MUNICIPAL	0	0	COBERTURA DE PARQUINHOS CMEI E	ARNALDO E REFORMA ESCOLA ARNADO	05/06/24
N° CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇ	ÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
46/2024	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)		#VALOR!	2

Realizado Acumulado: 97,09%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do C	TEF:			TOTAL:	269.499,95	-	-	-	154.471,60	107.180,62	261.652,22
1.4.2.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	5,47	1.116,17	6.105,45	4,90	-	4,90	5.469,23	-	5.469,23
1.5.	BANCADA DE MADEIRA PARA ARQUIBANCA DO GINÁSIO MUNICIPAL	-	-	-	15.040,40	-	-	-	15.040,40	-	15.040,40
1.5.1.	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	М	400,00	28,85	11.540,00	400,00	-	400,00	11.540,00	-	11.540,00
1.5.2.	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	700,00	0,60	420,00	700,00	-	700,00	420,00	-	420,00
1.5.3.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	120,00	25,67	3.080,40	120,00	-	120,00	3.080,40	-	3.080,40

O	bs	er	va	сõ	es	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR

Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Cassia Eduarda Goularte Fritzen

Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA RS: 208163/D

ART/RRT: 0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3047-042D-2D12-1D07

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN (CPF 054.XXX.XXX-55) em 07/10/2024 09:45:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RODRIGO PIRES FRANCO (CPF 060.XXX.XXX-12) em 07/10/2024 09:54:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 07/10/2024 19:38:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)


✓ MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 16.700.335/0001-52) em 10/10/2024 10:08:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte


Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)


Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:


https://sulina.1doc.com.br/verificacao/3047-042D-2D12-1D07

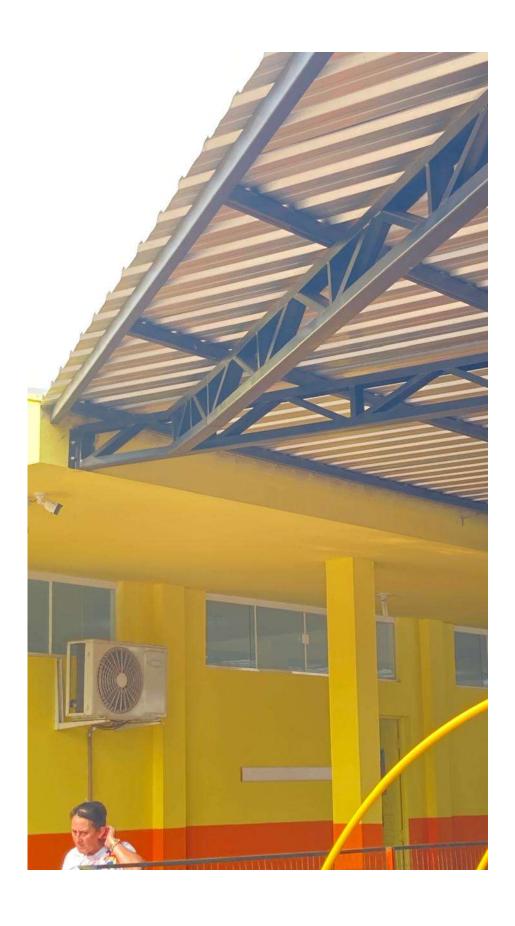




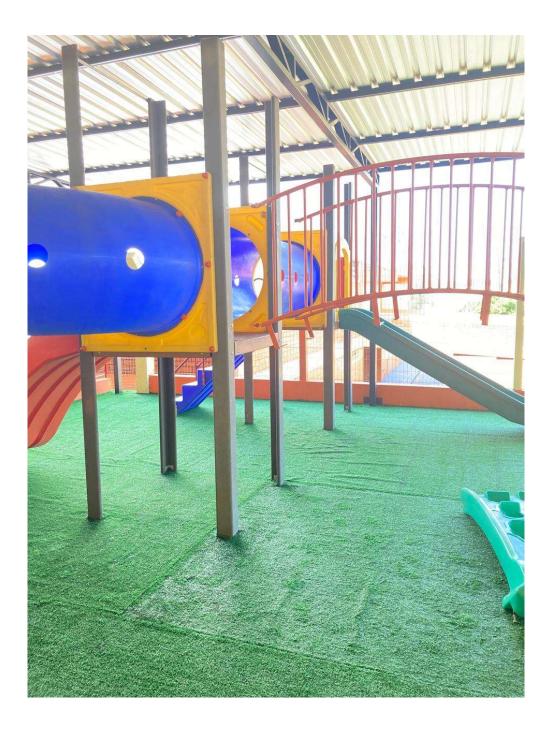


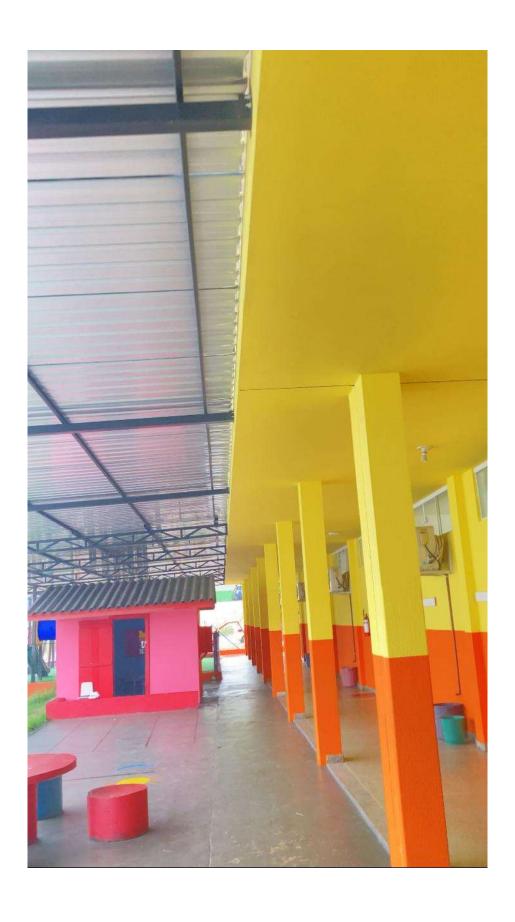


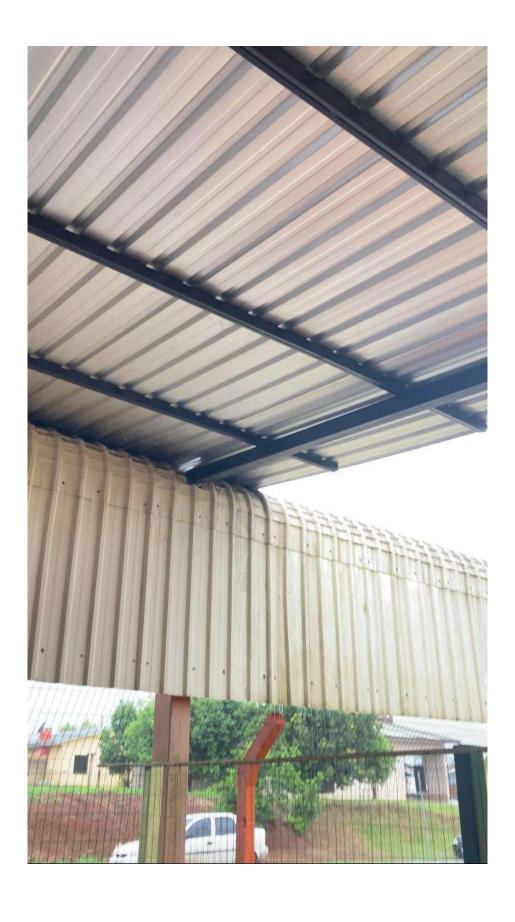


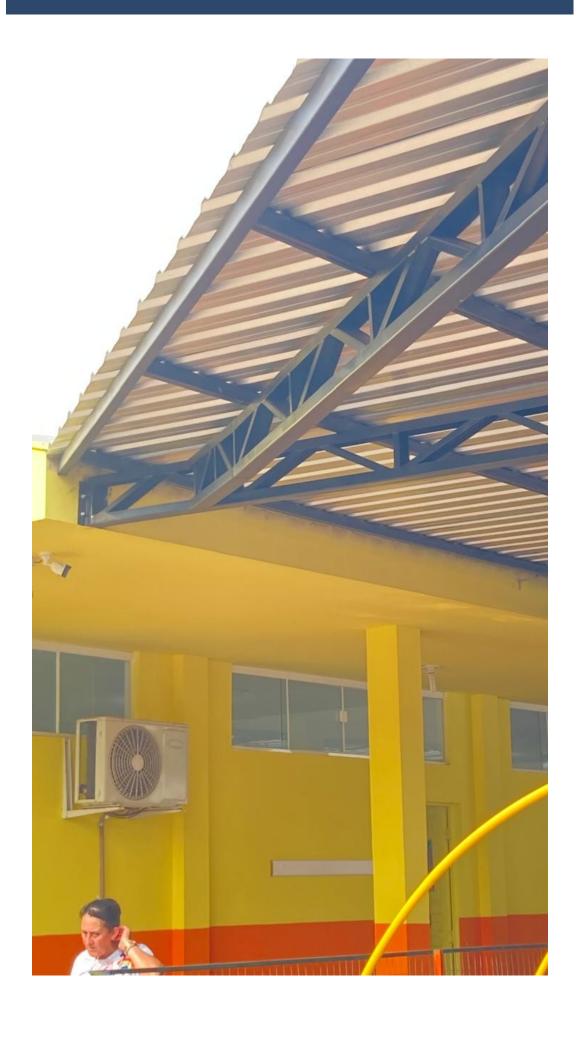



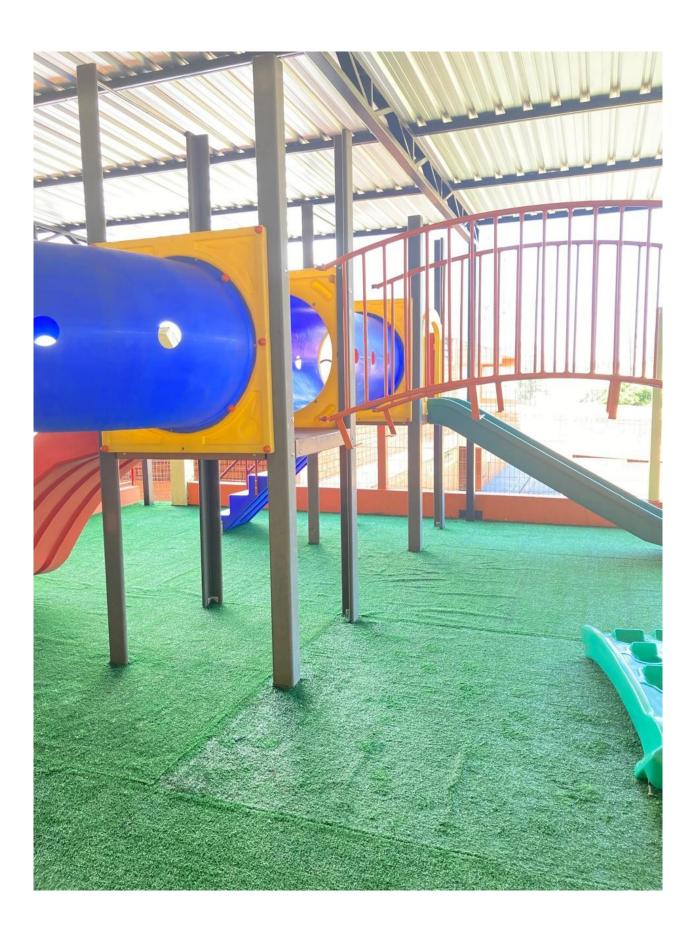

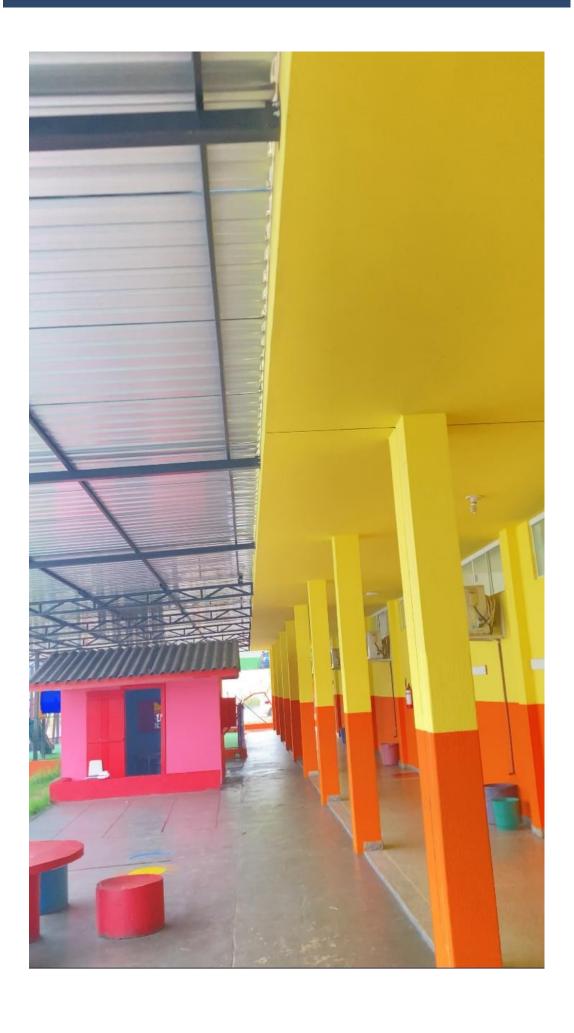

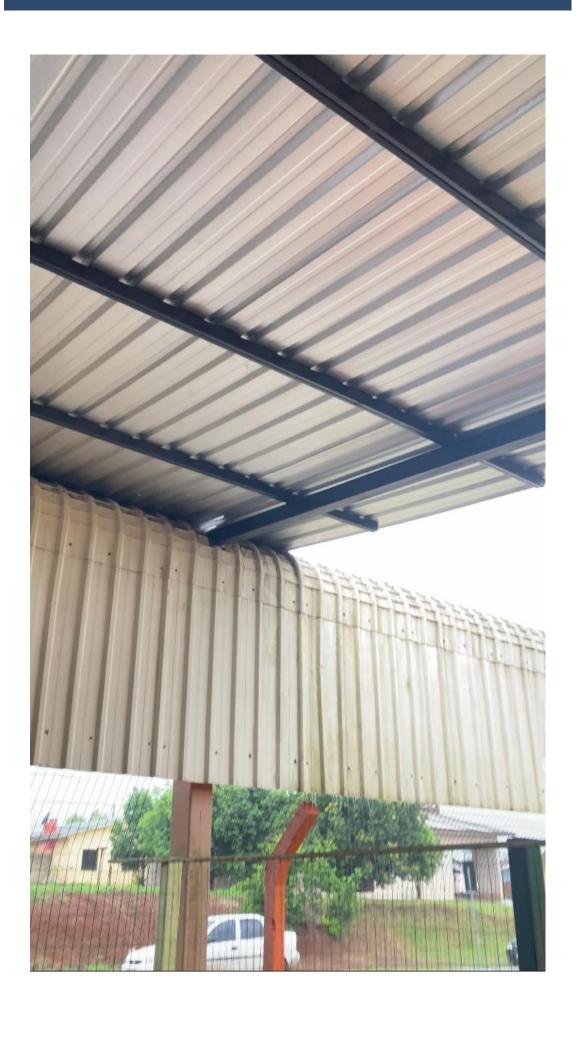



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA - PR.

SUBPROJETO: COBERTURA PARQUINHOS CMEI E ESCOLA MUNICIPAL, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BUSSATO E GINÁSIO

EMPRESA CONTRATADA: Marcio Gallina Construção Civil e materiais de Construção - EIRELI

VALOR REAL: CONTRATO №:

R\$ 269.500,00 46/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BUSATO E COBERTURA DOS PARQUINHOS DA ESCOLA E CMEI E DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MADEIRA NAS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 02/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização da segunda medição

Aos 04 (Quatro) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento, porém com a medição 2ª ainda não finalizada.

Prefeito Municipal

Sulina – PR, 04 de novembro de 2024.
