

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	Muro do Cemitério Municipal Esta intervenção foi concluída	Contrato 165/2023	120	01/10/2023	R\$ 129.257,31	100,00%
6	2023	Muro do Cemitério Municipal Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2024	120	01/10/2023	R\$ 129.257,31	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 01/10/2023

Muro do Cemitério Municipal

R\$ 129.257,31

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000517

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9718	2023	29/12/2023	12543
2612	2024	24/05/2024	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/02/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/08/2024	165	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*1**15**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**33**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**33**	Orçamento	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**33**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5622	R\$ 136.398,46	15/05/2023	
Contrato	165	2023	80.869.886/0001-43	5623	R\$ 129.257,31	11/07/2023	100,00%
Aditivo	3	2024	80.869.886/0001-43	5641	R\$ 25.569,22	01/04/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5624	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	43,24%
5625	Medição	2	Jurisdicionado	05/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	77,16%
5634	Medição	3	Jurisdicionado	15/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	89,72%
5642	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	100,00%
5654	Medição	5	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	100,00%
5655	Conclusão	6	Jurisdicionado	11/06/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900187071871	900187071871	1	27/05/2024	23/11/2024	

Nº6/2023
Data Inicial: 01/10/2023

Muro do Cemitério Municipal

Documentos

R\$ 129.257,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
Sulina
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

OBRA: MURO CEMITERIO MUNICIPAL
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL
DATA: 5/15/2023

Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor do Item R\$	BDI	Valor Total R\$
1								
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8.2	89.88	737.02	23.14%	R\$ 907.56
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	197.00	14.84	2923.48	23.14%	R\$ 3,599.97
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	791.58	13.08	10353.87	23.14%	R\$ 12,749.75
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	274.12	7.99	2190.22	23.14%	R\$ 2,697.04
1.5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	89.00	74.46	6626.94	23.14%	R\$ 8,160.41
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	12.81	572.71	7336.42	23.14%	R\$ 9,034.06
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12.37	548.20	6781.23	23.14%	R\$ 8,350.41
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	328.94	93.63	30798.65	23.14%	R\$ 37,925.46
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	740.12	4,87	#VALUE!	23.14%	#VALUE!
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	370.06	38.60	14284.32	23.14%	R\$ 17,589.71
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	370.06	3.11	1150.89	23.14%	R\$ 1,417.20
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	370.06	23.31	8626.10	23.14%	R\$ 10,622.18
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	398.75	29,35	#VALUE!	23.14%	#VALUE!
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	227.00	16.08	3650.16	23.14%	R\$ 4,494.81
TOTAL FINAL								#VALUE!

LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 209647/D

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná				PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br	
OBRA:	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
LOCAL:	CEMITÉRIO MUNICIPAL							
DATA:	5/15/2023							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	TOTAL	
1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 907.56	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 453.78	R\$ 453.78	R\$ -	R\$ -	R\$ 907.56	
2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 3,599.97	30.00%	40.00%	30.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 1,079.99	R\$ 1,439.99	R\$ 1,079.99	R\$ -	R\$ 3,599.97	
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 12,749.75	30.00%	40.00%	30.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 3,824.93	R\$ 5,099.90	R\$ 3,824.93	R\$ -	R\$ 12,749.75	
4	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	R\$ 2,697.04	10.00%	50.00%	40.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 269.70	R\$ 1,348.52	R\$ 1,078.81	R\$ -	R\$ 2,697.04	
5	MOUROAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	R\$ 8,160.41	10.00%	40.00%	50.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 816.04	R\$ 3,264.17	R\$ 4,080.21	R\$ -	R\$ 8,160.41	
6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	R\$ 9,034.06	30.00%	40.00%	30.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 2,710.22	R\$ 3,613.62	R\$ 2,710.22	R\$ -	R\$ 9,034.06	
7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 8,350.41	30.00%	40.00%	30.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 2,505.12	R\$ 3,340.16	R\$ 2,505.12	R\$ -	R\$ 8,350.41	
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 37,925.46	20.00%	40.00%	40.00%	0.00%	100.00%	
			R\$ 7,585.09	R\$ 15,170.18	R\$ 15,170.18	R\$ -	R\$ 37,925.46	
9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	#VALUE!	0.00%	40.00%	40.00%	20.00%	100.00%	
			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	R\$ 17,589.71	0.00%	35.00%	40.00%	25.00%	100.00%	
			R\$ -	R\$ 6,156.40	R\$ 7,035.88	R\$ 4,397.43	R\$ 17,589.71	
11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$ 1,417.20	0.00%	0.00%	30.00%	70.00%	100.00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ 425.16	R\$ 992.04	R\$ 1,417.20	
12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	R\$ 10,622.18	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	100.00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ 4,248.87	R\$ 6,373.31	R\$ 10,622.18	
13	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	#VALUE!	0.00%	10.00%	30.00%	60.00%	100.00%	
			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 4,494.81	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	100.00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ 1,797.92	R\$ 2,696.88	R\$ 4,494.81	
TOTAL DO ORÇAMENTO =			#VALUE!					
TOTAL SIMPLES (R\$)=			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
TOTAL ACUMULADO (R\$) =			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
PORCENTAGEM SIMPLES =			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
PORCENTAGEM ACUMULADA=			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		

OBRA:		MUNICÍPIO MUNICIPAL		JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME				
LOCAL:		CEMITÉRIO MUNICIPAL		Alameda Doze, 993 - Bairro Industrial - CEP 85.525-000				
DATA:		11/07/2023		CNPJ: 19.376.115/0001-03 RASC. ESTADUAL: 90656893-48 e-mail: fideleirados@gmail.com Telefone: (41) 931.353-105				
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor do Item R\$	BDI	Valor Total R\$
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	8,2	89,38	737,02	23,14%	R\$ 907,56
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 08/2022	KG	197,00	14,34	2923,48	23,14%	R\$ 3.699,97
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 08/2022	KG	791,58	13,08	10353,87	23,14%	R\$ 12.749,75
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM.	M	274,12	7,89	2190,22	23,14%	R\$ 2.697,04
1.5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	89,00	74,46	6626,94	23,14%	R\$ 8.160,41
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 11/2016	M3	12,81	572,71	7338,42	23,14%	R\$ 9.034,06
1.7	SINAPI	ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_ 02/2022	M3	12,37	548,20	6781,23	23,14%	R\$ 8.350,41
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLIPADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	328,94	76,00	24999,44	23,14%	R\$ 30.784,31
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 08/2014	M2	740,12	4,87	3604,38	23,14%	R\$ 4.438,44
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_ 08/2014	M2	370,06	38,60	14284,32	23,14%	R\$ 17.689,71
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_ 08/2014	M2	370,06	3,11	1150,89	23,14%	R\$ 1.417,20
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA, ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_ 08/2014	M2	370,06	23,31	8626,10	23,14%	R\$ 10.622,18
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	388,75	29,35	11703,31	23,14%	R\$ 14.111,46
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_ 08/2014	M2	227,00	16,08	3650,16	23,14%	R\$ 4.491,91
			TOTAL FINAL					R\$ 179.257,31

JOAO PAULO MATIELO
SÓCIO PROPRIETARIO
CPF: 019.826.761-40

R\$ 19.376.115/0001-03

JG DERIVADOS DE
CIMENTO LTDA - ME

Alameda Doze, 993
Industrial

Mariópolis/PR

85.525-000

SULINA, 11 DE JULHO DE 2023.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME					
OBRA: MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL		Alameda Doze 993 - Bairro Industrial - CEP 85525-000					
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL		CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48					
DATA: 11/07/2023		e-mail: jgderivados@gmail.com Telefone (41) 991.355.105					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	TOTAL
1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MELHOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	R\$ 907,56	50,00%	R\$ 453,78	R\$ 453,78	R\$ 0,00%	R\$ 907,56
2	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	R\$ 3.599,97	30,00%	R\$ 1.079,99	R\$ 1.439,99	R\$ 1.079,99	R\$ 3.599,97
3	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 80 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	R\$ 12.749,75	30,00%	R\$ 3.824,93	R\$ 5.099,90	R\$ 3.824,93	R\$ 12.749,75
4	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), AL TURA = 128,0 MM, DIAMETRO DOS BRAÇOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,3 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	R\$ 2.697,04	10,00%	R\$ 269,70	R\$ 1.348,52	R\$ 1.078,81	R\$ 2.697,04
5	MOURAÇO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	R\$ 8.160,41	10,00%	R\$ 816,04	R\$ 3.264,17	R\$ 4.080,21	R\$ 8.160,41
6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	R\$ 9.034,05	30,00%	R\$ 2.710,22	R\$ 3.613,62	R\$ 2.710,22	R\$ 9.034,05
7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	R\$ 8.350,41	30,00%	R\$ 2.505,12	R\$ 3.340,16	R\$ 2.505,12	R\$ 8.350,41
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X16X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	R\$ 30.784,31	20,00%	R\$ 6.156,86	R\$ 12.313,72	R\$ 12.313,72	R\$ 30.784,31
9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_08/2014	R\$ 4.438,44	0,00%	R\$ -	R\$ 1.775,38	R\$ 1.775,38	R\$ 4.438,44
10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 B. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA, (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2014	R\$ 17.589,71	0,00%	R\$ -	R\$ 6.156,40	R\$ 7.035,68	R\$ 17.589,71
11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, LIMA DEBATO, AF_05/2014	R\$ 1.417,20	0,00%	R\$ -	R\$ 425,16	R\$ 592,04	R\$ 1.417,20
12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_06/2014	R\$ 10.622,18	0,00%	R\$ -	R\$ 4.248,67	R\$ 6.373,31	R\$ 10.622,18
13	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	R\$ 14.411,46	0,00%	R\$ -	R\$ 1.441,15	R\$ 4.323,44	R\$ 14.411,46
14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS CORES, AF_06/2014	R\$ 4.494,81	0,00%	R\$ -	R\$ 1.797,92	R\$ 2.696,88	R\$ 4.494,81
TOTAL DO ORÇAMENTO =		R\$ 129.257,31					
TOTAL SIMPLES (R\$) =		R\$ 17.816,65					
TOTAL ACUMULADO (R\$) =		R\$ 17.816,65					
PORCENTAGEM SIMPLES =		13,78%					
PORCENTAGEM ACUMULADA =		13,78%					

F19.376.115/0001-03

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME

Alameda Doze, 993 Industrial

Mariópolis/PR

CPF: 019.826.761-40

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME

Alameda Doze, 993 Industrial

Mariópolis/PR

CPF: 019.826.761-40


JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME

Alameda Doze, 993 Industrial

Mariópolis/PR

CPF: 019.826.761-40

SULINA, 11 DE JULHO DE 2023.

<h2 style="text-align: center;">PLANILHA DE ADITIVO</h2>					Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná		PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br	
OBRA:	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL		Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor do Item R\$	BDI	Valor Total R\$
LOCAL:	CEMITÉRIO MUNICIPAL							
DATA:	01/04/2024							
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor do Item R\$	BDI	Valor Total R\$
1								
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,85	89,88	76,40	23,14%	R\$ 94,08
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,87	14,84	57,43	23,14%	R\$ 70,72
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,39	13,08	188,22	23,14%	R\$ 231,78
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	7,00	7,99	55,93	23,14%	R\$ 68,87
1.5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN		74,46	0,00	23,14%	R\$ 0,00
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,85	572,71	486,80	23,14%	R\$ 599,45
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,78	548,20	427,60	23,14%	R\$ 526,54
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00	93,63	1404,45	23,14%	R\$ 1.729,44
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	30,00	4,87	146,10	23,14%	R\$ 179,91
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,00	38,60	1158,00	23,14%	R\$ 1.425,51
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	246,89	3,11	767,83	23,14%	R\$ 945,51
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	306,98	23,31	7155,70	23,14%	R\$ 8.811,59
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	18,00	29,35	528,30	23,14%	R\$ 650,58
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	516,89	16,08	8311,59	23,14%	R\$ 10.234,89
TOTAL FINAL								R\$ 25.569,92

LUCIANO S. SANTIAGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 8840-493B-EDAD-F9DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 01/04/2024 14:27:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/8840-493B-EDAD-F9DA>














-25°42'21"S -52°44'3"W
Sulina
Paraná
4 de março de 2024



-25°42'23"S -52°44'7"W
Sulina
Paraná
4 de março de 2024

Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Total R\$	Med% 02	Valor R\$	%	Valor R\$	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>OBRA: MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL</p> <p>LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL</p> <p>DATA: 01/03/2024</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</p> </div> <div style="width: 25%; text-align: right;"> <p>PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>MED 02</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>MED ACUMULADA</p> </div> </div>										
1										
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,2	R\$ 907,56			100,00%	R\$ 907,56	
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	197,00	R\$ 3.599,97			100,00%	R\$ 3.599,97	
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	791,58	R\$ 12.749,75			100,00%	R\$ 12.749,75	
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	274,12	R\$ 2.697,04	100,00%	R\$ 2.697,04	100,00%	R\$ 2.697,04	
1.5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	89,00	R\$ 8.160,41			100,00%	R\$ 8.160,41	
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	12,81	R\$ 9.034,06			100,00%	R\$ 9.034,06	
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,37	R\$ 8.350,41	50,00%	R\$ 4.175,21	100,00%	R\$ 8.350,41	
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	328,94	R\$ 30.784,31	70,00%	R\$ 21.549,02	100,00%	R\$ 30.784,31	
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	740,12	R\$ 4.438,44	70,00%	R\$ 3.106,91	100,00%	R\$ 4.438,44	
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 17.589,71	70,00%	R\$ 12.312,80	100,00%	R\$ 17.589,71	
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 1.417,20			100,00%	R\$ 1.417,20	
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 10.622,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	398,75	R\$ 14.411,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	227,00	R\$ 4.494,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL FINAL						R\$ 129.257,31	33,92%	R\$ 43.840,97	77,16%	R\$ 99.728,88
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										
<p>Itens em verde, foram pagos 100% na MED 01</p> <p>Valor desta medição: R\$ 43.840,97</p>										
<p>Empresa</p> <p>J G Derivados de Cimento LTDA</p>			<p>Prefeitura Municipal</p> <p>Eng. Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D</p>				<p>Prefeito (a) Paulo Horn</p>			



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de

SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	165/2023
OBJETO	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL
MEDIÇÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	01/03/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Assinado por 2 pessoas: PAULO HORN e LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2343-B0C8-19AB-8782> e informe o código 2343-B0C8-19AB-8782





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10

Município de Sulina

Sulina, 04 de março de 2024.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2343-B0C8-19AB-8782

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 05/03/2024 13:22:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 05/03/2024 16:38:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2343-B0C8-19AB-8782>



-25°42'21"S -52°44'4"W
Sulina
Paraná
16 de maio de 2024



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9701-DFE7-A4B6-D1FF> e informe o código 9701-DFE7-A4B6-D1FF



OBRA: MURO CEMITERIO MUNICIPAL		MED 03		MED				
LOCAL: CEMITERIO MUNICIPAL				ACUMULADA				
DATA: 15/04/2024								
Código	Origem	Serviço	Quantidade	Valor Total R\$	Med% 02	Valor R\$	%	Valor R\$
1								
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 907,56		R\$ 907,56	100,00%	R\$ 907,56
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 3.599,97		R\$ 3.599,97	100,00%	R\$ 3.599,97
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 12.749,75		R\$ 12.749,75	100,00%	R\$ 12.749,75
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120.0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6.0 MM,	M	R\$ 2.697,04		R\$ 2.697,04	100,00%	R\$ 2.697,04
1.5	SINAPI	DIAMETRO DA DIAGONAL = 4.2 MM	UN	R\$ 8.160,41		R\$ 8.160,41	100,00%	R\$ 8.160,41
1.6	SINAPI	MOURO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, "10 X 10" CM, H= 3.00 M	M3	R\$ 9.034,06		R\$ 9.034,06	100,00%	R\$ 9.034,06
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MAIORES OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$ 8.350,41		R\$ 8.350,41	100,00%	R\$ 8.350,41
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 30.784,31		R\$ 30.784,31	100,00%	R\$ 30.784,31
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R\$ 4.438,44		R\$ 4.438,44	100,00%	R\$ 4.438,44
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA, SEM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$ 17.589,71		R\$ 17.589,71	100,00%	R\$ 17.589,71
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 1.417,20		R\$ 1.417,20	100,00%	R\$ 1.417,20
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	R\$ 10.622,18	55,00%	R\$ 5.842,20	55,00%	R\$ 5.842,20
1.13	SINAPI	TELA DE ARAJME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2.11 MM (1.4 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	R\$ 14.411,46	55,00%	R\$ 7.926,30	55,00%	R\$ 7.926,30
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÕES. AF_06/2014	M2	R\$ 4.494,81	55,00%	R\$ 2.472,15	55,00%	R\$ 2.472,15
TOTAL FINAL				R\$ 129.257,31	12,56%	R\$ 16.240,65	89,72%	R\$ 115.969,54

Valor desta medição: R\$ 16.240,65

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Empresa
J G Derivados de Cimento LTDA

Prefeitura Municipal
Eng. Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D

Prefeito (a) Paulo Horn

JG DERIVADOS
DE CIMENTO
LTDA
Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2024.04.15 18:35:21 -03'00'

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO STEIN



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de

SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	165/2023
OBJETO	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL
MEDIÇÃO Nº	03
DATA DA VISTORIA	15/04/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Assinado por 2 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO e PAULO HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9701-DFE7-A4B6-D1FF> e informe o código 9701-DFE7-A4B6-D1FF



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 15 de abril de 2024.

Luciano S. Santiago
 CREA-PR 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 9701-DFE7-A4B6-D1FF



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 17/04/2024 10:02:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 17/04/2024 15:55:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9701-DFE7-A4B6-D1FF>

MEDIÇÃO ADITIVO									
OBRA:	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL					<p>Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</p>		<p>PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br</p>	
LOCAL:	CEMITÉRIO MUNICIPAL								
DATA:	15/04/2024								
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Total R\$	MED	Valor Total R\$		
1									
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,85	R\$ 94,08	100,00%	R\$ 94,08		
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,87	R\$ 70,72	100,00%	R\$ 70,72		
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,39	R\$ 231,78	100,00%	R\$ 231,78		
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	7,00	R\$ 68,87	100,00%	R\$ 68,87		
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,85	R\$ 599,45	100,00%	R\$ 599,45		
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,78	R\$ 526,54	100,00%	R\$ 526,54		
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00	R\$ 1.729,44	100,00%	R\$ 1.729,44		
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	30,00	R\$ 179,91	100,00%	R\$ 179,91		
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,00	R\$ 1.425,96	100,00%	R\$ 1.425,96		
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	246,89	R\$ 945,50	100,00%	R\$ 945,50		
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	306,98	R\$ 8.811,53	100,00%	R\$ 8.811,53		
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	18,00	R\$ 650,55	100,00%	R\$ 650,55		
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	516,89	R\$ 10.234,89	100,00%	R\$ 10.234,89		
TOTAL FINAL					R\$ 25.569,22	100,00%	R\$ 25.569,22		

Luciano S. Santiago
 CREA: 31879/D

Empresa Contratante

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
 Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
 Dados: 2024.04.15 15:37:06 -03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AE4-F406-CEA1-C0DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 18/04/2024 13:01:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 23/04/2024 08:11:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/1AE4-F406-CEA1-C0DF>



-25°42'21"S -52°44'4"W
Sulina
Paraná
16 de maio de 2024



-25°42'21"S -52°44'3"W
Sulina
Paraná
16 de maio de 2024










-25°42'20"S -52°44'6"W
Sulina
Paraná
16 de maio de 2024





MEDIDAÇÃO - 04 FINAL			 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de SULINA Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná			PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br		MED 04 - FINAL	MED ACUMULADA
OBRA:	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
LOCAL:	CEMITÉRIO MUNICIPAL								
DATA:	16/05/2024								
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Total R\$	Med% 04	Valor R\$	%	Valor R\$
1									
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,2	R\$ 907,56			100,00%	R\$ 907,56
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	197,00	R\$ 3.599,97			100,00%	R\$ 3.599,97
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	791,58	R\$ 12.749,75			100,00%	R\$ 12.749,75
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	274,12	R\$ 2.697,04			100,00%	R\$ 2.697,04
1.5	SINAPI	MOURO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	89,00	R\$ 8.160,41			100,00%	R\$ 8.160,41
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	12,81	R\$ 9.034,06			100,00%	R\$ 9.034,06
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,37	R\$ 8.350,41			100,00%	R\$ 8.350,41
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	328,94	R\$ 30.784,31			100,00%	R\$ 30.784,31
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	740,12	R\$ 4.438,44			100,00%	R\$ 4.438,44
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 17.589,71			100,00%	R\$ 17.589,71
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 1.417,20			100,00%	R\$ 1.417,20
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 10.622,18	45,00%	R\$ 4.779,98	100,00%	R\$ 4.779,98
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM. H = 2 M	M2	398,75	R\$ 14.411,46	45,00%	R\$ 6.485,16	100,00%	R\$ 6.485,16
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	227,00	R\$ 4.494,81	45,00%	R\$ 2.022,66	100,00%	R\$ 2.022,66
TOTAL FINAL					R\$ 129.257,31	10,28%	R\$ 13.287,80	100,00%	R\$ 129.257,31
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):									
Valor desta medição:		R\$ 13.287,80							
Empresa		Prefeitura Municipal						Prefeito (a) Paulo Horn	
J G Derivados de Cimento LTDA		Eng. Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D							

J G DERIVADOS
DE CIMENTO
LTDA:193761150
00103

Assinado de forma digital
por J G DERIVADOS DE
CIMENTO
LTDA:19376115000103
Dados: 2024.05.29
11:03:14 -03'00'




Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
CONTRATO Nº	165/2023
OBJETO	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL
MEDIÇÃO Nº	04 - FINAL
DATA DA VISTORIA	16/05/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

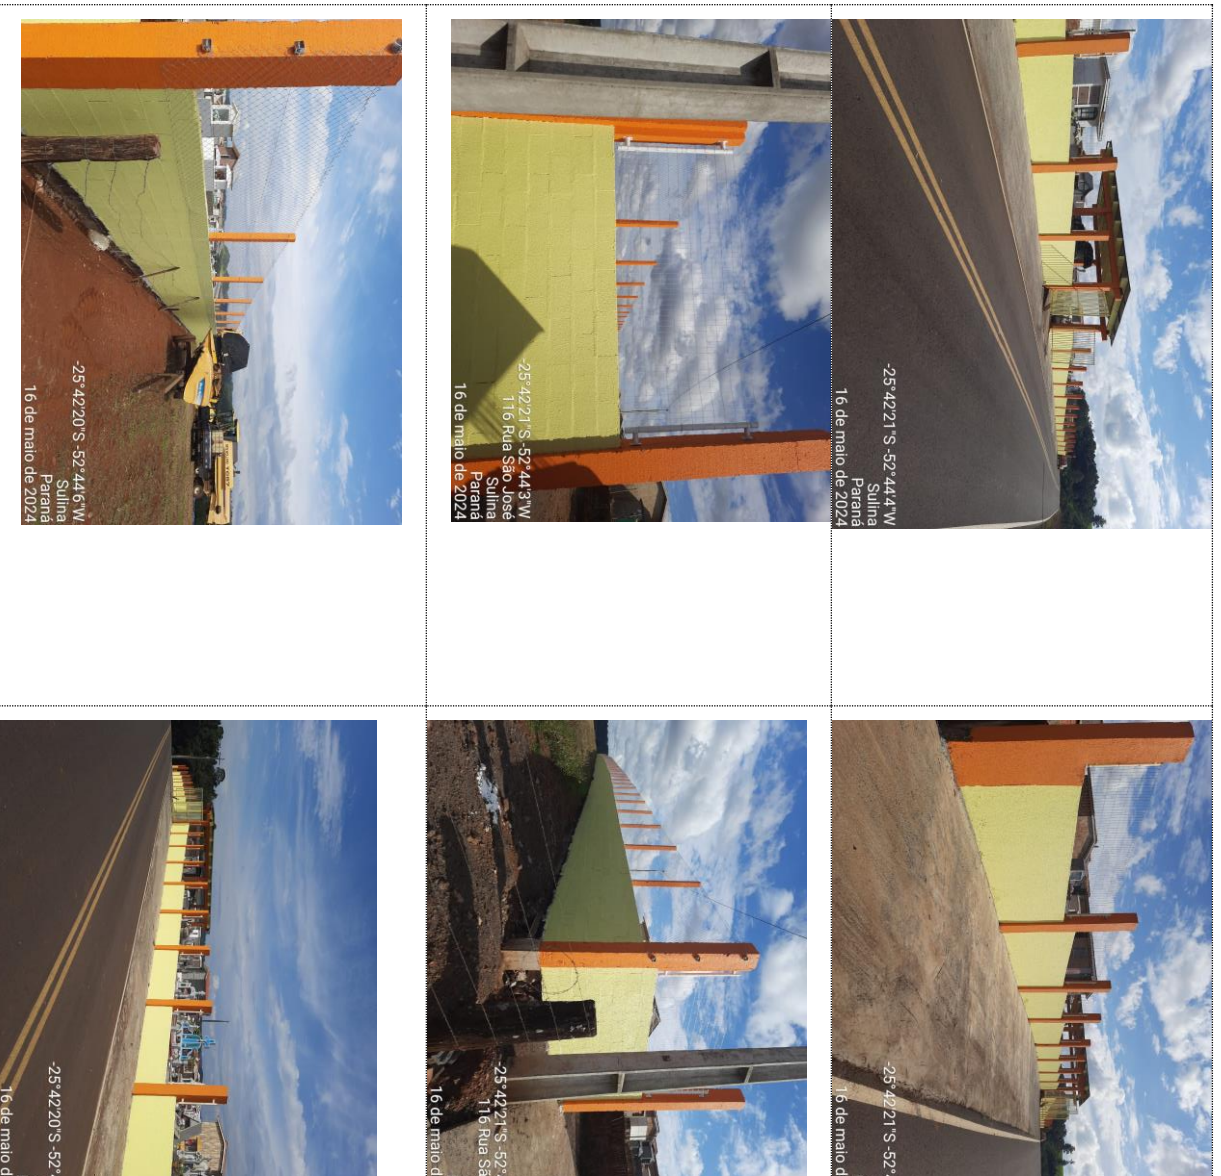



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 16 de maio de 2024.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 11DF-88B2-83E0-D46B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 29/05/2024 12:54:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 03/06/2024 11:07:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/11DF-88B2-83E0-D46B>



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento definitivo nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório **Tomada de Preço nº 06/2023, Contrato nº 165/2023**, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO E ALAMBRANDO COM 274,12 METROS LINEARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

Empresa Executora: **J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ALAMEDA DOZE, 993, INDUSTRIAL, no Município de MARIÓPOLIS, com CNPJ nº 19.376.115/0001- 03**

ART Execução: **1720241921540.**

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

Sulina, 10 de junho de 2024.

PAULO HORN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO S. SANTIAGO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DA OBRA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18B0-1B6B-DE78-FAC7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 11/06/2024 06:51:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 11/06/2024 07:48:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/18B0-1B6B-DE78-FAC7>
