

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	Reperfilamento sobre pavimento poliédrico em estradas vicinais <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 3818/2024	365	01/03/2024	R\$ 4.793.949,75	100,00%

Nº3/2024  
Data Inicial: 01/03/2024

## Reperfilamento sobre pavimento poliédrico em estradas vicinais

R\$ 4.793.949,75

# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9153

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1995	2024	01/03/2024	12334
1990	2024	01/03/2024	12334
1925	2024	01/03/2024	12334
1924	2024	01/03/2024	12334
4097	2024	01/05/2024	12334
5496	2024	03/06/2024	12334
5497	2024	03/06/2024	12334
8537	2024	01/09/2024	12334
8538	2024	01/09/2024	12334
8539	2024	02/09/2024	12334
8540	2024	02/09/2024	12334
5449	2025	02/06/2025	12334

# Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/03/2024

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**69**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**14**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**14**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**14**	Fiscalização	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7806	R\$ 4.795.338,71	01/03/2024	
Contrato	3818	2024	76.995.430/0001-52	7807	R\$ 4.793.949,75	01/03/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7808	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	31,86%
7934	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	31,86%
7948	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	45,24%
8153	Medição	4	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	88,53%
8228	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	88,53%
8362	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	88,53%
8505	Medição	7	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	98,87%
8667	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/10/2024			
9406	Medição	9	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	98,87%
9569	Medição	10	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3818/2024	100,00%
9576	Conclusão	11	Jurisdicionado	03/06/2025			

Nº3/2024  
Data Inicial: 01/03/2024

# Reperfilamento sobre pavimento poliédrico em estradas vicinais

## Documentos

R\$ 4.793.949,75
















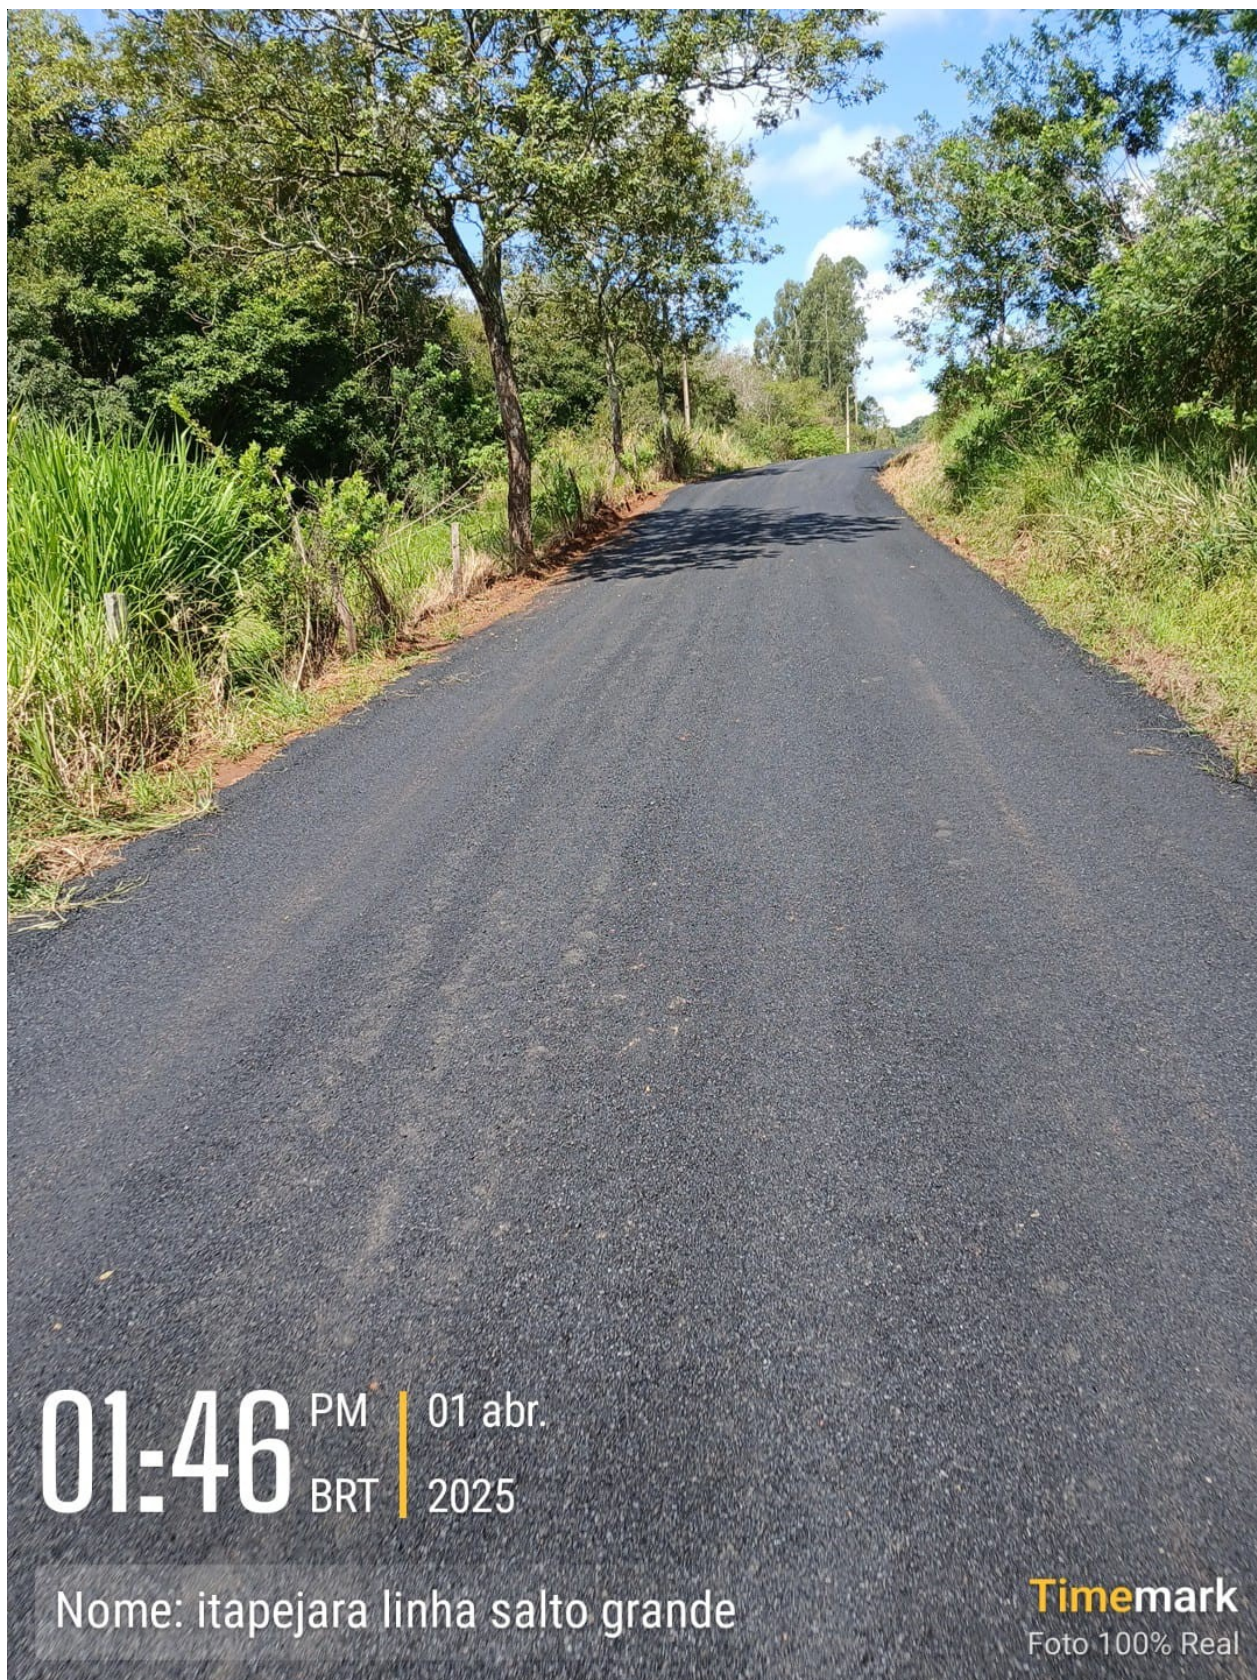

01:46 PM | 01 abr.  
BRT | 2025

Nome: itapejara linha salto grande

**Timemark**  
Foto 100% Real
