

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2024	RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 24/2024	120	05/06/2024	R\$ 2.298.500,00	100,00%

Nº7/2024  
Data Inicial: 05/06/2024

**RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS,  
MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**

**R\$ 2.298.500,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000514; 10000515; 10000584; 10000607; 10001130; 10001849; 10003070; 10003071

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4080	2024	10/06/2024	12543
4081	2024	10/06/2024	12543
4082	2024	10/06/2024	12543
349	2025	28/01/2025	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2024

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/05/2025	24	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*2**71**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**28**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**03**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5664	R\$ 2.467.079,95	07/03/2024	
Contrato	24	2024	80.869.886/0001-43	5665	R\$ 2.298.500,00	30/04/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5666	Medição	1	Jurisdicionado	29/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	75,88%
5688	Medição	2	Jurisdicionado	05/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	75,88%
5699	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	75,88%
5713	Medição	4	Jurisdicionado	29/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5724	Medição	5	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5747	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5758	Medição	7	Jurisdicionado	30/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5770	Medição	8	Jurisdicionado	27/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5790	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	100,00%
5797	Conclusão	10	Jurisdicionado	05/05/2025			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900193975871					
0	900193975871	1	18/02/2025	17/08/2025	

Nº7/2024  
Data Inicial: 05/06/2024

# RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS

Documentos

R\$ 2.298.500,00



## PROPOSTA DE PREÇOS

**AO MUNICÍPIO DE SULINA**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS**

**CONCORRÊNCIA Nº 03/2024.**

**OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS.**

A Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ/MF 77.744.134/0001-41, com sede na cidade de Chopinzinho, estado do Paraná sito à Rua 13 de Maio, s/n.º, CEP 85.560-000, Telefone (46) 3242-1002, E-mail [compraspedreirasantiago@gmail.com](mailto:compraspedreirasantiago@gmail.com), propõe ao MUNICÍPIO DE SULINA-PR, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 2.298.500,00 (Dois milhões duzentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), sendo 60% (sessenta por cento) referente aos materiais e 40% (quarenta por cento) referente à mão de obra.

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MOISES DE GASPERIN, portador do CPF 518.634.809-00, e será responsável técnico pelos serviços a Sra. CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO, Título Eng. Civil, CREA/n.º PR 203.527/D.

Chopinzinho, 30 de Abril de 2024.

MOISES DE  
GASPERIN:5186348  
0900

Assinado de forma digital por  
MOISES DE  
GASPERIN:51863480900  
Dados: 2024.04.30 10:21:55  
-03'00'

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**  
Moisés de Gasperin – Rep. Legal  
RG: 3.519.935-7

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682  
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41  
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92  
Chopinzinho - Paraná



## PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS

Município: SULINA - PR				BDI 1	24,03 %	
Projeto : RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS				BDI 2	16,70%	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
				unitário COM BDI	parcial	subtotal
<b>1</b>	<b>RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO</b>					<b>2.298.500,00</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>27.424,08</b>
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	320,00	1.440,00	
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,00	290,00	2.320,00	
1.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,00	12,00	96,00	
1.1.4	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID	40,00	360,00	14.400,00	
1.1.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	19,20	148,00	2.841,60	
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	576,00	3,20	1.843,20	
1.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	380,74	1,40	533,04	
1.1.8	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	48,00	0,50	24,00	
1.1.9	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,01	4.360,00	43,60	
1.1.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,40	1.494,00	3.585,60	
1.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	72,00	3,20	230,40	
1.1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,60	1,40	66,64	
<b>1.2</b>	<b>CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE</b>					<b>37.272,35</b>
1.2.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	410,00	8,50	3.485,00	
1.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	410,00	0,50	205,00	
1.2.3	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,21	4.360,00	915,60	
1.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,50	1.494,00	30.627,00	
1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	615,00	3,20	1.968,00	
1.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	51,25	1,40	71,75	
<b>1.3</b>	<b>ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS</b>					<b>8.260,75</b>
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,40	290,00	406,00	
1.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,18	12,00	206,16	
1.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,78	124,00	1.956,72	
1.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,58	148,00	973,84	
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	197,25	3,20	631,20	
1.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	130,39	1,40	182,55	
1.3.7	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	26,30	0,50	13,15	
1.3.8	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,02	4.360,00	87,20	
1.3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,32	1.494,00	1.972,08	
1.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39,45	3,20	126,24	
1.3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	415,09	1,40	581,13	
1.3.12	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	13,00	76,00	988,00	
1.3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,32	3,20	125,82	
1.3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11,84	0,90	10,66	



1.4 MEIO FIO E DRENAGEM						27.511,26
1.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	274,00	70,00	19.180,00	
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10,00	76,00	760,00	
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	858,82	3,20	2.748,22	
1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100,20	0,90	90,18	
1.4.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,91	124,00	1.848,84	
1.4.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,26	27,00	115,02	
1.4.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,26	650,00	2.769,00	
1.5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO						1.926.374,95
1.5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	19.721,39	1,50	29.582,09	
1.5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	35.595,24	0,50	17.797,62	
1.5.3	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	17,78	4.360,00	77.520,80	
1.5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.113,56	1.494,00	1.663.658,64	
1.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.406,65	3,20	106.901,28	
1.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.081,80	1,40	30.914,52	
1.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA						55.756,58
1.6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.352,48	29,00	39.221,92	
1.6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.710,60	6,10	16.534,66	
1.7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS						26.329,07
1.7.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	61,00	135,00	8.235,00	
1.7.2	ENSAIO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	34,00	89,00	3.026,00	
1.7.3	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	34,00	72,00	2.448,00	
1.7.4	ENSAIO DE TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	34,00	127,00	4.318,00	
1.7.5	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	34,00	104,00	3.536,00	
1.7.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAMADA ASFÁLTICA	UNID	1,00	4.766,07	4.766,07	
2 ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS						
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						1.440,00
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	320,00	1.440,00	
2.2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						33.810,00
2.2.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 1, EM CALÇADA EXISTENTE. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	14,00	820,00	11.480,00	
2.2.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 2, EM CALÇADA EXISTENTE. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	23,00	310,00	7.130,00	
2.2.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 1, EM CALÇADA A SER EXECUTADA. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	24,00	590,00	14.160,00	
2.2.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 2, EM CALÇADA A SER EXECUTADA. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	4,00	260,00	1.040,00	



2.3	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS CENTRAIS					6.904,57
2.3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,82	290,00	237,80	
2.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,78	12,00	165,36	
2.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,96	124,00	1.607,04	
2.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,90	890,00	1.691,00	
2.3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	27,00	3,50	94,50	
2.3.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	1,36	148,00	201,28	
2.3.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	36,00	70,00	2.520,00	
2.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	113,40	3,20	362,88	
2.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27,46	0,90	24,71	
2.4	CALÇADAS EM CONCRETO					147.416,39
2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	125,64	890,00	111.819,60	
2.4.2	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	419,80	22,30	9.361,54	
2.4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.794,98	3,50	6.282,43	
2.4.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	89,74	148,00	13.281,52	
2.4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	179,50	16,00	2.872,00	
2.4.6	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	179,50	15,40	2.764,30	
2.4.7	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	9,00	115,00	1.035,00	
<b>PREÇO GLOBAL</b>					<b>2.298.500,00</b>	

Chopinzinho, 30 de Abril de 2024.

**MOISES DE GASPERIN:51863480900**  
63480900

Assinado de forma digital por MOISES DE GASPERIN:51863480900  
Dados: 2024.04.30 10:20:47 -03'00'

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**  
Moisés de Gasperin - Rep. Legal  
RG: 3.519.935-7

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CAROLINA TAVARES DE ARAUJO  
Data: 30/04/2024 10:14:59-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**  
Carolina Tavares de Araújo - Resp. Técnica  
CREA PR 203.527/D

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REF: CONCORRÊNCIA 03/2024 - PMS

Item	Descrição Serviços	Valor Serviço R\$	Prazo de execução (dias)					Peso (%)	TOTAL OBRA
			30	60	90	120	150		
1	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBA	2.108.929,04							R\$ 2.298.500,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.424,08	R\$ 27.424,08 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	
1.2	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE	37.272,35	R\$ 37.272,35 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	
1.3	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS	8.260,75	R\$ 8.260,75 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	
1.4	MEIO FIO E DRENAGEM	27.511,26	R\$ 0,00 %	27.511,26 100,00%	0,00	0,00	0,00	1,20%	
1.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1.926.374,95	R\$ 0,00 %	850.301,90 44,14%	1.076.073,05 55,86%	0,00	0,00	83,81%	
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	55.756,58	R\$ 0,00 %	0,00	0,00	55.756,58 100,00%	0,00	2,43%	
1.7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	26.329,07	R\$ 0,00 %	0,00	0,00	26.329,07 100,00%	0,00	1,15%	
2	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OUTRA	189.570,96							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.440,00	R\$ 1.440,00 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
2.2	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	33.810,00	R\$ 15.775,75 46,66%	2.606,75 7,71%	6.079,04 17,98%	1.227,30 3,63%	8.121,16 24,02%	1,47%	
2.3	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS CEN	6.904,57	R\$ 5.751,51 83,30%	0,00	1.153,06 16,70%	0,00	0,00	0,30%	
2.4	CALÇADAS EM CONCRETO	147.416,39	R\$ 14.417,32 9,78%	19.105,16 12,96%	26.446,50 17,94%	35.158,81 23,85%	52.288,59 35,47%	6,41%	
<b>DESEMBOLSO MENSAL</b>			R\$ 110.341,76 4,80%	899.525,08 39,14%	1.109.751,65 48,28%	118.471,76 5,15%	60.409,76 2,63%		
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO</b>			R\$ 110.341,76 4,80%	1.009.866,83 43,94%	2.119.618,48 92,22%	2.238.090,24 97,37%	2.298.500,00 100,00%		

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.  
Prestação de Serviços, Briagem, Transportes, Locação de Máquinas,  
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



MOISES DE  
GASPERIN:5186348  
0900

Assinado de forma digital por  
MOISES DE  
GASPERIN:51863480900  
Dados: 2024.04.30 10:21:25

Chopinzinho, 30 de Abril de 2024.



Documento assinado digitalmente  
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO  
Data: 30/04/2024 10:14:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



## COMPOSIÇÃO DO BDI

RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS / RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,03%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

MOISES DE  
GASPERIN:5186  
3480900

Assinado de forma digital  
por MOISES DE  
GASPERIN:51863480900  
Dados: 2024.04.26 10:19:30  
-03'00'

Chopinzinho, 30 de Abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
gov.br CAROLINA TAVARES DE ARAUJO  
Data: 26/04/2024 10:12:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

Moisés de Gasperin - Rep. Legal  
RG: 3.519.935-7

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

Carolina Tavares de Araújo - Resp. Técnica  
CREA PR203.527/D

e-mail: [compraspedreirasantiago@gmail.com](mailto:compraspedreirasantiago@gmail.com)

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682  
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41  
- CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92  
Chopinzinho - Paraná







Grau de Sigilo  
# PÚBLICO

Ofício n°: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE SULINA, 29 de julho de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS  
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.912.356,00	R\$ 1.451.055,62	R\$ 1.451.055,62
Contrapartida Financeira:	R\$ 386.144,00	R\$ 292.997,97	R\$ 292.997,97
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.298.500,00	R\$ 1.744.053,59	R\$ 1.744.053,59
Execução Física:	-	75,88%	75,88%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
PAULO HORN  
PREFEITO MUNICIPAL





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091571-60	Nº TransfereGOV 953295 / 2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 24/2024
---------------------------	----------------------------------	---	--	---	--------------------

Medição: **1** Período: **05/06/2024 a 24/02/2024** % Realizado Período.: **75,88%** % Realizado Acum.: **75,88%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE																									
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS																									
5	MEIO FIO E DRENAGEM																									
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1																			
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS																									
9	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE																									
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS																									
12	CALÇADAS EM CONCRETO																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1	1		1	1	1	1		1	1																	
---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Data das Medições											
		24/02/2024											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	75,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	1.744.053,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%
	R\$	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59

MUNICÍPIO DE SULINA  
Local  
sábado, 24 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 31.879/D  
ART/RRT: 1720243210365



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACA DA OBRA

**OBRA:** Recape asfáltico e adequação de acessibilidade

**CONTRATO COM A EMPRESA:** 24/2024

**CONTRATO DE REPASSE:** 953295/2023



Assinado por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, PAULO HORN, SELVINO LIRA e MOISES DE GASPERIN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652> e informe o código E5E9-77C9-66A7-E652





Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 24 de junho de 2024.

LUCIANO  
 STEINEMANN  
 SANTIAGO:8159618  
 9991

Assinado de forma digital  
 por LUCIANO STEINEMANN  
 SANTIAGO:81596189991  
 Dados: 2024.06.24 11:05:41  
 -03'00'

**Luciano S. Santiago**  
 Engenheiro Civil – Fiscal da Obra  
 ART DE FISCALIZAÇÃO: 1720243210365

Assinado por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, PAULO HORN, SELVINO LIRA e MOISES DE GASPERIN  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E662> e informe o código E5E9-77C9-66A7-E662





## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SULINA	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091571-60	<b>Nº TransfereGOV</b> 953295 / 2023	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$):</b>			<b>RECURSO</b> OGU
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MUNICÍPIO DE SULINA	<b>REPASSE</b> 1.912.356,00	<b>CONTRAPARTIDA</b> 554.742,02	<b>INVESTIMENTO</b> 2.467.098,02	<b>Nº RRE</b> 1	

<b>Situação do TC/CR:</b> Atrasada	<b>Percentual previsto em:</b> jul-24 100,00%	<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repasse (R\$)</b> -	<b>Contrapartida (R\$)</b> 168.598,02
---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	--

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Em Análise	19721,39	m²	24/2024	1	2.108.929,01	-	1.744.053,59	1.744.053,59	82,70%	
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OU1	Em Análise	1794,98	m²	24/2024	1	189.570,99	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00%)	( 0,00%)	( 75,88%)	( 75,88%)	
							Repasse	1.912.356,00	-	1.451.055,62	1.451.055,62	
							Contrapartida	386.144,00	-	292.997,97	292.997,97	75,88%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>2.298.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.744.053,59</b>	<b>1.744.053,59</b>	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

Representante Tomador

Nome: PAULO HORN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 29 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31.879/D

ART/RRT: 1720243210365

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: E5E9-77C9-66A7-E652

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 29/07/2024 10:30:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 29/07/2024 13:02:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SELVINO LIRA (CPF 858.XXX.XXX-63) em 30/07/2024 07:46:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MOISES DE GASPERIN (CPF 518.XXX.XXX-00) em 23/08/2024 11:06:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652>



















Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**

EMPRESA CONTRATADA:

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

VALOR REAL:

**R\$ 2.298.500,00**

CONTRATO Nº:

**24/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra em andamento sem medição no período**

Aos 05 (Cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

  
**PAULO HORN**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 05 de agosto de 2024.



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

### TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**

EMPRESA CONTRATADA:

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

VALOR REAL:

**RS 2.298.500,00**

CONTRATO Nº:

**24/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra em andamento sem medição no período**

Aos 04 (Quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

  
**PAULO HORN**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 04 de setembro de 2024.



Grau de Sigilo <b># PÚBLICO</b>
------------------------------------

Ofício n°: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE SULINA, 29 de outubro de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS  
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.912.356,00	R\$ 56.262,36	R\$ 1.507.317,98
Contrapartida Financeira:	R\$ 386.144,00	R\$ 11.360,52	R\$ 304.358,49
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.298.500,00	R\$ 67.622,88	R\$ 1.811.676,47
Execução Física:	-	2,94%	78,82%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO  
HORN:55407552949

Assinado de forma digital por  
PAULO HORN:55407552949  
Dados: 2024.10.29 15:48:37  
-03'00'

PAULO HORN  
PREFEITO MUNICIPAL



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1091571-60	Nº TransfereGOV 953295 / 2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SULINA	REPASSE 1.912.356,00	CONTRAPARTIDA 554.742,02	INVESTIMENTO 2.467.098,02	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 168.598,02
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	-----------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Em Análise	19721,39	m²	24/2024	2	2.108.929,01	1.744.053,59	67.622,88	1.811.676,47	85,91%	
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OU	Em Análise	1794,98	m²	24/2024	2	189.570,99	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 75,88% )	( 2,94% )	( 78,82% )	
							Repasse	1.912.356,00	1.451.055,62	56.262,36	1.507.317,98	
							Contrapartida	386.144,00	292.997,97	11.360,52	304.358,49	78,82%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>2.298.500,00</b>	<b>1.744.053,59</b>	<b>67.622,88</b>	<b>1.811.676,47</b>	

Acumulado Anterior: 75,88%

Observações:

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

PAULO HORN:55407552949

Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949  
Dados: 2024.10.29 15:48:08 -03'00'

Representante Tomador

Nome: PAULO HORN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 29 de outubro de 2024

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991  
Dados: 2024.10.29 15:08:29 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31.879/D

ART/RRT: 1720243210365

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091571-60	<b>Nº TransfereGOV</b> 953295 / 2023	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SULINA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	<b>NOME DA EMPRESA</b> PEDREIRA SANTIAGO LTDA	<b>Nº CTEF</b> 24/2024
----------------------------------	---	--	---	--	---------------------------

 Medição: **2** Período: **25/02/2024 a 29/10/2024** % Realizado Período.: **2,94%** % Realizado Acum.: **78,82%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1			1	1	1	1		1	1														
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE								1	1																
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS																									
5	MEIO FIO E DRENAGEM																									
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1			1	1	1														
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2	2	2	2	2	2			2	2	2														
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2	2	2	2	2	2			2	2	2														
9	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE																									
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS																									
12	CALÇADAS EM CONCRETO																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

**Data das Medições**

Medições	24/02/2024		29/10/2024																							
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Medição 13	Medição 14	Medição 15	Medição 16	Medição 17	Medição 18	Medição 19	Medição 20	Medição 21	Medição 22	Medição 23	Medição 24	Medição 25	
<b>Período:</b>	%	75,88%	<b>2,94%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	R\$	1.744.053,59	<b>67.622,88</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Acumulado:</b>	%	75,88%	<b>78,82%</b>	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	
	R\$	1.744.053,59	<b>1.811.676,47</b>	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	

 MUNICÍPIO DE SULINA  
 Local

sábado, 24 de fevereiro de 2024

Data

 LUCIANO STEINEMANN  
 SANTIAGO:81596189991

 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN  
 SANTIAGO:81596189991  
 Dados: 2024.10.29 15:08:50 -03'00'

 Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** LUCIANO S. SANTIAGO  
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAU:** 31.879/D  
**ART/RRR:** 1720243210365

































Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**

EMPRESA CONTRATADA:

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

VALOR REAL:

**R\$ 2.298.500,00**

CONTRATO Nº:

**24/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra em andamento sem medição no período**

Aos 04 (Quatro) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

  
**PAULO HORN**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 04 de novembro de 2024.



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**

EMPRESA CONTRATADA:

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

VALOR REAL:

**RS 2.298.500,00**

CONTRATO Nº:

**24/2024**


SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra finalizada aguardando documentação**

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está finalizada aguardando documentação.

  
**GILBERTO JOÃO ROSSI**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 30 de janeiro de 2025.



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**

EMPRESA CONTRATADA:

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

VALOR REAL:

**RS 2.298.500,00**

CONTRATO Nº:

**24/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra finalizada aguardando documentação**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está finalizada aguardando documentação.

  
**GILBERTO JOÃO ROSSI**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 27 de fevereiro de 2025. *y*

Grau de Sigilo # PÚBLICO
-----------------------------

Ofício n°: 01/2025 - Dep. Eng.

MUNICÍPIO DE SULINA, 04 de fevereiro de 2025

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS  
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.743.757,98	R\$ 417.604,53	R\$ 1.740.731,51
Contrapartida Financeira:	R\$ 554.742,02	R\$ 132.852,60	R\$ 553.779,21
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.298.500,00	R\$ 550.457,13	R\$ 2.294.510,72
Execução Física:	-	23,95%	99,83%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GILBERTO JOAO  
ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por  
GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901  
Dados: 2025.02.06 08:35:42 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091571-60	Nº TransfereGOV 953295 / 2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 24/2024
---------------------------	----------------------------------	---	--	---	--------------------

Medição: **2** Período: **25/06/2024 a 19/12/2024** % Realizado Período.: **23,95%** % Realizado Acum.: **99,83%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1		1	1	1	1		1	1															
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE							1	1																	
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS	2					2																			
5	MEIO FIO E DRENAGEM											1														
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1															
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
9	SERVIÇOS PRELIMINARES						2																			
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2		2															
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS	2	2					2																		
12	CALÇADAS EM CONCRETO			2	2	2	2	2	2		2															

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Medições	Data das Medições											
	24/06/2024	19/12/2024										
Período:	%	75,88%	23,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	R\$	1.744.053,59	550.457,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	75,88%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%
	R\$	1.744.053,59	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72

MUNICÍPIO DE SULINA  
Local  
terça-feira, 4 de fevereiro de 2025  
Data

LUCIANO STEINEMANN  
SANTIAGO:81596189991  
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991  
Dados: 2025.02.05 07:26:56 -03'00'  
Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 31.879/D  
ART/RRT: 1720243210365



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1091571-60	Nº TransfereGOV 953295 / 2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SULINA	REPASSE 1.912.356,00	CONTRAPARTIDA 554.742,02	INVESTIMENTO 2.467.098,02	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-25 99,83%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 168.598,02	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	--------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Licitado / Em Execução	19721,39	m²	24/2024	2	2.108.929,01	1.744.053,59	364.875,42	2.108.929,01	100,00%
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OU	Licitado / Em Execução	1794,98	m²	24/2024	2	189.570,99	-	185.581,71	185.581,71	97,90%
					(%)		( 100,00% )	( 75,88% )	( 23,95% )	( 99,83% )	
					Repasse		1.743.757,98	1.323.126,98	417.604,53	1.740.731,51	
					Contrapartida		554.742,02	420.926,61	132.852,60	553.779,21	99,83%
					Outros		-	-	-	-	
					<b>Investimento</b>		<b>2.298.500,00</b>	<b>1.744.053,59</b>	<b>550.457,13</b>	<b>2.294.510,72</b>	

RRE nº 02 corrigido - considerado glosa definitivas efetuadas.

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901  
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901  
 Dados: 2025.02.06 08:34:35 -03'00'

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Data

LUCIANO STEINEMANN  
 SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991  
 Dados: 2025.02.05 07:26:02 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 31.879/D


ART/RRT: 1720243210365

Responsável Financeiro

Nome: xxx

Cargo: .



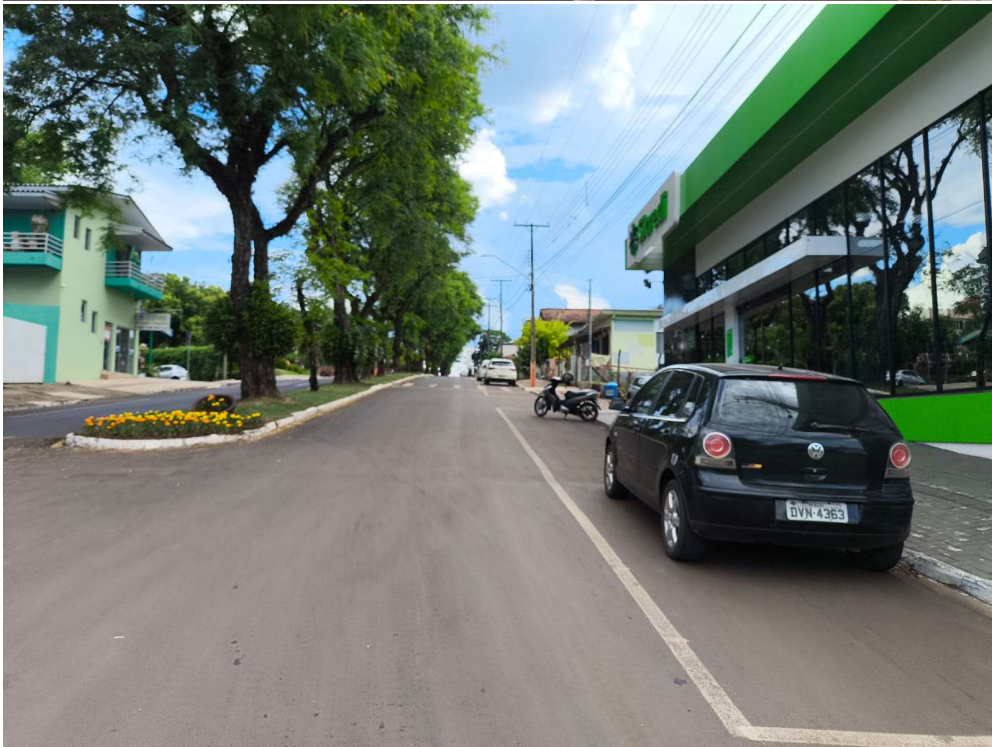





















Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br



### TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento definitivo nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório Concorrência Eletrônica nº 03/2024, Contrato nº 24/2022, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Obra: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, conforme contrato de repasse 953295/2023.**

Empresa Executora: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ Nº 77.744.134/0001-41.**

ART Execução: **1720242527152**

Valor inicial do contrato: **R\$ 2.298.500,00 (dois milhões duzentos e noventa e oito mil e quinhentos reais).**

Valor da glosa: **R\$ 3.989,28 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).**

Valor final do contrato: **R\$ 2.294.510,72 (dois milhões duzentos e noventa e quatro mil quinhentos e dez reais e setenta e dois centavos).**

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

Sulina, 06 de fevereiro de 2025.

GILBERTO JOAO  
 ROSSI:03160453901  
 Assinado de forma digital por  
 GILBERTO JOAO  
 ROSSI:03160453901  
 Dados: 2025.02.06 08:54:47 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO  
 STEINEMANN  
 SANTIAGO:81596189991  
 9991  
 Assinado de forma digital  
 por LUCIANO STEINEMANN  
 SANTIAGO:81596189991  
 Dados: 2025.02.06 08:55:58  
 -03'00'

LUCIANO S. SANTIAGO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DA OBRA

