

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 33/2025	330	12/04/2025	R\$ 800.000,00	51,55%

## Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas

R\$ 800.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000509; 10000510; 10000511; 10000513; 10001128; 10001130; 10001131; 10001725; 2170

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4449	2025	12/06/2025	12543
6359	2025	25/08/2025	12543
6358	2025	25/08/2025	12543
2431	2025	02/04/2025	12543
7394	2025	02/10/2025	12543
7397	2025	02/10/2025	12543
2429	2025	02/04/2025	12543
4447	2025	12/06/2025	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2025

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/03/2026	33	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**19**	Execução de Obra	Sim
CPF	10.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**63**	Orçamento	Sim
CPF	81.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**53**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipos	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5815	R\$ 1.000.218,54	17/11/2024	

Contrato 33 2025 80.869.886/0001-43 5816 R\$ 800.000,00 29/01/2025 51,55%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5817	Medição	1	Jurisdicionado	11/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	15,67%
5824	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	30,43%
5825	Medição	3	Jurisdicionado	18/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	34,18%
5832	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5848	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5855	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900245056671					

## Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas

### Documentos

R\$ 800.000,00



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE SULINA	ACESSIBILIDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	ATA 33/2025

Medição: **1** Período: **02/04/2025 a 11/07/2025** % Realizado Período.: **15,67%** % Realizado Acum.: **15,67%**

RUA 01 E 02- SEDE OURO	RUA 03 E 04- SEDE OURO	RUA BARRA DO RIO	RUA REICHART	RUA GETULIO E DAS	RUA AMÉRICAS	RUA GERALDO MERELLES AV. IGUAUÉ	RUA CASTELO BRANCO	RUA SALDANHA MARINHO	RUA DUMONT	RUA COMEND. ARAÚJO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDAÇÃO em que os eventos foram concluídos

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLENAGEM
4	CALÇADAS EM PAVER
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									

Medições	Data das Medições												
	11/07/2025	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:		% R\$ <b>15,67%</b> <b>125.374,55</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:		% R\$ <b>15,67%</b> <b>125.374,55</b>	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%	15,67%

MUNICÍPIO DE SULINA  
Local

sexta-feira, 11 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 31879/D  
ART/RRT: 1720253815316



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



<b>MUNICÍPIO</b>	SULINA
<b>CONTRATADA</b>	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>CONTRATO Nº</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	01
<b>DATA DA VISTORIA</b>	10/07/2025

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Assinado por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MOISES DE GASPERIN e GILBERTO JOAO ROSSI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1/doc.com.br/verificacao/2A33-2E29-5C7B-37AA> e informe o código 2A33-2E29-5C7B-37AA

# Município de Sulina



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



PACO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43

Sulina, 10 de julho de 2025.

---

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720253815316  
CREA-PR 31879/D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A33-2E29-5C7B-37AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 11/07/2025 09:36:29 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MOISES DE GASPERIN (CPF 518.XXX.XXX-00) em 11/07/2025 10:55:10 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 11/07/2025 12:56:56 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2A33-2E29-5C7B-37AA>



25°42'11"S 52°43'23"W  
4 de julho de 2025 11:19































































## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF ATA 33/202
Medição: 2	Periodo: 12/07/2025 a 21/07/2025	% Realizado 14,76	Periodo.: 30.43%		

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLENAGEM
4	CALÇADAS EM PAVER
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0

2. [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#) | [Help](#) | [Feedback](#) | [Report Abuse](#)

## MUNICÍPIO DE SULINA

## Local

segunda-feira, 21 de julho de 2025

## Data

**GILBERTO JOAO ROSSI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Responsável: Técnico pela Fiscalização  
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 31879/D  
ART/RRT: 1720253815316

77.744.134/0001-41

Pedreira Santiago Ltda



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



<b>MUNICÍPIO</b>	SULINA
<b>CONTRATADA</b>	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>CONTRATO Nº</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	02
<b>DATA DA VISTORIA</b>	21/07/2025
<b>ENGENHEIRO FISCAL</b>	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
<b>ART FISCALIZAÇÃO</b>	ART: 1720253815316


#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









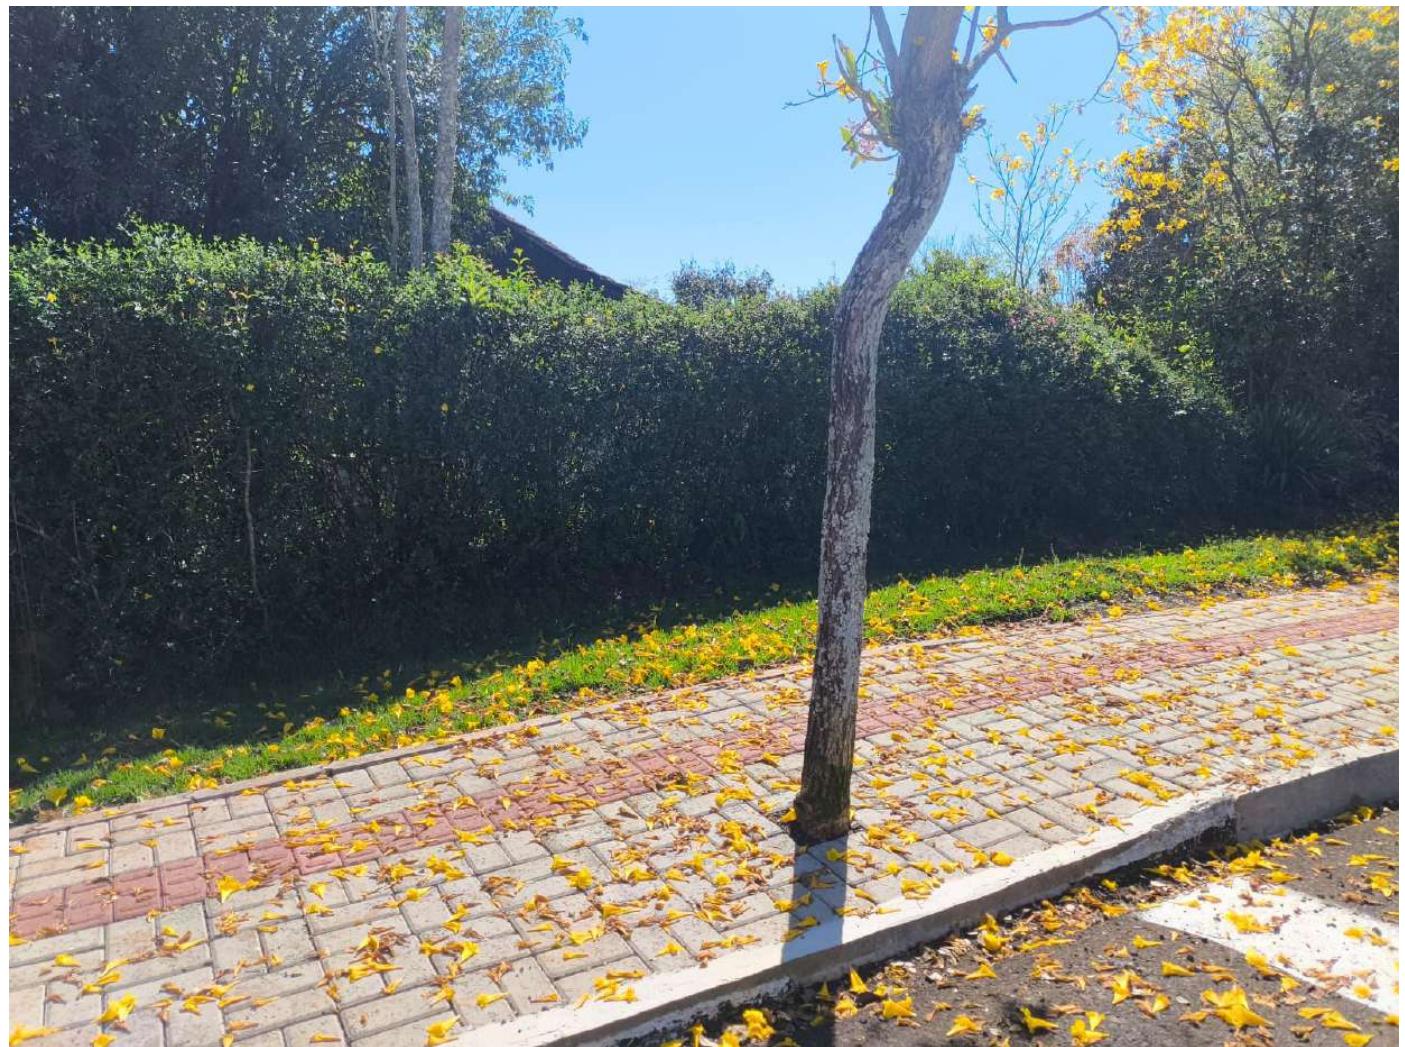
























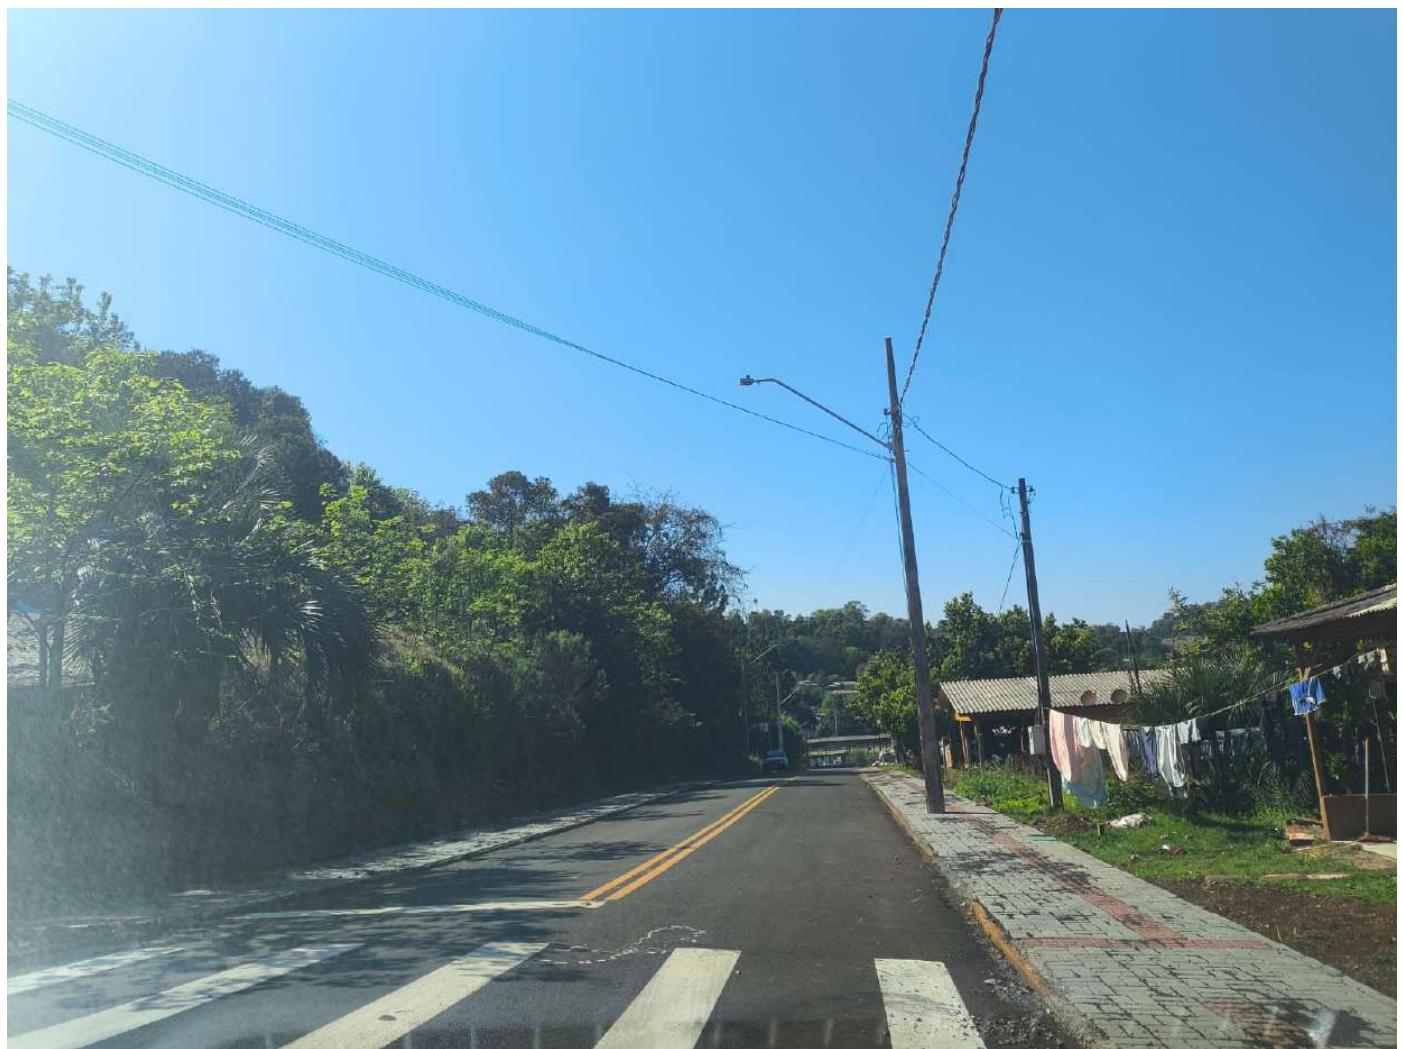


































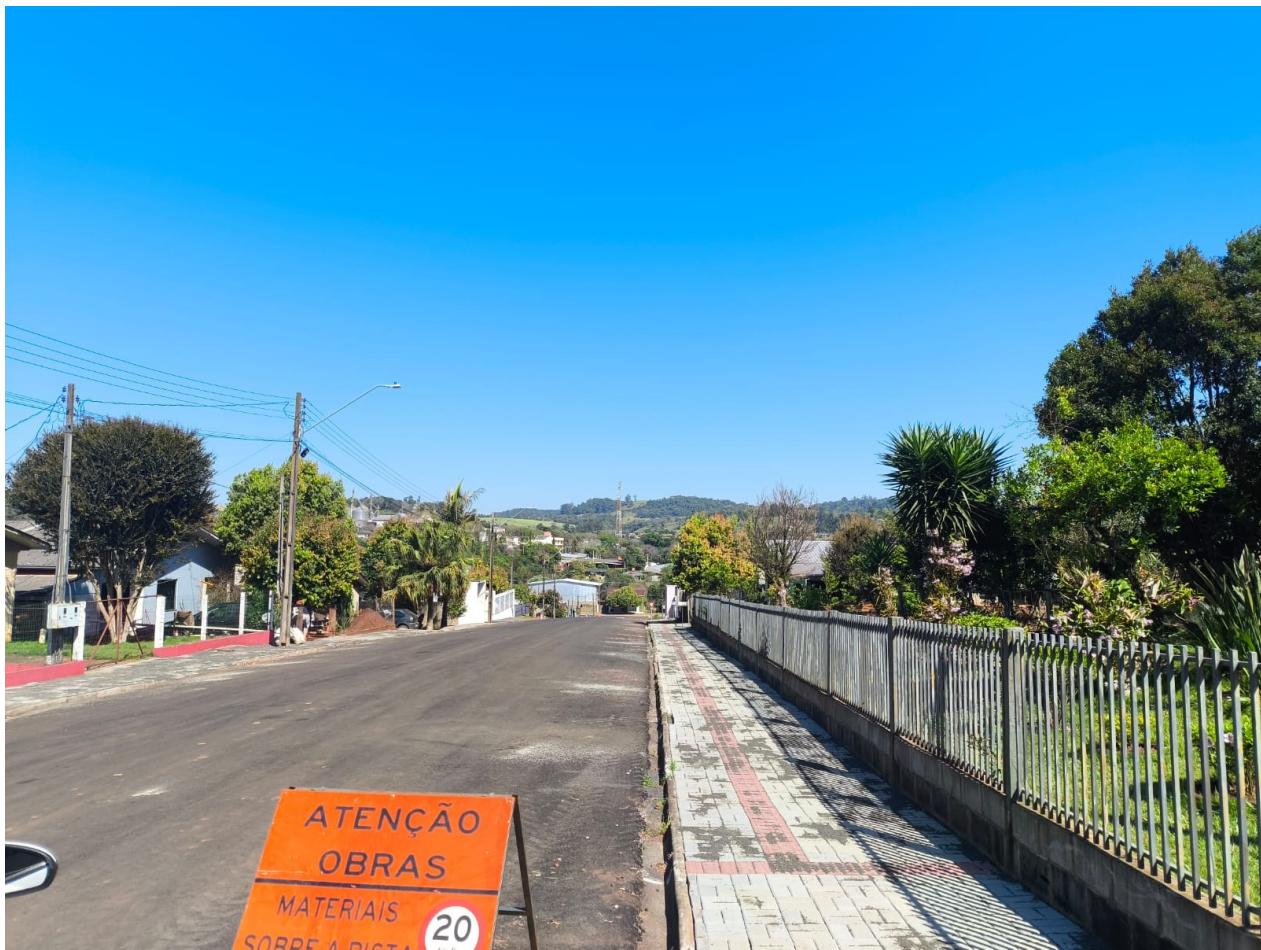









**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)**

Grau de Sigilo  
**PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF ATA 33/202
------------------	----------------------	---	--	---	-----------------------

Medição: 3 Período: 22/07/2025 a 18/08/2025 % Realizado Período.: 3,75% % Realizado Acum.: 34,18%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLENAGEM
4	CALÇADAS EM PAVER
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0

A administração legal será proporcionada e execução dos domícilos exequentes, indicando endereço de fronteira do bairro.

MUNICÍPIO DE SULINA  
Local

segunda-feira, 18 de agosto de 2025

25  
  
GILBERTO JOÃO ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** LUCIANO S. SANTIAGO  
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAU:** 31879/D  
**ART/RTT:** 1720253815316

7.744.134/0001-41  
Pedreira Santiago Ltda



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



<b>MUNICÍPIO</b>	SULINA
<b>CONTRATADA</b>	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>CONTRATO Nº</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	03
<b>DATA DA VISTORIA</b>	18/08/2025
<b>ENGENHEIRO FISCAL</b>	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
<b>ART FISCALIZAÇÃO</b>	ART: 1720253815316

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





















