

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas Esta intervenção está em andamento	Contrato 33/2025	330	12/04/2025	R\$ 800.000,00	51,55%

Nº3/2025
Data Inicial: 12/04/2025

Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas

R\$ 800.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000509; 10000510; 10000511; 10000513; 10001128; 10001130; 10001131; 10001725; 2170

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4449	2025	12/06/2025	12543
6359	2025	25/08/2025	12543
6358	2025	25/08/2025	12543
2431	2025	02/04/2025	12543
7394	2025	02/10/2025	12543
7397	2025	02/10/2025	12543
2429	2025	02/04/2025	12543
4447	2025	12/06/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/03/2026	33	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**19**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**63**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**53**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5815	R\$ 1.000.218,54	17/11/2024	

Contrato 33 2025 80.869.886/0001-43 5816 R\$ 800.000,00 29/01/2025 51,55%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5817	Medição	1	Jurisdicionado	11/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	15,67%
5824	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	30,43%
5825	Medição	3	Jurisdicionado	18/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	34,18%
5832	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5848	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5855	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%
5864	Medição	7	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2025	51,55%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900245056671					

Nº3/2025
Data Inicial: 12/04/2025

Calçada de bloco intertravado Paver em áreas públicas

Documentos

R\$ 800.000,00



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CONTRATO Nº	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
MEDIÇÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	10/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Assinado por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MOISES DE GASPERIN e GILBERTO JOAO ROSSI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2A33-2E29-5C7B-37AA> e informe o código 2A33-2E29-5C7B-37AA



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupirambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85555-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.888/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



Município de Sulina

Sulina, 10 de julho de 2025.

Luciano S. Santiago
Engenheiro Fiscal da Obra
ART: 1720253815316
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2A33-2E29-5C7B-37AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 11/07/2025 09:36:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DE GASPERIN (CPF 518.XXX.XXX-00) em 11/07/2025 10:55:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 11/07/2025 12:56:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2A33-2E29-5C7B-37AA>



25°42'11"S 52°43'23"W
4 de julho de 2025 11:19





























































Município de Sulina



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF ATA 33/2025
------------------	----------------------	---	--	---	------------------------

Medição: **2** Período: **12/07/2025 a 21/07/2025** % Realizado **14,76** Período.: **30,43%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	TERRAPLENAGEM																									
4	CALÇADAS EM PAVER																									
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Medições	Data das Medições											
	11/07/2025	21/07/2025										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	15,67%	14,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	125.374,55	118.120,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	15,67%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%	30,43%
R\$	125.374,55	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76	243.494,76

MUNICÍPIO DE SULINA
Local
segunda-feira, 21 de julho de 2025
Data

GILBERTO JOAO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720253815316

77.744.134/0001-41
Pedreira Santiago Ltda

Rua 13 de Maio, s/n B. São Miguel
85560-000 CHOPINZINHO PR



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CONTRATO Nº	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
MEDIÇÃO Nº	02
DATA DA VISTORIA	21/07/2025
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720253815316

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


































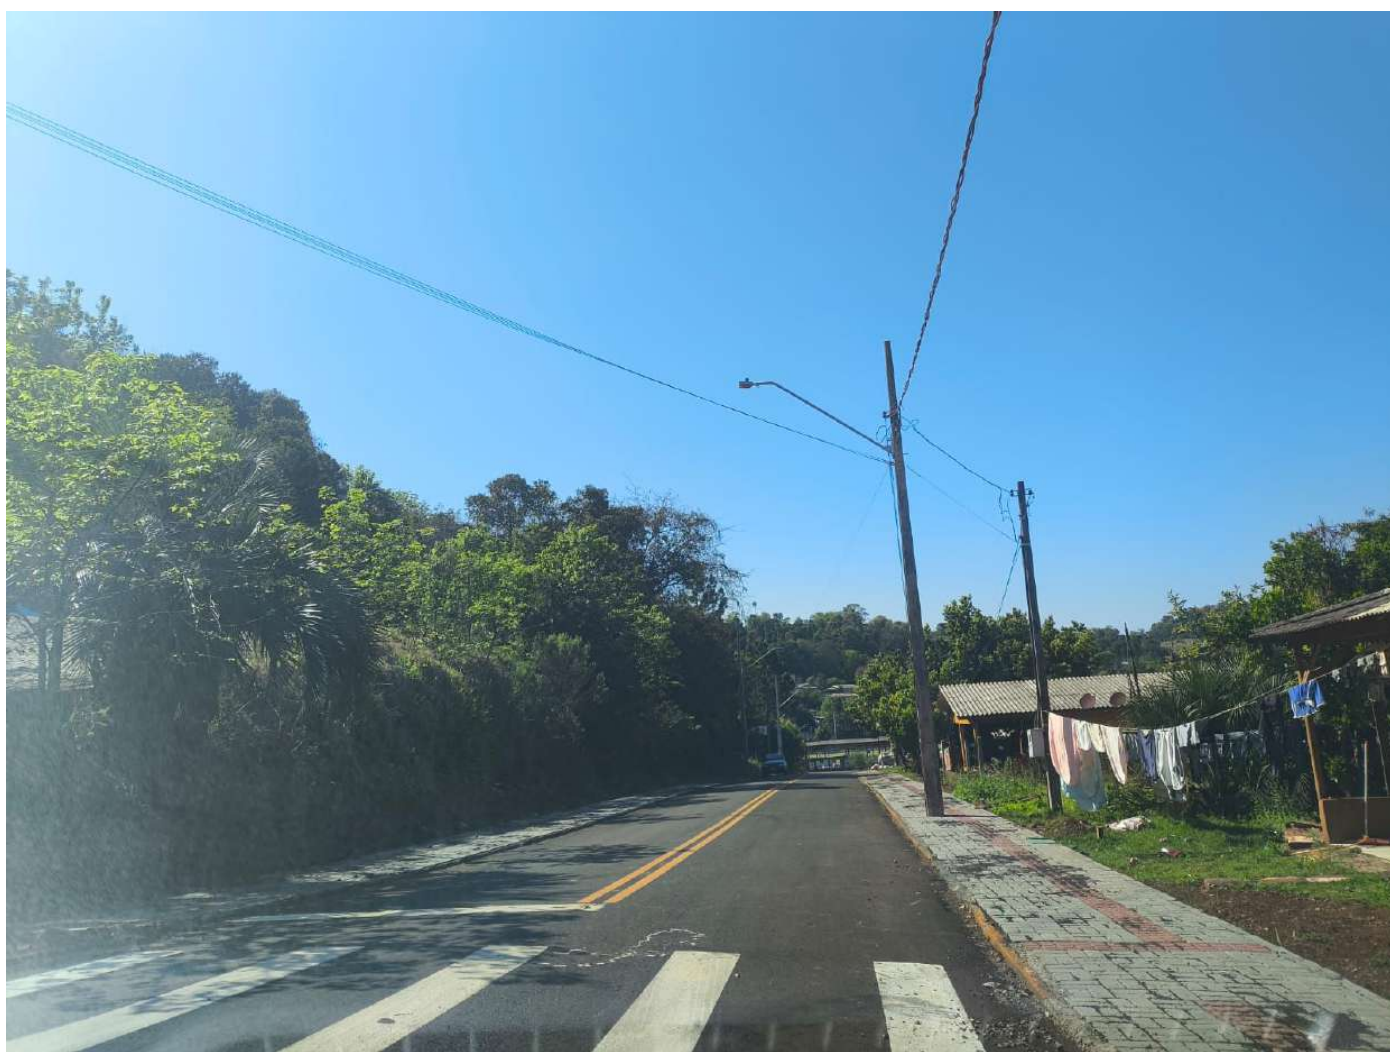









































Município de Sulina



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	ApELIDO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE	NOme DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF ATA 33/2025
------------------	----------------------	---	--	---	------------------------

Medição: **3** Período: **22/07/2025 a 18/08/2025** % Realizado Período.: **3,75%** % Realizado Acum.: **34,18%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA.01 E 02 - SEDE OURO	RUA.03 E 04 - SEDE OURO	RUA BARRAO DO RIO BRANCO	RUA REICHART	RUA GETULIO LE DAS AMERICAS	GERALDO FERRELES AV.IGUAÇU E CASTELO	BRANCO	SALDANHA MARINHO	RU SANTOS DUMONT	RUA COMEND. ARAUJO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	TERRAPLENAGEM																									
4	CALÇADAS EM PAVER						2	3		2	1															
5	0						2	3		2	1															
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									

Medições	Data das Medições											
	11/07/2025	21/07/2025	18/08/2025									
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	% 15,67%	14,76%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 125.374,55	118.120,21	30.031,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 15,67%	30,43%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%
	R\$ 125.374,55	243.494,76	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04	273.526,04

MUNICÍPIO DE SULINA
Local
segunda-feira, 18 de agosto de 2025
Data

GILBERTO JOAO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720253815316

7.744.134/0001-41
Pedreira Santiago Ltda

Rua 13 de Maio, s/n B. São Miguel
560-000 CHOPINZINHO



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br




MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CONTRATO Nº	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS
MEDIÇÃO Nº	03
DATA DA VISTORIA	18/08/2025
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720253815316

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO







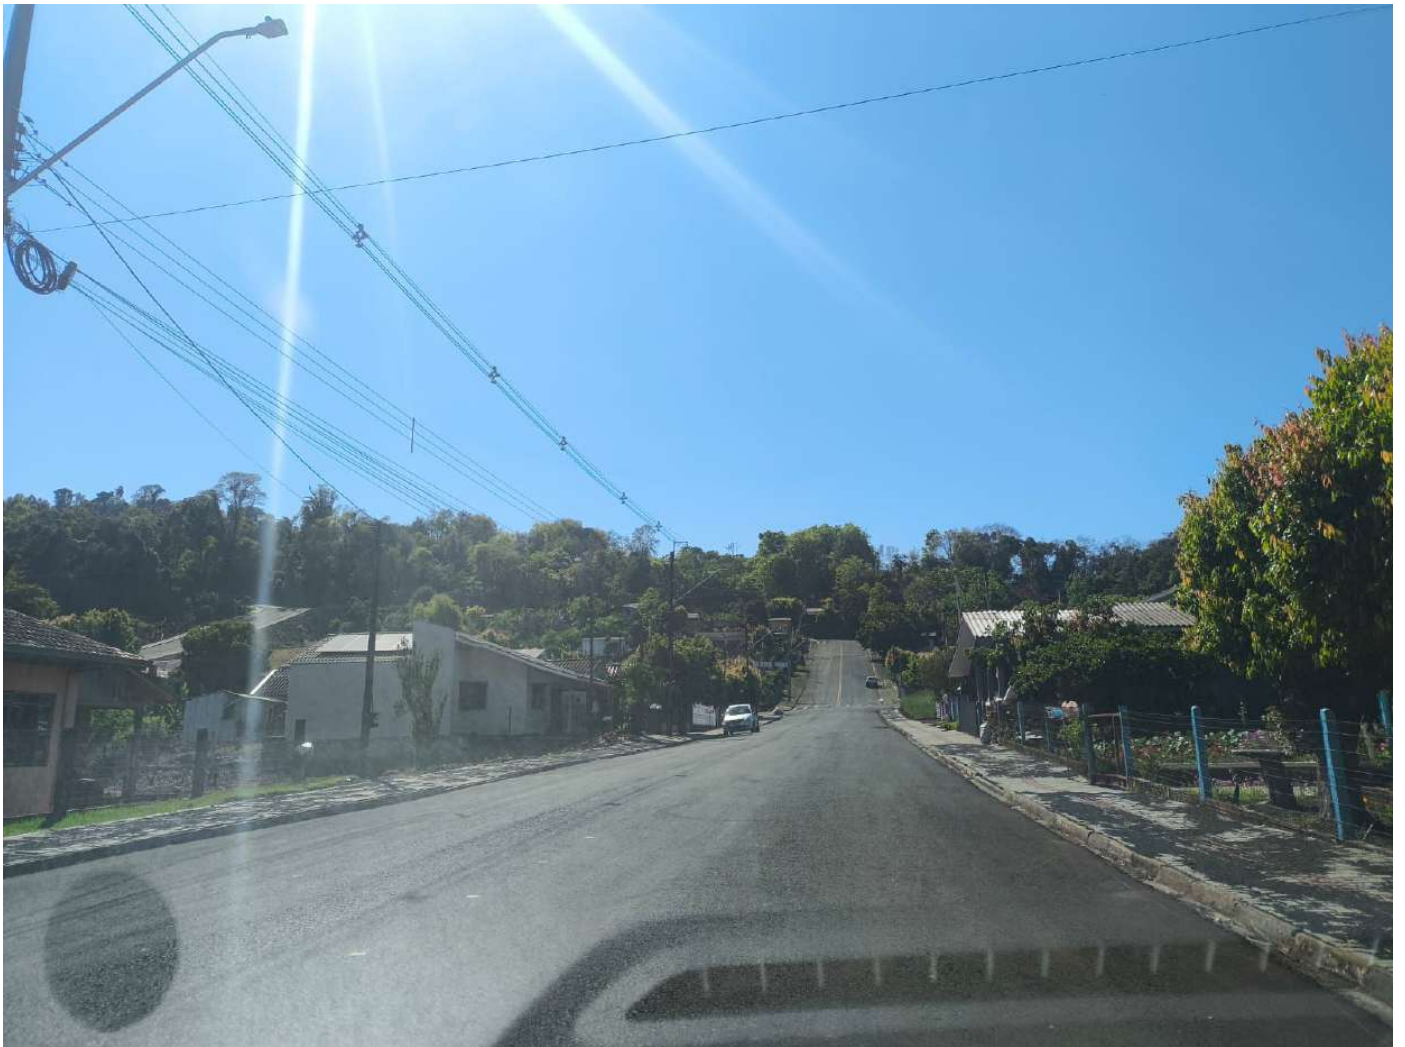



























Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: SULINA – PR.	
SUBPROJETO: CALÇADA DE BLOCO INTERTRAVADO PAVER EM ÁREAS PÚBLICAS	
EMPRESA CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	
VALOR REAL: R\$ 800.000,00	CONTRATO Nº: 33/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) tem por objetivo REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER, EM ÁREAS PÚBLICAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos instrumentos de contratação e no	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: Obra aguardando próxima medição	
Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo medição.	
 GILBERTO JOÃO ROSSI Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 30 de janeiro de 2026.
