

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 153/2024	88	30/03/2025	R\$ 83.500,00	34,58%

Nº2/2025  
Data Inicial: 30/03/2025

**COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO  
ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA  
PRAÇA DOS IMIGRANTES**

**R\$ 83.500,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10002594

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3768	2025	20/05/2025	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	05/05/2025

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/11/2025	153	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	15**8*1*	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**04**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**04**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**92**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5806	R\$ 84.315,23	02/10/2024	
Contrato	153	2024	80.869.886/0001-43	5807	R\$ 83.500,00	30/11/2024	34,58%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5808	Medição	1	Jurisdicionado	22/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%

5813	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5823	Medição	3	Jurisdicionado	29/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5833	Medição	4	Jurisdicionado	29/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5840	Medição	5	Jurisdicionado	29/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5847	Medição	6	Jurisdicionado	28/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5854	Medição	7	Jurisdicionado	23/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5863	Medição	8	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900232271776					

Nº2/2025  
Data Inicial: 30/03/2025

# COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES

Documentos

R\$ 83.500,00











BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA VARANDA COMPLEXO ESPORTIVO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 22/05/2025	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 34,58%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
<b>1. COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>						<b>83.500,00</b>	-	-	-	-	28.871,18	28.871,18
<b>1.1. FUNDAÇÃO</b>						<b>29.260,90</b>	-	-	-	-	28.871,18	28.871,18
<b>1.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021</b>						<b>814,48</b>	-	-	-	-	814,48	814,48
1.1.1.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,30	126,52	164,48	-	1,30	1,30	-	164,48	164,48	
1.1.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PA	M3	1,30	500,00	650,00	-	1,30	1,30	-	650,00	650,00	
<b>1.2. ESTRUTURA</b>						<b>22.258,00</b>	-	-	-	-	22.258,00	22.258,00
1.2.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO GSG 14, E = 1,95MM EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM PARAFUSO PARABOLT	UN.	7,00	55,00	385,00	-	7,00	7,00	-	385,00	385,00	
1.2.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	KG	65,80	15,00	987,00	-	65,80	65,80	-	987,00	987,00	
1.2.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	UN	7,00	1.791,00	12.537,00	-	7,00	7,00	-	12.537,00	12.537,00	
1.2.4.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M2	145,20	57,50	8.349,00	-	145,20	145,20	-	8.349,00	8.349,00	
<b>1.3. COBERTURA</b>						<b>6.188,42</b>	-	-	-	-	5.798,70	5.798,70
1.3.1.	INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, E = 0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO	M2	145,20	14,11	2.048,77	-	145,20	145,20	-	2.048,77	2.048,77	
1.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	26,40	79,54	2.099,86	-	26,40	26,40	-	2.099,86	2.099,86	
1.3.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	25,30	65,22	1.650,07	-	25,30	25,30	-	1.650,07	1.650,07	
1.3.4.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,00	39,44	236,64	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	38,27	153,08	-	-	-	-	-	-	
<b>2. COBERTURA PARQUINHO INFANTIL NA PRAÇA DO IMIGRANTE</b>						<b>54.239,10</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. FUNDAÇÃO</b>						<b>2.493,70</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	3,84	133,77	513,68	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	3,84	515,63	1.980,02	-	-	-	-	-	-	
<b>2.2. ESTRUTURA</b>						<b>43.597,87</b>	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO GSG 14, E = 1,95MM EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM PARAFUSO PARABOLT	UN.	12,00	60,50	726,00	-	-	-	-	-	-	
	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA											



BM - Boletim de Medição  
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0) COBERTURA VARANDA COMPLEXO ESPORTIVO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 22/05/2025	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 34,58%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>						<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	28.871,18	28.871,18
2.2.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	6,00	2.546,26	15.277,56	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	417,90	58,99	24.651,92	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	<b>COBERTURA</b>	-	-	-	<b>8.147,53</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, E = 0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO	M2	417,90	14,11	5.896,57	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	23,40	79,54	1.861,24	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,00	39,44	236,64	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	38,27	153,08	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

quinta-feira, 22 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR:31879/D

ART/RRT: 1720252819288



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de

**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
CONTRATADA	<b>MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>153/2024</b>
OBJETO	<b>EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR.</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>01</b>
DATA DA VISTORIA	<b>20/05/2025</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Assinado por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MOACIR DA ROSA, MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CO e GILBERTO JOAO ROSSI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E638-857F-282E-F337> e informe o código E638-857F-282E-F337



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

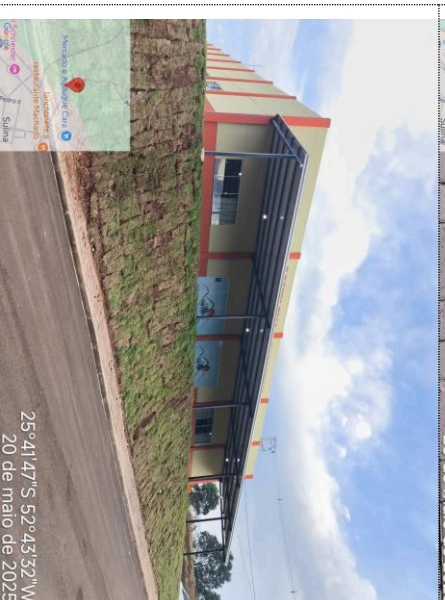

Sulina, 22 de maio de 2025.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D  
ART Fiscalização: 1720252819288

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: E638-857F-282E-F337

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 22/05/2025 10:08:44 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MOACIR DA ROSA (CPF 866.XXX.XXX-34) em 23/05/2025 07:18:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CO (CNPJ 16.700.335/0001-52) em  
23/05/2025 08:06:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 23/05/2025 13:51:10 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E638-857F-282E-F337>





















Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES**

EMPRESA CONTRATADA:

**MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

VALOR REAL:

**RS 83.500,00**

CONTRATO Nº:

**153/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras “EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR”, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 17/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra aguardando liberação do próximo canteiro de obras**

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo canteiro de obras.

  
**GILBERTO JOÃO ROSSI**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 30 de junho de 2025.



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:  
**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:  
**COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES .**

EMPRESA CONTRATADA:  
**MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

VALOR REAL:  
**RS 83.500,00**

CONTRATO Nº:  
**153/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras “EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR”, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 17/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra aguardando liberação do próximo canteiro de obras**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo canteiro de obras.


  
**GILBERTO JOÃO ROSSI**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 29 de agosto de 2025.



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: <b>SULINA – PR.</b>	
SUBPROJETO: <b>COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES</b>	
EMPRESA CONTRATADA: <b>MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b>	
VALOR REAL: <b>RS 83.500,00</b>	CONTRATO Nº: <b>153/2024</b>
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) execução das obras “EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR”, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 17/2024.	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: <b>Obra aguardando liberação do próximo canteiro de obras</b>	
Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo canteiro de obras.	
 <b>GILBERTO JOÃO ROSSI</b> Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 30 de janeiro de 2026.
