


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES Esta intervenção está em andamento	Contrato 153/2024	88	30/03/2025	R\$ 83.500,00	34,58%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10002594

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
3768	2025	20/05/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	05/05/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/11/2025	153	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*4*.6**-12	RRT (CAU)	15**8*1*	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**04**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**04**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**92**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5806	R\$ 84.315,23	02/10/2024	
Contrato	153	2024	80.869.886/0001-43	5807	R\$ 83.500,00	30/11/2024	34,58%

Acompanhamentos


Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5808	Medição	1	Jurisdicionado	22/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%

5813	Medição	2	Jurisdicionado 30/06/2025 Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5823	Medição	3	Jurisdicionado 29/08/2025 Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%
5833	Medição	4	Jurisdicionado 29/09/2025 Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2024	34,58%


Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900232271776





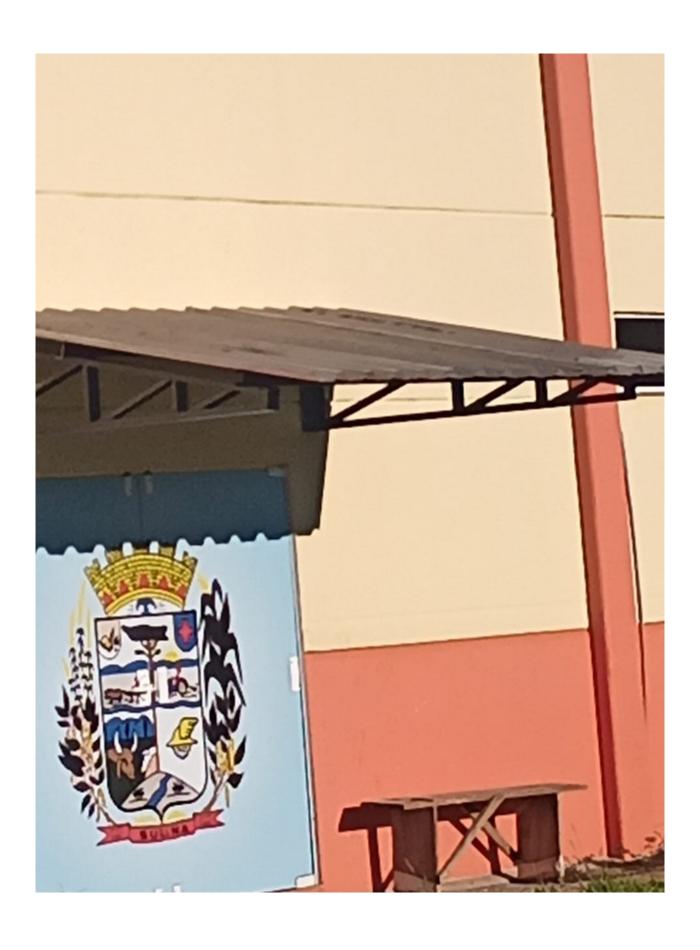





o por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MOACIR DA ROSA, MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CO e TO JOAO ROSSI ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E638-857F-282E-F337 e informe o código E638-857F-282E-F337

Município de Sulina

CAIXA

BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 COBERTURA VARANDA COMPLEXO ES	PORTIVO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	№ MEDIÇÃO
0 0	0	(SELECIONAR)	00/01/1900 a 22/05/2025	1

Realizado Acumulado: 34,58%

	Orçamento Contratado					Evol	ução Física (Qtde.)	E	volução Financeira (F	\$)
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do				TOTAL:	83.500,00	-	-	-		28.871,18	28.871,18
1. 1.1.	COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO FUNDAÇÃO	-			29.260,90 814,48	-	-			28.871,18 814,48	28.871,18 814,48
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	МЗ	1,30	126,52	164,48	-	1,30	1,30	-	164,48	164,48
1.1.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	МЗ	1,30	500,00	650,00	-	1,30	1,30	-	650,00	650,00
1.2.	ESTRUTURA	-	-	-	22.258,00	-	-	-	-	22.258,00	22.258,00
1.2.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO GSG 14, E = 1,95MM EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM PARAFUSO PARABOLT	UN.	7,00	55,00	385,00	-	7,00	7,00	-	385,00	385,00
1.2.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	65,80	15,00	987,00	-	65,80	65,80	-	987,00	987,00
1.2.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	1.791,00	12.537,00	-	7,00	7,00	-	12.537,00	12.537,00
1.2.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TÉRÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	145,20	57,50	8.349,00	-	145,20	145,20	-	8.349,00	8.349,00
1.3.	COBERTURA	-	-	-	6.188,42	-	-	-	-	5.798,70	5.798,70
1.3.1.	INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO FORNECIDA PELO MUNICIPIO, E = 0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO	M2	145,20	14,11	2.048,77	-	145,20	145,20	-	2.048,77	2.048,77
1.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	26,40	79,54	2.099,86	-	26,40	26,40	-	2.099,86	2.099,86
1.3.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	25,30	65,22	1.650,07	-	25,30	25,30	-	1.650,07	1.650,07
1.3.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	М	6,00	39,44	236,64	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	4,00	38,27	153,08	-	-	-	-	-	-
2. 2.1.	COBERTURA PARQUINHO INFANTIL NA PRAÇA DO IMIGRANTE FUNDAÇÃO	-	-		54.239,10 2.493,70	-	-		-		
2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	3,84	133,77	513,68	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	МЗ	3,84	515,63	1.980,02	-	-	-	-	-	-
2.2.	ESTRUTURA	-			43.597,87	-			-		-
2.2.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO GSG 14, E = 1,95MM EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM PARAFUSO PARABOLT	UN.	12,00	60,50	726,00	-	-	-	-	-	-
	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE ORRA										

o por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MOACIR DA ROSA, MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CO e TO JOAO ROSSI ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E638-857F-282E-F337 e informe o código E638-857F-282E-F337

Município de Sulina

BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	№ OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV APELIDO DO EMPRE	ENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
	0	0 COBERTURA VARANI	DA COMPLEXO ESPORTIVO	00/01/00
№ CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO

Realizado Acumulado: 34,58%

	Orçamento Contratado					Evol	ução Física (Qtde.)	E [,]	volução Financeira (R	\$)
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do		'	•	TOTAL:	83.500,00	-	-	-	-	28.871,18	28.871,18
2.2.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	6,00	2.546,26	15.277,56	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	417,90	58,99	24.651,92	-	-	-	-	-	-
	AF_07/2019				0 147 50						
2.3.	COBERTURA	-			8.147,53	-					
2.3.1.	INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO FORNECIDA PELO MUNICIPIO, E = 0.5MM, INCLUSO ICAMENTO	M2	417,90	14,11	5.896,57	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	23,40	79,54	1.861,24	-	-	-	-	-	-
2.3.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	М	6,00	39,44	236,64	-	-	-	-	-	-
2.3.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	38,27	153,08	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR quinta-feira, 22 de maio de 2025 **Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização Profissão: ENGENHEIRO CIVIL CREA/CAU: PR:31879/D ART/RRT: 1720252819288

LUCIANO S. SANTIAGO

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO SULINA

CONTRATADA MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

CONTRATO № 153/2024

OBJETO EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA

VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES

DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR.

MEDIÇÃO № 01

DATA DA VISTORIA 20/05/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

















Sulina, 22 de maio de 2025.

Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D ART Fiscalização: 1720252819288

prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E638-857F-282E-F337

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 22/05/2025 10:08:44 GMT-03:00 Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOACIR DA ROSA (CPF 866.XXX.XXX-34) em 23/05/2025 07:18:30 GMT-03:00 Papel: Parte
 - Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CO (CNPJ 16.700.335/0001-52) em
 23/05/2025 08:06:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 23/05/2025 13:51:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E638-857F-282E-F337





















PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA - PR.

SUBPROJETO:

COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES

EMPRESA CONTRATADA:

MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

VALOR REAL:

CONTRATO Nº:

R\$ 83.500,00

153/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras "EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 17/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando liberação do próximo canteiro de obras

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo canteiro de obras.

Prefeito Municipal



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA - PR.

SUBPROJETO:

COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES .

EMPRESA CONTRATADA:

MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

VALOR REAL:

CONTRATO Nº:

R\$ 83.500,00

153/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras "EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DA VARANDA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL E DO PARQUINHO DA PRAÇA DOS IMIGRANTES DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 17/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando liberação do próximo canteiro de obras

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo canteiro de obras.

Prefeito Municipal

Sulina - PR, 29 de agosto de 2025.
