


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL ESCOLA ANGELICA BATTISTUZ LOTE 03 Esta intervenção foi concluída	Contrato 21/2025	60	24/03/2025	R\$ 58.899,00	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

34111

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
2385	2025	30/04/2025	12249
2982	2025	01/06/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1008	4061	01/05/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento12/08/202521/2025Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**4*4*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**4*4*	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**50**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.2**-16	ART (CREA)	17**2*2**39**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001347	R\$ 68.495,35	25/09/2024	
Contrato	21	2025	76.995.414/0001-60	9001348	R\$ 58.899,00	04/02/2025	100,00%

Acompanhamentos


Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

9001349	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2025	97,88%
9001360	Medição	2	Jurisdicionado	18/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2025	100,00%
9001369	Conclusão	3	Iurisdicionado	01/07/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

900232563271




Municipio de Chopinzinho'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO

PARQUE INFANTIL COM PISO EMBORRACHADO – ESCOLA ANGÉLICA BATTISTUZ



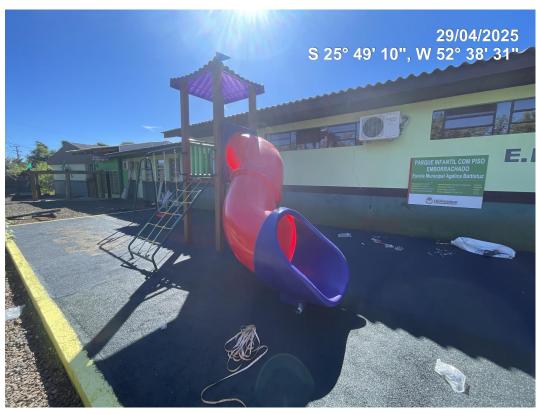











RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PARQUE INFANTIL COM PISO EMBORRACHADO NA ESCOLA ANGÉLICA BATTISTTUZ

CONTRATO 021/2025

















Parte de piso que carece ser corrigida:



Em uma parte do piso emborrachado, muito possivelmente problemas com a umidade e/ou material provocou um aspecto ruim e com textura diferente do esperado. A contratada já se prontificou a executar a correção. Será feito um recorte em toda área, o material será totalmente removido e novo será aplicado. Observo que a contratada apenas não executou o referido serviço ainda pois muitos foram os períodos de chuva e umidade na região, mas estima-se que até o dia 26 deste mês, havendo colaboração do clima, o reparo será feito.

Chopinzinho, 18 de Junho de 2025
