

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2022	Meu Campinho - Playground 1-Loteamento Jardins e 2-Loteamento Cohapar IX <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 238/2022	180	01/07/2022	R\$ 158.251,56	100,00%

Nº7/2022  
Data Inicial: 01/07/2022

## Meu Campinho - Playground 1-Loteamento Jardins e 2-Loteamento Cohapar IX

R\$ 158.251,56

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

31015; 41103

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4180	2022	01/07/2022	12249
4211	2022	01/07/2022	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/07/2022

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
22/06/2023	238/2022	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04.*5*.1**-26	RRT (CAU)	11**6*8*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04.*5*.1**-26	RRT (CAU)	11**6*8*	Orçamento	Sim
CPF	04.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**3*0*	Fiscalização	Sim
CPF	07.*9*.7**-18	ART (CREA)	17**2*3**08**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001050	R\$ 159.664,14	22/02/2022	
Contrato	238	2022	76.995.414/0001-60	9001051	R\$ 158.251,56	27/06/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001052	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	6,35%
9001061	Medição	2	Jurisdicionado	24/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	14,10%
9001061	Medição	3	Jurisdicionado	22/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	14,10%
9001061	Medição	4	Jurisdicionado	28/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	14,10%
9001103	Medição	5	Jurisdicionado	09/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	38,57%
9001103	Medição	6	Jurisdicionado	22/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	38,57%
9001134	Medição	7	Jurisdicionado	10/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	43,20%
9001134	Medição	8	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	43,20%
9001149	Medição	9	Jurisdicionado	14/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	100,00%
9001149	Medição	10	Jurisdicionado	10/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	100,00%
9001149	Medição	11	Jurisdicionado	10/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2022	100,00%
9001169	Conclusão	12	Jurisdicionado	10/06/2023			

## Matrículas de Obras


Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900112871278					

## Meu Campinho - Playground 1-Loteamento Jardins e 2-Loteamento Cohapar IX

### Documentos

R\$ 158.251,56



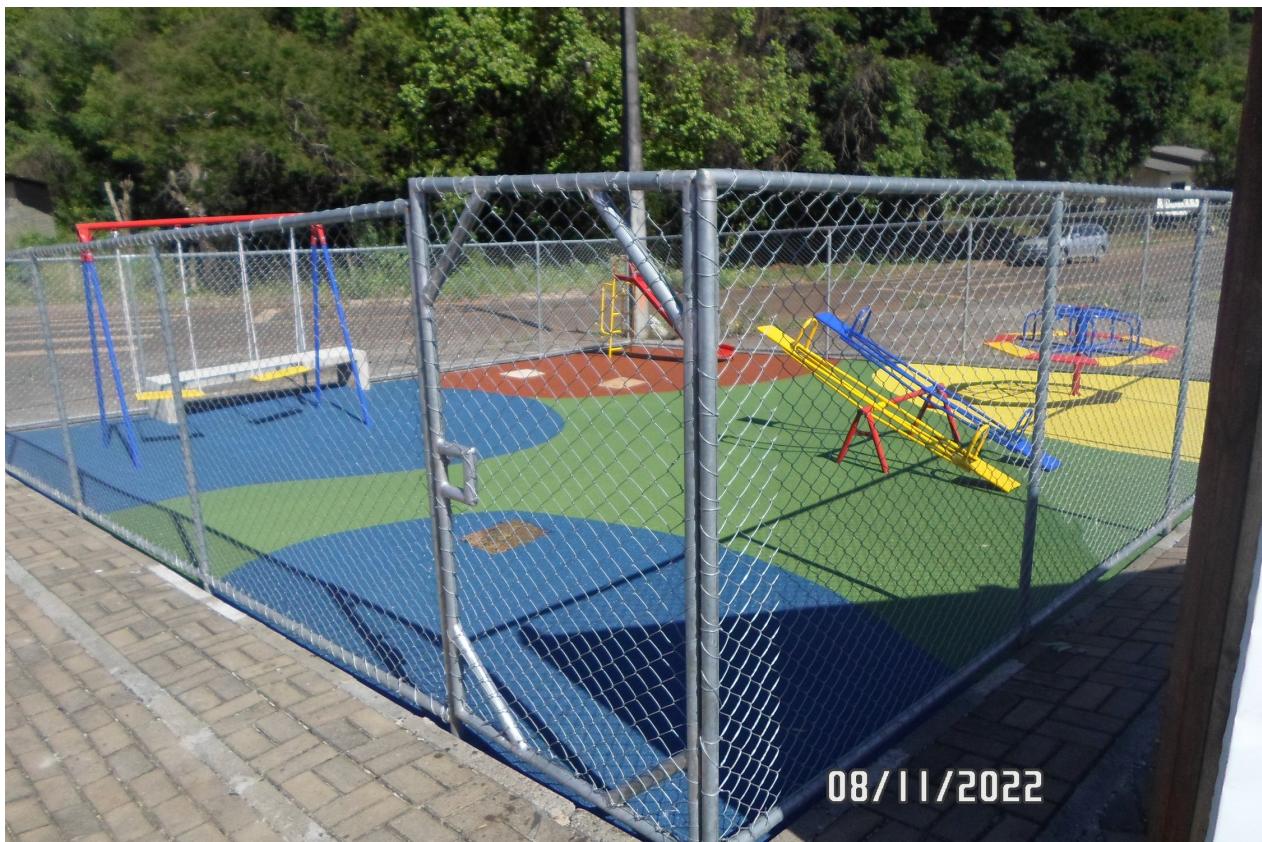

08/11/2022









08/11/2022



08/11/2022



08/11/2022



08/11/2022





















21/12/2022



# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
 Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel  
 85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

**MUNICÍPIO**  
**PROJETO/LOTE**  
**PROGRAMA**  
**CONTRATADA**  
**CONTRATO Nº**  
**OBJETO**

**Chopinzinho**  
**SAM 70**  
**PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**  
**CLEODOMAR DE PAULA CONSTRUTORA**  
**238/2022**  
**02 PARQUES INFANTIS – API-03**

**MEDIDAÇÃO Nº** 05  
**DATA DA VISTORIA** 14/03/2023

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 22/12/2022 até 14/03/2023

## SERVIÇOS EXECUTADOS

### 1 PLACA DE OBRA



Figure 1 - Placa de obra instalada no Loteamento Jardins

Assinado por 1 pessoa: KAMILA VILLWOCK HARNISCH  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho-1.doc.com.br/verificacao/F89F-38C3-594A-356D> e informe o código F89F-38C3-594A-356D





# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: [prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br](mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br)Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel  
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

## 2 BASE PARA PISO EMBORRACHADO



Figure 2 - Base para piso emborrachado

## 3 PISO EMBORRACHADO EXECUTADO:



Figure 3 - Piso Emborrachado instalado

Assinado por 1 pessoa: KAMILA VILLWOCK HARNISCH  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho-1.doc.com.br/verificacao/F89F-38C3-594A-356D> e informe o código F89F-38C3-594A-356D



# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
 Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel  
 85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Figure 4 - Piso emborrachado instalado

#### 4 FOTOS PARQUINHO DA COHAPAR IX:

O Parquinho localizado na Cohapar IX já concluído em outra medição, encontra-se nas mesmas condições do parquinho do Loteamento Jardins.



Figure 5 - Parquinho Cohapar IX

Chopinzinho, 14 de março de 2023

Kamila Villwock Harnisch – CAU A85696-7  
 RRT de fiscalização nº SI12113405I00CT001

Assinado por 1 pessoa: KAMILA VILLWOCK HARNISCH  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/F89F-38C3-594A-356D> e informe o código F89F-38C3-594A-356D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F89F-38C3-594A-356D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 14/03/2023 14:39:50 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/F89F-38C3-594A-356D>
