

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|-------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 7 | 2023 | Reforma e Ampliação Escola Mun. de Excelência | Contrato 135/2023 | 120 | 29/05/2023 | R\$ 760.376,09 | 100,00% |
| | | Esta intervenção foi concluída | | | | | |

Nº7/2023
Data Inicial: 29/05/2023

Reforma e Ampliação Escola Mun. de Excelência

R\$ 760.376,09

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

32859

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3540 | 2023 | 31/07/2023 | 12249 |
| 203 | 2024 | 23/01/2023 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1008 | 3114 | 01/07/2023 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 23/05/2023 | 135/2023 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 04*.5*.1**-26 | RRT (CAU) | 12**9*5* | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 04*.5*.1**-26 | RRT (CAU) | 12**9*5* | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.8*.0**-08 | ART (CREA) | 17**2**53** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2**74** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9001179 | R\$ 951.649,92 | 02/01/2023 | |
| Contrato | 135 | 2023 | 76.995.414/0001-60 | 9001180 | R\$ 760.376,09 | 27/01/2023 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9001186 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 24/07/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 5,19% |
| 9001192 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 18/08/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 12,58% |
| 9001196 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 05/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 32,45% |
| 9001203 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 16/10/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 54,01% |
| 9001211 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 21/11/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 74,42% |
| 9001211 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 21/12/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 74,42% |
| 9001220 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 05/01/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 90,34% |
| 9001223 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 05/02/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 100,00% |
| 9001223 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 05/03/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 135/2023 | 100,00% |
| 9001247 | Conclusão | 10 | Jurisdicionado | 01/04/2024 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900150208976 | | | | | |

Nº7/2023
Data Inicial: 29/05/2023

Reforma e Ampliação Escola Mun. de Excelência

Documentos

R\$ 760.376,09





11/07/2023
S 25° 51' 29" , W 52° 31' 24"
PR, Chopinzinho, Frei Vito







19/07/2023

S 25° 51' 30", W 52° 31' 26"

PR, Chopinzinho, Frei Vito



19/07/2023

S 25° 51' 30", W 52° 31' 26"

PR, Chopinzinho, Frei Vito












































21/11/2023

S 25° 51' 28", W 52° 31' 24"

PR, Chopinzinho, Frei Vito



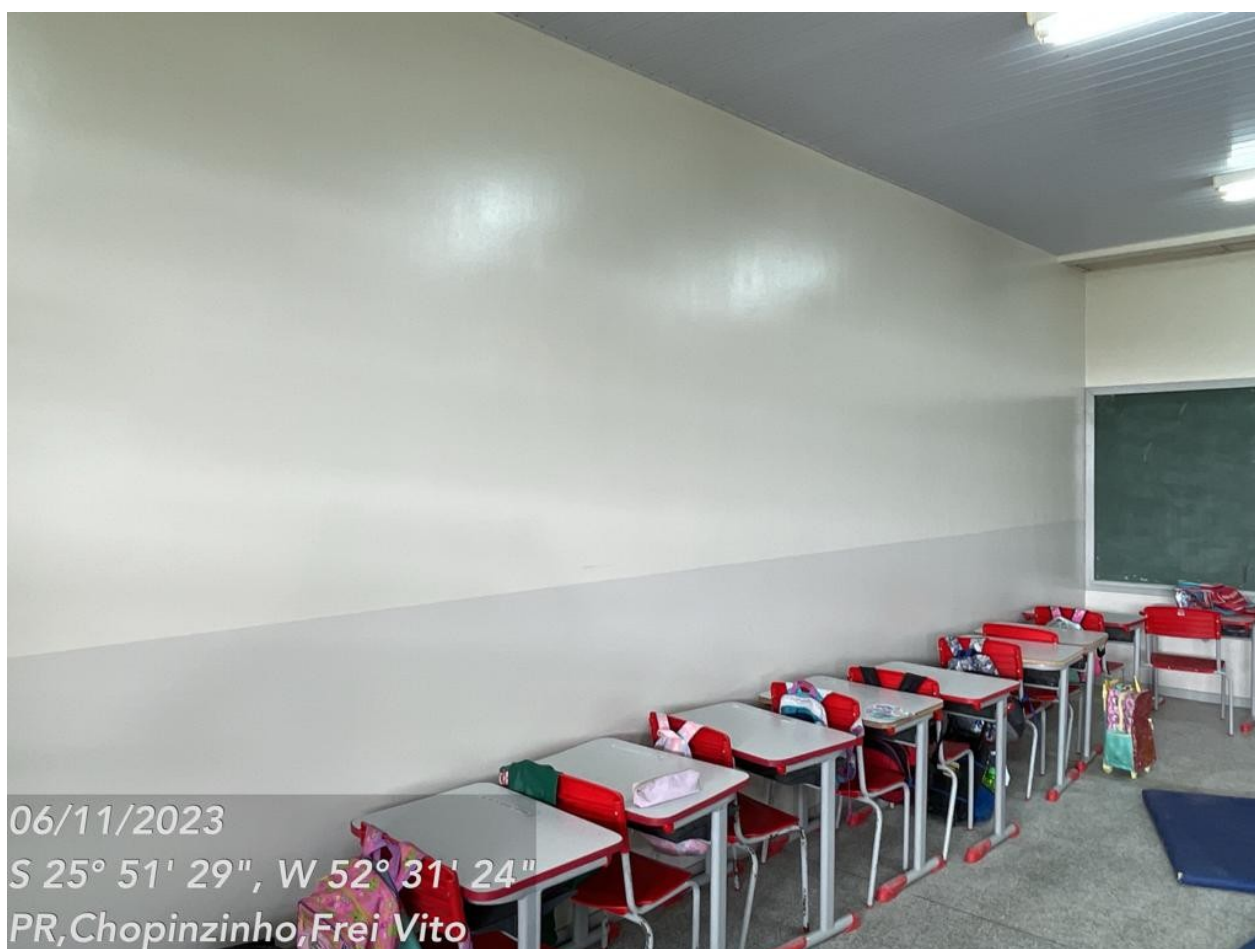















FOTOS DA OBRA FINALIZADA – 7ª MEDIÇÃO









