

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2023	Recape Asfáltico Linha Santa Cruz a Nsr. das Graças , Linha Raldi e São Luiz Esta intervenção foi concluída	Contrato 202/2023	240	04/09/2023	R\$ 4.802.962,24	100,00%

Nº8/2023
Data Inicial: 04/09/2023

Recape Asfáltico Linha Santa Cruz a Nsr. das Graças , Linha Raldi e São Luiz

R\$ 4.802.962,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

29323; 30373; 33750

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5750	2023	11/09/2023	12249
5751	2023	11/09/2023	12249
130	2024	15/01/2024	12249
128	2024	15/01/2024	12249
129	2024	15/01/2024	12249
2831	2024	13/05/2024	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	3114	01/11/2023

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/03/2024	202/2023	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*4**47**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**59**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**59**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*5**93**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001205	R\$ 4.804.265,80	03/05/2023	
Contrato	202	2023	76.995.414/0001-60	9001206	R\$ 4.802.962,24	29/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001207	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2023	53,91%
9001213	Medição	2	Jurisdicionado	20/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2023	75,87%
9001213	Medição	3	Jurisdicionado	20/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2023	75,87%
9001213	Medição	4	Jurisdicionado	20/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2023	75,87%
9001234	Medição	5	Jurisdicionado	20/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2023	100,00%
9001248	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/04/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900162447674					

Nº8/2023
Data Inicial: 04/09/2023

Recape Asfáltico Linha Santa Cruz a Nsr. das Graças , Linha Raldi e São Luiz

Documentos

R\$ 4.802.962,24



26/09/2023

S 25° 46' 44", W 52° 27' 29"





26/09/2023

S 25° 47' 27", W 52° 27' 56"

PR, Chopinzinho



26/09/2023

S 25° 47' 27", W 52° 27' 56"

PR, Chopinzinho



26/09/2023

S 25° 47' 27", W 52° 27' 56"

PR, Chopinzinho












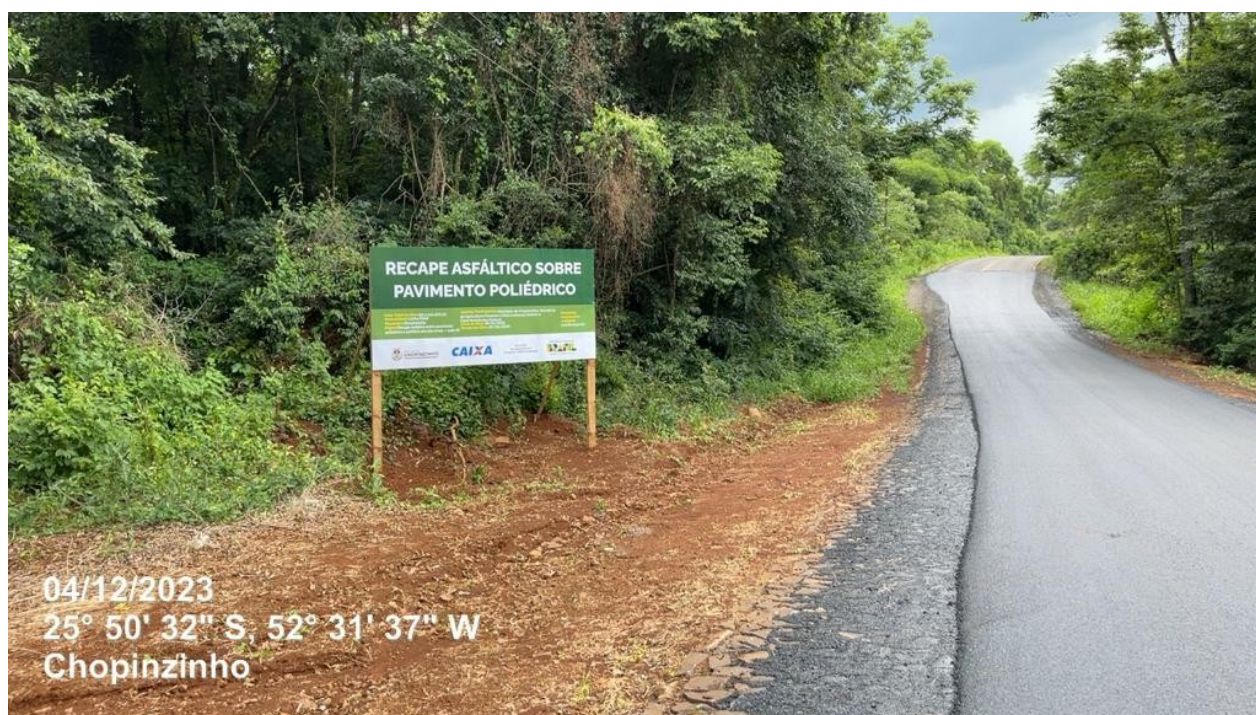



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA RECAPE ASFÁLTICO LINHA SÃO LUIZ

3ª MEDIÇÃO

