

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	Iluminação do Estádio Municipal Esta intervenção foi concluída	Contrato 6/2023	90	21/02/2023	R\$ 294.118,49	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 21/02/2023

Iluminação do Estádio Municipal

R\$ 294.118,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2286

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5189	2023	11/09/2023	12543
5188	2023	11/09/2023	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2023

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/10/2023	06	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.7**-77	ART (CREA)	17**2*1**66**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*0**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5589	R\$ 335.081,65	03/08/2022	
Contrato	6	2023	80.869.886/0001-43	5590	R\$ 294.118,49	14/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5591	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	100,00%
5496	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/10/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
9001529146	900152914674	1	29/08/2023	25/02/2024	

Nº5/2023
Data Inicial: 21/02/2023

Iluminação do Estádio Municipal

Documentos

R\$ 294.118,49

N	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	1		50	50										
32	2		40	50	10									
33	3		60	40										
34	4		20	50	30									
35	5		10	50	40									
36	6		30	70										
37	7		40	60										
38	8		10	50	40									
39	9		20	50	30									
310	10		40	60										
311	11		20	40	40									
312	12		20	40	40									
N	4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1		50	50										
42	2		30	40	20	10								
43	3		50	40	10									
44	4		20	40	20	20								
45	5		10	30	40	20								
46	6		10	70	20									
47	7		30	30	30	40								
48	8		10	30	30	30								
49	9		20	30	30	30								
410	10		30	40	30									
411	11		10	30	30	30								
412	12		20	20	40	20								
N	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1		40	40	20									
52	2		20	30	30	10	10							
53	3		40	40	20									
54	4		20	20	20	20	20							
55	5		5	15	20	30	30							
56	6				60	40								
57	7				10	30	30	30						
58	8		10	20	30	20	20	20						
59	9		20	20	30	20	10	10						
510	10		10	10	20	20	30	20						
511	11		10	20	20	30	20	20						
512	12		20	20	20	20	20	20						
N	6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1		40	20	30									
62	2		20	30	20	10	10	10						
63	3		20	40	40									
64	4		10	20	20	20	20	20	10					
65	5		5	10	20	30	25	10						
66	6				30	50	10							
67	7				20	30	30	20	20					
68	8		10	10	20	20	20	20	20					
69	9		10	20	20	20	20	10	10					
610	10		10	10	20	20	30	20	20					
611	11		10	10	20	20	20	20	20					
612	12		10	20	20	20	20	10	10					
N	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1		30	30	30	10	10	10	10					
72	2		20	20	20	10	10	10	10					
73	3		20	30	30	20								
74	4		10	10	20	20	20	10	10					
75	5		5	10	20	20	20	15	10					
76	6				20	40	30							
77	7				20	20	20	20	20					
78	8		10	10	10	20	20	20	10					
79	9		10	10	20	20	20	10	10					
710	10		10	10	20	20	20	20	20					
711	11		5	5	10	20	20	20	10					
712	12		10	10	20	20	20	10	10					
N	8		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1		20	30	30	20	10	10	10	10				
82	2		10	20	20	10	10	10	10	10				
83	3		20	20	30	20	10	10						
84	4		10	10	10	20	20	10	10	10				
85	5		5	10	20	20	15	10	10	10				
86	6				30	30	30	10						
87	7				10	20	20	10	20	10				
88	8		10	10	10	10	20	20	10	10				
89	9		10	10	10	20	20	10	10	10				
810	10		10	10	10	20	20	20	20	10				
811	11		5	5	10	20	20	20	10	10				
812	12		10	10	10	20	20	10	10	10				
N	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1		20	30	20	20	10	10	10	10				
92	2		10	20	20	10	10	10	10	10				
93	3		20	20	30	20	10							
94	4		10	10	10	10	20	10	10	10	10			
95	5		5	10	10	20	15	10	10	10	10			
96	6				20	20	20	20	20					
97	7				10	10	10	20	20	10	10			
98	8		10	10	10	10	10	20	10	10	10			
99	9		10	10	10	10	20	10	10	10	10			
910	10		10	10	10	10	20	20	20	10	10			
911	11		10	10	10	10	20	20	10	10	10			
912	12		10	10	10	10	20	10	10	10	10			
N	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1		20	30	20	20	10	10	10	10				
102	2		10	10	20	10	10	10	10	10				
103	3		20	20	20	20	20	20	20	20				
104	4		5	10	15	10	10	10	10	10	10			
105	5		5	10	15	10	10	10	10	10	10			
106	6				20	20	20	20	20					
107	7				10	10	10	20	20	10	10			
108	8		5	5	10	10	10	20	10	10	10			
109	9		5	5	10	10	10	20	10	10	10			
1010	10		5	5	10	10	10	20	10	10	10			
1011	11		5	5	10	10	10	20	10	10	10			
1012	12		10	10	10	10	10	20	10	10	10			
N	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1		20	20	20	20	10	10	10	10				
112	2		10	10	20	10	10	10	10	10				
113	3		20	20	20	20	20	20	20	20				
114	4		5	10	10	10	10	10	10	10	10		5	
115	5		5	10	10	10	10	10	10	10	10		5	
116	6				10	20	20	20	20					
117	7				10	10	10	10	20	10	10		10	
118	8		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	
119	9		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	
1110	10		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	
1111	11		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	
1112	12		5	10	10	10	10	10	10	10	10		5	
N	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1		20	20	20	20	10	10	10	10				
122	2		10	10	10	10	10	10	10	10	10			
123	3		10	20	20	20	20	10	10	10	10			
124	4		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	5
125	5		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	5
126	6				10	20	20	20	20					
127	7				10	10	10	10	10	10	10		10	10
128	8		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	5
129	9		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	5
1210	10		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	5
1211	11		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	5
1212	12		5	5	10	10	10	10	10	10	10		5	5

Município de Sulina


PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL												
Município:	SULINA	SAM	53	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente		310.000,00	92.51%				
Projeto:	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	LOTE nº	01	Data	10/28/2023	Dias	70	Data	1/16/2024	nº		Contrapartida do Proponente	25.081,65	7.49%				
Quantidade:	0.00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		335.081,65	100.00%			
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/				
ITEM		3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ITEM (RS)	TOTAL		
	Data Início		16/1/24	16/2/24	18/3/24	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99				
	Data Fim		15/2/24	17/3/24	17/4/24	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014,86	0.90		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		10	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,40	0.09		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.142,47	98.82		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,92	0.19		
TOTAIS			TOTAIS										335.081,65	100				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																		
ITEM			PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 1.394,60	1.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.789,19	0,83%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$ 112,83	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	225,67	0,07%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$ 26,87	134,33	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	268,66	0,08%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 2,17	10,87	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	21,74	0,01%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$ 30,635,57	153,177,84	122,542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	306,355,68	91,43%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$ 2,478,68	12,393,40	9,914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	24,786,79	7,40%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB	TESOURO	R\$ 0,00	234,59	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	586,47	0,18%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	18,98	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	47,45	0,01%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 32,057,03	154,941,35	123,001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310,000,00	92,51%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 2,593,69	12,536,08	9,951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,081,65	7,49%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$ 34,650,72	167,477,43	132,953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,081,65	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$ 10,34%	49,98%	39,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		335,081,65	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$ 10,34%	60,32%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK	
Resp. Técnico:			Assinatura: _____				Prefeito: _____				Assinatura: _____		data: _____					

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2.00
	PIS =	0.65
	COFINS =	3.00
	CRPB =	0.00
	TOTAL =	5.65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.00	3.45
RISCOS	1.27	0.85
SEGUROS E GRANTIAS	1.00	0.48
DESPESAS FINANCEIRAS	1.39	0.85
LUCRO	8.44	5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	23.84	15.28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	23.84%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15.28%	

GRANDES ITENS				
Município:	SULINA	SAM	53	
Projeto:	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	LOTE nº	01	
			(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		3,014.86	0.90%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		0.00	0.00%
3	FUNDACOES		0.00	0.00%
4	ESTRUTURAS		0.00	0.00%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		290.40	0.09%
6	COBERTURA		0.00	0.00%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		0.00	0.00%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		331,142.47	98.82%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		0.00	0.00%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		633.92	0.19%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		0.00	0.00%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		0.00	0.00%
TOTAL GERAL		0.00	335,081.65	100.00%
Experiência:		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
				0.00

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	unitario	Total
	1 Composição		1	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LM/W) , PARA USO EXTERNO COM CURVA IES E CATÁLOGO TÉCNICO - DIVIDIDA EM 10 MÓDULOS DE 100W, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1		8547.48
	Composição	SINAPI	88247	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	20.03	20.03
	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	25.67	25.67
	Cotação	SINAPI	42243	INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1	8501.78	8501.78
	2 Composição			DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO BIPOLAR)		UN	1		96.19
		SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO BIPOLAR)	UN		1	81.92	81.92
		SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENC	H		0.2734	23.51	6.427634

		SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLH		0.2734	28.68	7.841112
--	--	--------	-------	---------------------------------	--	--------	-------	----------




LUMINARE LED
 Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
 CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr - CNPJ 40.829.540/0001-05

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL												
Município:	SULINA											
Projeto:	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO											
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL	QUANT	UNIT	(R\$) - SEDU	(R\$) - PM
X												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS										
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO										
COMPOSIÇÃO	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.			UN	2434,48	2.646,44		1,00	2.646,44	2.646,44	2.646,44
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS										
5.1		ALVENARIA										
5.1.12		ENCUNHAMENTO										
103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			M2	58,62	63,72		4,00	63,72	254,88	254,88
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO										
8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA										
8.1.7		POSTES										
100588	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019			UN	772,15	839,38		6,00	839,38	5.036,28	5.036,28
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA										
101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P			UN	2344,09	2.548,18		1,00	2.548,18	2.548,18	2.548,18
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES										
8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS										
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016			M	11,42	12,41		900,00	12,41	11.169,00	11.169,00

2 de 7

ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Luminare LED - EIRELI

luciane@quessada.net



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623

		UN		3663,87		3.982,87		23.897,22	
41180	SINAPI	POSTE DE CONCRETO AF 06/2014							
10		M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23							
10.1		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS							
10.1.2		CHAPISCO							
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO							
10.4		INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM							
10.4.2		PREPARO MANUAL. AF_06/2014							
88495	SINAPI	PINTURAS							
10.4.3		EMASSAMENTO							
87529	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.							
10.4.11		AF_06/2014							
95623	SINAPI	MASSA UNICA							
x		MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO							
		1-2-8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA							
		MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,							
		COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014							
		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							
		APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA							
		DE VAOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAO.							
		AF_11/2016							
		TOTAL GERAL							

40.829.540/0001-05

LUMINARE LED
EIRELITv. Palmeiras, 143
Industrial

Pato Branco 85.506-410

LUMINARE LED EIRELI – CNPJ 40.829.540/0001-05
LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
REPRESENTANTE LEGAL

RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04



ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA PR-188644/D






25,69892S 52,71671W
535 Rua União da Vitória
Sulina
Paraná


10 de mai. de 2023 20:30:18
Rua Dom Pedro I
Sulina PR
85565-000
Brasil



med01.xls

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA							
MUNICÍPIO	: SULINA		MEDIÇÃO N.º:		1		
PROJETO	: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		DATA DA MEDIÇÃO:		22/05/2023		
CONVÊNIO	:						
CONTRATO EMPRÉSTIMO N.º	:						
EMPRESA VENCEDORA	: LUMINARE LED EIRELI						
CONTRATO EMPREITADA N.º	: 06/2023	DATA:	01/02/2023	ORDEM DE SERVIÇO N.º:	02 2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO	: R\$	292.111,25		DATA:	02/02/2023		
SAM	: N	53					
LOTE	: N	01					
ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OB	50,00%	1.323,22	100,00%	2.646,44	2.646,44
02	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10,00%	25,48	100,00%	254,88	254,88
03	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROT	10,00%	28.865,33	100,00%	288.653,37	288.653,37
04	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS		-	100,00%	556,56	556,56
05				-		-	-
06				-		-	-
07				-		-	-
08				-		-	-
09				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
13				-		-	-
14				-		-	-
15				-		-	-
16				-		-	-
17				-		-	-
18				-		-	-
19				-		-	-
20				-		-	-
21				-		-	-
22				-		-	-
23				-		-	-
24				-		-	-
25				-		-	-
26				-		-	-
Importa a presente medição no valor total de (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			R\$		292.111,25		
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT. ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação n.º, TP 0006/2022 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.							
ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471 977		Assinado de forma digital por ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977 Dados: 2023.07.13 09:00:18 -03'00'		 Luciano S. Santiago Engenheiro Civil Fiscalização Municipal		 PAULO HORN Prefeito Municipal	
Ana Terez Gonçalves Vieira Engenheira Eletricista Empresa Executora							

med01.xls

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA								ESTADO DO PARANÁ					
								REGIONAL	CASCADEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP		
								Mês	maio	PARCELA	1	DATA	26/05/2023
MUNICÍPIO: SULINA								SAM	53	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL								Lote	01	Nº	jun/23	Nº	02 2023
FIRMA EMPREITEIRA: LUMINARE LED EIRELI								Ano	2023	DATA:	01/02/2023	DATA	02/02/2023
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							-	-	-		
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-	-	-		
COMPOSIÇÃO 113		PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS	UN	1,00	100,00%	0,0091	0,91%	2646,44	2.646,44	2.646,44	-		
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-	-	-		
5.1		ALVENARIA							-	-	-		
5.1.12		ENCUNHAMENTO							-	-	-		
103322		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPE	M2	4,00	100,00%	0,0009	0,09%	63,72	254,88	254,88	-		
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-		
8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA							-	-	-		
8.1.7		POSTES							-	-	-		
100588		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMI	UN	6,00	100,00%	0,0172	1,72%	839,38	5.036,28	5.036,28	-		
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							-	-	-		
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							-	-	-		
101508		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM	UN	1,00	100,00%	0,0087	0,87%	2548,18	2.548,18	2.548,18	-		
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							-	-	-		
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							-	-	-		
97668		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	900,00	100,00%	0,0382	3,82%	12,41	11.169,00	11.169,00	-		
8.2.5		CABOS							-	-	-		
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV							-	-	-		
91931		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	2000,00	100,00%	0,0767	7,67%	11,20	22.400,00	22.400,00	-		
91933		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	1500,00	100,00%	0,0900	9,00%	17,53	26.295,00	26.295,00	-		
92988		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORN	M	150,00	100,00%	0,0288	2,88%	56,09	8.413,50	8.413,50	-		
8.2.8		CAIXAS							-	-	-		
97886		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS	UN	10,00	100,00%	0,0061	0,61%	179,01	1.790,10	1.790,10	-		
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							-	-	-		
101881		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BA	UN	1,00	100,00%	0,0049	0,49%	1436,09	1.436,09	1.436,09	-		
8.2.11		DISJUNTORES							-	-	-		
8.2.11.2		BIPOLARES							-	-	-		
93662		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	78,19	78,19	78,19	-		
8.2.11.3		TRIPOLARES							-	-	-		
101894		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INST	UN	6,00	100,00%	0,0041	0,41%	197,99	1.187,94	1.187,94	-		
8.2.11.4		OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR							-	-	-		
101895		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INST	UN	1,00	100,00%	0,0019	0,19%	546,21	546,21	546,21	-		
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							-	-	-		
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO							-	-	-		



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43


prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
PROJETO/LOTE	Nº 53 / LOTE Nº01
PROGRAMA	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
CONTRATADA	LUMINARE LED EIRELI
CONTRATO Nº	06/2023
OBJETO	ESTÁDIO MUNICIPAL
MEDIÇÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	26/05/2023

Iluminação do estádio municipal

MAPA / CROQUI / PLANTA BAIXA COM A MARCAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO

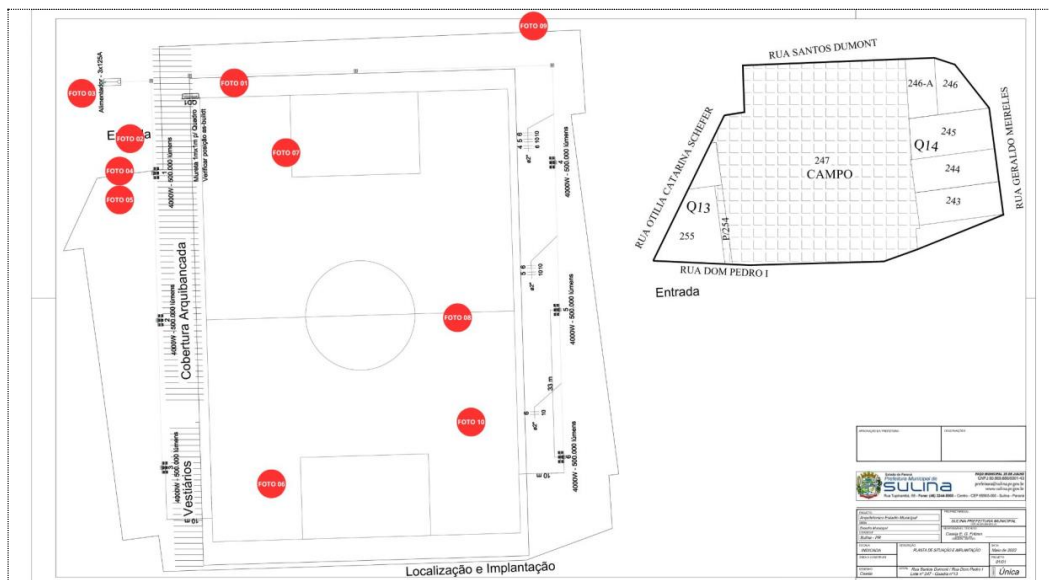



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

PLACA DA OBRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01

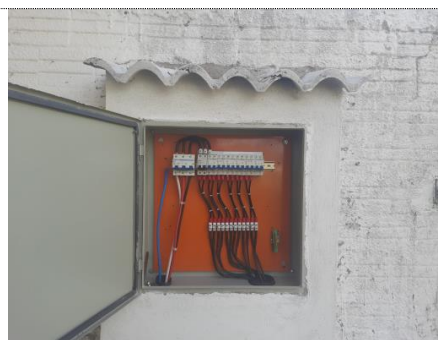


FOTO 02



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



FOTO 11



FOTO 12

Sulina, 26 de maio de 2023.

Luciano S. Santiago
CREA-PR: 31879/D
ART de fiscalização: 1720230729820



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E
A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.015.29146/74-001

Período: 27/02/2023 a 31/07/2023

Endereço: RUA OTILIA CATARINA SCHEFFER, 247, CENTRO, SULINA/PR, 85565-000

Contribuinte: LUMINARE LED LTDA

CNPJ: 40.829.540/0001-05

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil:

I - que consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou sobre o qual tenha sido proferida decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencido; e

II - que não consta débito inscrito em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, conforme disposto no art. 206 do CTN.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever outros débitos que vierem a ser apurados, referentes à obra de construção civil objeto da aferição.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>> ou <<https://www.gov.br/pgfn/pt-br>>.




Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 09:12:49 do dia 29/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2024.

Código de controle da certidão: **B573.5EDA.D420.9FC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA			
PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO			
SUPERVISÃO: PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO			
MUNICÍPIO: SULINA			
		SIT	SAM
		55451	53
		LOTE	CONCLUSÃO:
		1	22/05/2023
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO		CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
LUMINARE LED EIRELI		40829540000105	06/2023
VALOR: R\$ 292.111,25 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****)			
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Iluminação do estádio municipal			
LOCALIZAÇÃO: RUA OTÍLIA CATARINA SCHEFER - LOTE 247 NO PERÍMETRO URBANO.			
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Construção de ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL com a execução dos serviços de: serviços preliminares e administração de obra; Alvenaria; Instalações Elétricas, Revestimentos e demais itens e especificações constantes em projetos.			
Em vinte e um de agosto do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.			
 Ana Tereza Gonçalves Vieira Eng. Eletricista - CREA PR nº 188.644/D RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA			
 Luciano S. Santiago Eng. Civil - CREA PR nº 31.789/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA			
 PAULO HORN PREFEITO MUNICIPAL			
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.			
Sulina, 21 de agosto de 2023			
_____ Gildete Cristina Bonetti Vescovi Arq. Urb. - CAU nº A19081-0 Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA					
PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO					
SUPERVISÃO: PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO					
MUNICÍPIO: SULINA					
		SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
		55451	53	1	22/05/2023
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO					
LUMINARE LED EIRELI		CNPJ/ CPF		Nº CONTRATO:	
		40829540000105		06/2023	
VALOR: R\$ 292.111,25 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****)					
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Iluminação do estádio municipal					
LOCALIZAÇÃO: RUA OTÍLIA CATARINA SCHEFER - LOTE 247 NO PERÍMETRO URBANO.					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Construção de ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL com a execução dos serviços de: serviços preliminares e administração de obra; Alvenaria; Instalações Elétricas, Revestimentos e demais itens e especificações constantes em projetos.					
<p>Em vinte e dois de maio do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório da obra acima referida, executada em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto e na documentação referente ao contrato em epígrafe.</p> <p>Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 90 (noventa) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.</p>					
 Ana Tereza Gonçalves Vieira Eng. Eletricista - CREA PR nº 188.644/D RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA					
 Luciano S. Santiago Eng. Civil - CREA PR nº 31.789/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA					
 PAULO HORN PREFEITO MUNICIPAL					
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.					
Sulina, 22 de maio de 2023					
<hr/> Gildete Cristina Bonetti Vescovi Arq. Urb. - CAU nº A19081-0 Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE					
