

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|------|---|------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 5 | 2025 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO | Contrato 44/2025 | 240 | 07/04/2025 | R\$ 3.332.162,45 | 59,02% |
| Esta intervenção está em andamento | | | | | | | |

Nº5/2025
Data Inicial: 07/04/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E
RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO
URBANO**

R\$ 3.332.162,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000509; 10000510; 10000511; 10000513; 10001128; 10001130; 10001131; 10001725; 10003453; 10003454; 10003455; 10003456; 2170

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4995 | 2025 | 01/07/2025 | 12543 |
| 4996 | 2025 | 01/07/2025 | 12543 |
| 4997 | 2025 | 01/07/2025 | 12543 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12543 | 2015 | 1129 | 01/09/2025 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 28/07/2026 | 44 | Aditivo |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 08*.8*.1**-39 | ART (CREA) | 17**2*1**12** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 10*.0*.5**-14 | ART (CREA) | 17**2*6**56** | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 10*.0*.5**-14 | ART (CREA) | 17**2*6**56** | Orçamento | Sim |
| CPF | 81*.6*.8**-91 | ART (CREA) | 17**2*2**98** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5827 | R\$ 3.332.162,50 | 27/11/2024 | |
| Contrato | 44 | 2025 | 80.869.886/0001-43 | 5826 | R\$ 3.332.162,45 | 18/03/2025 | 59,02% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 5828 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 11/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 44/2025 | 55,53% |
| 5842 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 29/10/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 44/2025 | 55,53% |
| 5850 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 28/11/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 44/2025 | 55,53% |
| 5861 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/12/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 44/2025 | 59,02% |
| 5866 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 30/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 44/2025 | 59,02% |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900234881472 | | | | | |

Nº5/2025
Data Inicial: 07/04/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E
RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO
URBANO**

Documentos

R\$ 3.332.162,45







PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA** MEDICÇÃO Nº: **2**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** DATA DA MEDIÇÃO : **28/10/2025**
 CONVÊNIO : Nº **944/2024** PAM Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **2**
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA** PRAZO DE EXECUÇÃO: **30/11/2025**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41** PRAZO DE VIGÊNCIA: **28/07/2026**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **44/2025** DATA ASSINATURA : **04/04/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.332.162,45** MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **002/2025**
 SAM : Nº **59**
 LOTE : Nº **1**

| ÍTEM | CÓD. | CRONOGRAMA | PREVISTO ETAPA ACUMULADO | | % | VALOR TOTAL (R\$) | ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO | ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR | ETAPA DESTA MEDIÇÃO | |
|-------------------------|------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | % MÊS | (R\$)MÊS | | | | | MEDIDA | CONTRATO |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 11.166,35 | 100,00% | 11.166,35 | 11.166,35 | 11.166,35 | - | |
| 2 | | TERRAPLENAGEM | | - | 38,60% | 12.548,38 | 4.843,90 | - | 4.843,90 | 38,60% |
| 3 | | DRENAGEM | | - | 52,79% | 168.006,64 | 88.689,55 | - | 88.689,55 | 52,79% |
| 4 | | BASE / SUB-BASE | 2,03% | 12.790,81 | 2,03% | 631.120,33 | 12.790,83 | 12.790,83 | - | |
| 5 | | REVESTIMENTO | 39,56% | 885.382,12 | 78,78% | 2.238.080,23 | 1.763.145,97 | 1.763.145,97 | - | |
| 6 | | MEIO-FIO E SARJETA | | - | | 80.953,82 | - | - | - | |
| 7 | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | - | | 35.096,57 | - | - | - | |
| 8 | | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | - | 38,37% | 58.749,91 | 22.542,69 | - | 22.542,69 | 38,37% |
| 9 | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 31,64% | 30.511,29 | 65,69% | 96.440,22 | 63.348,45 | 63.348,45 | - | |
| TOTAL CRONOGRAMA | | | | 939.850,57 | | TOTAL MEDIÇÃO | 1.966.527,74 | OK | Valor desta ETAPA da Medição | |
| | | | | | | | | Acumulado Med. Anterior | | |
| | | | | | | | | 1.850.451,60 | | 116.076,14 |

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$116.076,14

3,48 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 002/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

| META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA | | % META |
|---|---------------------|----------------|
| META ATÉ 2ª ETAPA = | 939.850,56 | |
| REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA = | 1.966.527,74 | 209,24% |
| META FINANCEIRA ATINGIDA | | |

CAROLINA TAVARES
DE


Assinado de forma digital por
CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939

LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:8159

Assinado digitalmente por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=23924010000119,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Razão: Eu sou o autor deste documento

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147,
OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Razão: Eu sou o autor deste documento

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | | | | | | | | | | ESTADO DO PARANÁ | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--|------|-------------------|---|-------------------------|---------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|
|  <p style="text-align: center;">LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021</p> | | | | | | | | | | REGIONAL | Francisco Beltrão (P.A.) | ASSOCIAÇÃO | Amsop | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PARCELA | 2 | DATA | 28/10/2025 - ter | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | SULINA | | | | | | | | | CÓDIGO SAM MUNIC.: | 324 | Mês | Out | CONTRATO EMPREITADA: | | | ORDEN DE SERVIÇO: | | |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | SAM | 59 | Lote | 1 | Nº | 44/2025 | Nº | | | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | PEDREIRA SANTIAGO LTDA | | | | | | | | | CNPJ: | 77.744.134/0001-41 | | | DATA: | 04/04/2025 | DATA | | | |
| MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | ORÇAMENTO | | | | | | | | | |
| Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. LICITADA | % Executada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | | | | | | | |
| GLOBAL - LOTE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 512050 | 550 | SERVICOS PRELIMINARES | m3 | 51,40 | 100,00% | 0,09% | 0,09% | 55,28 | 2.841,40 | 2.841,40 | - | | | | | | | |
| | 00051 | ORSE | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | un | 2,00 | 100,00% | 0,22% | 0,22% | 3.719,40 | 7.438,80 | 7.438,80 | - | | | | | | | |
| | 98526 | SINAPI | Remoção de raízes de árvores, através do corte junto ao meio fio e arrancamento da raiz que invade a pista | un | 5,00 | 100,00% | 0,03% | 0,03% | 177,23 | 886,15 | 886,15 | - | | | | | | | |
| 2 | 401000 | 554 | TERRAPLENAGEM | m3 | 797,87 | 1,19% | 0,19% | 8,10 | 8,10 | - | 6.462,75 | 6.462,75 | | | | | | | |
| | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | m3 | 753,03 | 79,81% | 0,13% | 0,10% | 5,90 | 3.545,90 | 4.442,89 | 896,99 | | | | | | | |
| | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 149,34 | 79,01% | 0,05% | 0,04% | 11,00 | 1.298,00 | 1.642,74 | 344,74 | | | | | | | |
| 3 | 600300 | 589 | DRENAGEM | m3 | 800,50 | 79,83% | 0,26% | 0,21% | 10,75 | 8.669,25 | 8.669,25 | 1.736,13 | | | | | | | |
| | 601200 | DER | Canal de bloqueio c/ pedra 0 x 3/4" | m3 | 612,94 | 79,62% | 0,38% | 0,46% | 31,32 | 15.284,16 | 19.197,28 | 3.913,12 | | | | | | | |
| | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armção - PS-1 | m | 706,00 | 79,75% | 2,27% | 1,81% | 107,00 | 60.241,00 | 75.542,00 | 15.301,00 | | | | | | | |
| | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m | m | 22,00 | 1,43% | 0,02% | 0,02% | 2.168,80 | - | 47.713,60 | 47.713,60 | | | | | | | |
| | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un | 13,00 | 0,32% | 0,02% | 0,02% | 819,48 | - | 10.633,24 | 10.633,24 | | | | | | | |
| | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | un | 3,00 | 100,00% | 0,19% | 0,19% | 2.098,38 | - | 6.295,14 | 6.295,14 | | | | | | | |
| 4 | 532100 | 556 | BASE / SUB-BASE | m3 | 244,49 | 1,27% | 0,12% | 173,08 | 173,08 | - | 42.316,32 | 42.316,32 | | | | | | | |
| | 511100A | DER/PRC | Regularização compact-subleito 100% FM | m2 | 8.278,11 | 1,55% | 1,23% | 0,02% | 4,95 | 636,08 | 40.976,65 | 40.340,57 | | | | | | | |
| | 531000A | DER/PRC | Brita Graduada | m3 | 696,70 | 1,84% | 6,45% | 0,12% | 308,62 | 3.965,77 | 215.015,56 | 211.049,79 | | | | | | | |
| | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 1.305,81 | 2,46% | 9,99% | 0,25% | 254,87 | 8.188,98 | 332.811,80 | 324.622,82 | | | | | | | |
| 5 | PAV-089 | 551 | REVESTIMENTO | m2 | 22.874,09 | 100,00% | 0,58% | 0,58% | 0,84 | 19.214,24 | 19.214,24 | - | | | | | | | |
| | 560100B | DER/PRC | Limpeza e Lavagem da pista (Recap) | m2 | 5.827,23 | 2,21% | 0,11% | 0,11% | 0,61 | 78,39 | 3.554,62 | 3.476,23 | | | | | | | |
| | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAL - imprimação | ton | 6,42 | 2,18% | 0,86% | 0,02% | 4.454,58 | 623,64 | 28.598,40 | 27.974,76 | | | | | | | |
| | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 38.831,72 | 85,32% | 0,49% | 0,42% | 0,42 | 13.915,85 | 16.309,31 | 2.393,46 | | | | | | | |
| | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 19,41 | 85,32% | 2,45% | 2,09% | 4.213,55 | 69.776,40 | 81.785,01 | 12.008,61 | | | | | | | |
| | 570140 | DER | CBUIO - REMENDO (MANUAL) | ton | 15,97 | 100,00% | 0,20% | 0,20% | 415,05 | 6.628,35 | 6.628,35 | - | | | | | | | |
| | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUIQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0,80 | 100,00% | 0,13% | 0,13% | 5.439,24 | 4.351,59 | 4.351,59 | - | | | | | | | |
| | 570000A | DER/PRC | CBUIQ - Novo traço - Reperflamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 538,15 | 98,56% | 4,73% | 4,66% | 292,71 | 155.253,38 | 157.521,88 | 2.268,50 | | | | | | | |
| | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUIQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 27,98 | 98,57% | 4,57% | 4,50% | 5.439,24 | 150.014,24 | 152.189,93 | 2.175,69 | | | | | | | |
| | 570000F | DER/PRC | CBUIQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 3.071,70 | 75,98% | 26,98% | 20,50% | 292,71 | 683.129,52 | 899.117,30 | 215.987,78 | | | | | | | |
| | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUIQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 159,73 | 75,98% | 26,07% | 19,81% | 5.439,24 | 660.160,57 | 868.809,80 | 208.649,23 | | | | | | | |
| 6 | 810200 | 557 | MEIO-FIO E SARJETÁ | m | 1.413,30 | 2,43% | 0,23% | 57,28 | 57,28 | - | 80.953,82 | 80.953,82 | | | | | | | |
| | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de bazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 953,97 | 1,05% | 0,05% | 36,79 | 36,79 | - | 35.096,57 | 35.096,57 | | | | | | | |
| 8 | 822000 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | m2 | 1.389,23 | 45,80% | 1,48% | 0,68% | 35,43 | 22.542,69 | 49.220,41 | 26.677,72 | | | | | | | |
| | 820000F | DER/PRC | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,094 m2/m2) | un | 12,00 | 0,23% | 0,23% | 632,69 | 632,69 | - | 7.592,28 | 7.592,28 | | | | | | | |
| | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 3,00 | 0,06% | 0,06% | 645,74 | 645,74 | - | 1.937,22 | 1.937,22 | | | | | | | |
| 9 | 09.02.11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | un | 10,00 | 0,06% | 0,06% | 190,23 | 190,23 | - | 1.902,30 | 1.902,30 | | | | | | | |
| | 09.02.11B | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | un | 13,00 | 23,08% | 0,07% | 0,02% | 190,23 | 570,69 | 2.472,99 | 1.902,30 | | | | | | | |
| | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 13,00 | 23,08% | 0,07% | 0,02% | 190,23 | 570,69 | 2.472,99 | 1.902,30 | | | | | | | |
| | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 75,00 | 73,33% | 0,44% | 0,32% | 196,14 | 10.787,70 | 14.710,50 | 3.922,80 | | | | | | | |
| | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 75,00 | 73,33% | 0,31% | 0,23% | 138,87 | 7.637,85 | 10.415,25 | 2.777,40 | | | | | | | |
| | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 65,00 | 84,62% | 0,45% | 0,38% | 232,96 | 12.812,80 | 15.142,40 | 2.329,60 | | | | | | | |
| | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 65,00 | 84,62% | 0,35% | 0,30% | 178,57 | 9.821,35 | 11.607,05 | 1.785,70 | | | | | | | |
| | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 65,00 | 84,62% | 0,12% | 0,10% | 63,82 | 3.510,10 | 4.148,30 | 638,20 | | | | | | | |
| | 09.04.03 | DAER | Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas | un | 47,00 | 78,72% | 0,19% | 0,15% | 131,38 | 4.861,06 | 6.174,86 | 1.313,80 | | | | | | | |
| | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda relativa | un | 47,00 | 78,72% | 0,18% | 0,14% | 129,73 | 4.800,01 | 6.097,31 | 1.297,30 | | | | | | | |
| | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da caoa asfáltica. | gb | 2,00 | 50,00% | 0,48% | 0,24% | 7.976,17 | 7.976,20 | 15.952,36 | 7.976,16 | | | | | | | |
| | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | un | 13,00 | 0,16% | 0,16% | 411,07 | 411,07 | - | 5.343,91 | 5.343,91 | | | | | | | |
| TOTAL GLOBAL - LOTE 1: | | | | | | | | | | % PREVISTO: | 28,21% | % EXECUTADO: | 59,02% | SOMAS | 1.966.527,74 | 3.332.162,45 | 1.365.634,71 | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | Valor Total do Contrato: | | R\$3.332.162,45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Medição Acumulada: | | 1.966.527,74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Anterior: | | 1.850.451,60 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Valor e % executado desta Medição: | | R\$116.076,14 | | 3,48 % | | | | | |
| RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAROLINA TAVARES DE ARAUJO:0834821893 9 | | | Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE ARAUJO:0834821893 Dados: 2025.11.10 09:07:43 -03'00' | | | LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:8159618 9991 | | | Assinado digitalmente por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:8159618 ND-CIBR-C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Luciano Steinemann, O=Luciano Steinemann, C=BRASIL Localização: São Paulo - SP, Brasil Data: 2025.11.11 10:22:10-03'00' Fone: PDF Reader Versão: 2025.2.0 | | | GILBERTO JOAO ROSSI:03160453 901 | | | Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453 ND-CIBR-C=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RECEITA-CPF-A1, OU=EMBRASCO, OU=810475820147, OU=BRASIL Localização: São Paulo - SP, Brasil Data: 2025.11.11 10:22:30-03'00' Fone: PDF Reader Versão: 2025.2.0 | | | | |
| PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAUJO CREA PR 203.527/D | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO ENGº CIVIL - CREA PR-31.879/D | | | PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA GILBERTO JOAO ROSSI | | | | | | | | | | | | | |

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Município: | Sulina |
| Projeto/Lote/Medção: | 59 / 1 / 2 |
| Programa: | PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
| Contratada: | PEDREIRA SANTIAGO LTDA |
| Contrato Nº: | 44/2025 |
| Data da Vistoria: | 28/10/2025 |

Objeto:

Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 27.818,69 m², sendo 23.461,91 m² de recape e 4.356,78 m² de implantação, incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base/sub-base; revestimento; meio fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização da trânsito; ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 11/07/2025 até 28/10/2025.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA



1 | QR CODE DA PLACA



2 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



3 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



4 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



5 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



6 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



7 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



8 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



9 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



10 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



11 | RUA 04 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



12 | RUA 03 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



13 | RUA 03 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



14 | RUA COMENDADOR ARAÚJO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



15 | RUA ANTÔNIO DIONISIO REICHART, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



16 | RUA ANTÔNIO DIONISIO REICHART, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO




17 | RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



18 | RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



19 | RUA SANTOS DUMONT, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO

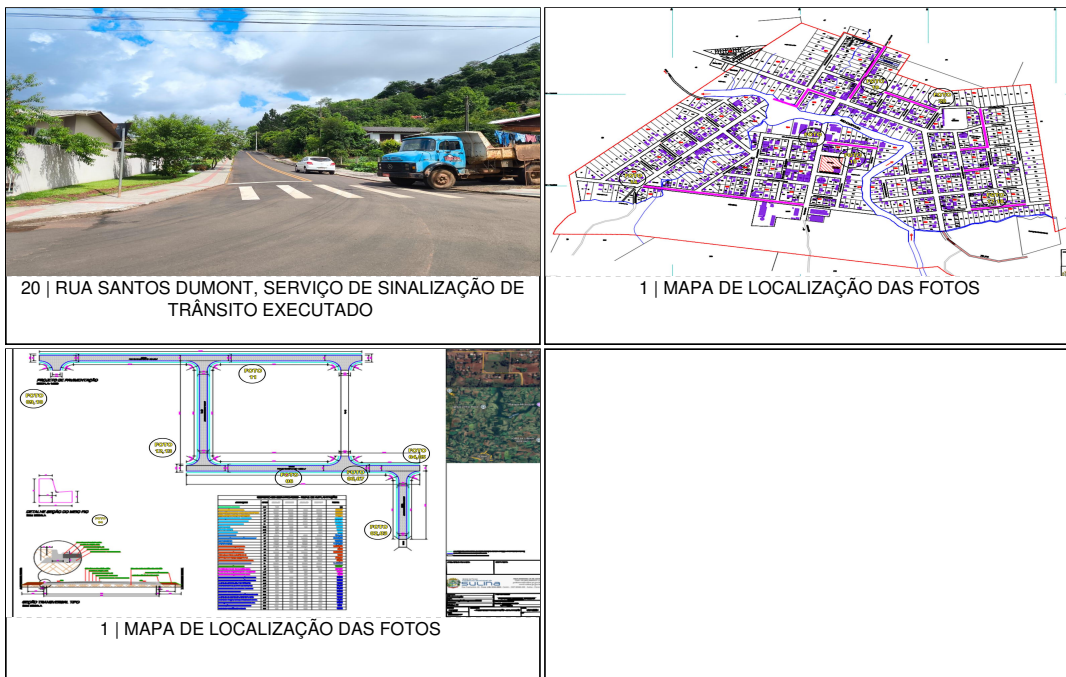

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/17199/lote/21274/medicao/16740/relatorio-fotografico/6268>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 07 de novembro de 2025.

Luciano Steinemann Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR31879-D



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (07/11/2025 08:40:48)

Nome/controlado do arquivo:
2025110708404817.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controlado=2025110708404817>








































































Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

| TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA | |
|---|--------------------------------|
| MUNICÍPIO: SULINA – PR. | |
| SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO | |
| EMPRESA CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA | |
| VALOR REAL: R\$ 3.332.162,45 | CONTRATO Nº: 44/2025 |
| SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) execução das obras “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 27.818,69 M ² , SENDO 23.461,91 M ² DE RECAPE E 4.356,78 M ² DE IMPLANTAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; DRENAGEM; BASE/SUB-BASE; REVESTIMENTO; MEIO FIOE SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. TRECHOS: AVENIDA IGUAÇU, RUA ANTÔNIO REICHART, RUA DAS AMÉRICAS, RUA GERALDO MEIRELES, RUA SALDANHA VARGAS, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, RUA SANTOS DUMONT, RUA COMENDADOR ARAÚJO, RUA CASTELO BRANCO, RUAS 01 á 04 do distrito de SEDE OURO, descrição dos trechos conforme o contrato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. ° 02/2025. | |
| OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: Obra aguardando próxima medição | |
| Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo medição. | |
|  GILBERTO JOÃO ROSSI Prefeito Municipal | |
