

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	EXECUÇÃO DE TERRAÇOS E READEQUAÇÃO ESTRADA RURAL SANTA HELENA Esta intervenção está paralisada	Contrato 3/2025	150	15/05/2025	R\$ 354.515,35	68,90%

Nº4/2025
Data Inicial: 15/05/2025

EXECUÇÃO DE TERRAÇOS E READEQUAÇÃO ESTRADA RURAL SANTA HELENA

R\$ 354.515,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30372

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3176	2025	17/06/2025	12249
4455	2025	14/08/2025	12249
5666	2025	15/10/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4061	01/08/2025
12249	1030	4061	01/08/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/05/2026	3/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*4**10**	Orçamento	Sim
CPF	08*.4*.3**-93	RRT (CAU)	20**0*0**84	Fiscalização	Sim
CPF	11*.0*.1**-23	ART (CREA)	17**2*2**89**	Execução de Obra	Sim
CPF	53*.3*.9**-53	ART (CREA)	17**2*4**66**	Projeto Arquitetônico	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001370	R\$ 440.662,82	16/09/2024	
Contrato	3	2025	76.995.414/0001-60	9001371	R\$ 354.515,35	19/12/2024	68,90%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001372	Medição	1	Jurisdicionado	12/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2025	23,85%
9001382	Medição	2	Jurisdicionado	22/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2025	68,90%
9001382	Medição	3	Jurisdicionado	22/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2025	68,90%
9001382	Medição	4	Jurisdicionado	23/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2025	68,90%
9001397	Paralisação	5	Jurisdicionado	30/12/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900241520776					

Nº4/2025
Data Inicial: 15/05/2025

EXECUÇÃO DE TERRAÇOS E READEQUAÇÃO ESTRADA RURAL SANTA HELENA

Documentos

R\$ 354.515,35

**Ofício 28- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/09/2025 às 16:45:16

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Segue.

—

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

ADEQUACAO_PLE.pdf

Município de Chopinzinho'


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4105409/2023	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA	NOME DA EMPRESA MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	Nº CTEF 03/2025
-----------------------------	----------------------	--	--	---	--------------------

 Medição: **1** Período: **15/05/2025 a 11/07/2025** % Realizado Período.: **43,41%** % Realizado Acum.: **43,41%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA NA COMUNIDADE		1		1		1																			

SERVÍCIOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ESTACA 1+9,584 0 A 25																									
ESTACA 25 A 50 (500,0m.)																									
ESTACA 50 A 75 (500,0m.)																									
ESTACA 75 A 100 (500,0m.)																									
ESTACA 100 A 125 (500,0m.)																									
ESTACA 125 A 150 (500m.)																									
ESTACA 150 A 175.+14,09																									
sds																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Medições	Data das Medições											
	11/07/2025											
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	43,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	84.561,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%	43,41%
R\$	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30	84.561,30

Chopinzinho

Local

sexta-feira, 11 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ricardo Scandolara

Profissão: Técnico Agrícola em Agropecuária

CREA/CAU: 08164537993

ART/RRT: BR20250701784



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 5A09-00BC-A62B-57D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 02/09/2025 16:45:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5A09-00BC-A62B-57D3>



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	Nº OPERAÇÃO 4105409/2023	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA EXECUÇÃO DE TST	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho	REPASSE 165.593,11	CONTRAPARTIDA 29.222,32	INVESTIMENTO 194.815,43	Nº RRE 1	

MENU


Situação do TC/CR:
Atrasada

Percentual previsto em:
ago-25 100,00%

Saldo a
Reprogramar
Repasse (R\$)
-

Contrapartida (R\$)
-

Para Metas preenchidas manua
valor medido nas colunas à dir

Valores Medidos (R\$)

Lista C

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL (3.484	Em Análise	24000	m²	03/2025	1	194.815,43	-	84.561,30	84.561,30	43,41%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(43,41%)	(43,41%)	
					Repasse		165.593,11	-	71.877,10	71.877,10	
					Contrapartida		29.222,32	-	12.684,20	12.684,20	43,41%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		194.815,43	-	84.561,30	84.561,30	

Chopinzinho

Local

Representante Tomador

Nome: Álvaro Dênis Ceni Scolaro

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 12 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ricardo Scandolara

Profissão: Técnico Agrícola em Agropecuária

CREA/CAU: 08164537993

ART/RRT: BR20250701784

Responsável Financeiro

Nome: Juliana Dias de Castro

Cargo: Gestora do Contrato

**Ofício 27- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2025 às 11:58:30

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Bom dia. Conforme solicitação via telefone do Senhor [Rodrigo Scussel - SMF-C-CNV](#), segue referente ao despacho 16- 673/2025, **Relatório de medição** com as devidas correções solicitadas.

Atenciosamente,

—

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

RELATORIO_DE_MEDICAO_1_READEQUACAO_corrigido.pdf



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO READEQUAÇÃO ESTRADA SANTA HELENA

PRIMEIRA MEDIÇÃO

REFERÊNCIA	
PROGRAMA	ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA EXECUÇÃO DE TST
CONTRATADA	MATINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 20.838.016/0001-85
CONTRATO N°	Lote 01 do contrato 03/2025
OBJETO	Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra Readequação de Estrada, Pavimentação em TST e Construção de Terraços, no município de Chopinzinho, Paraná.

- Considerando a ordem de serviço para início dos trabalhos (REF.: Ofício 673/2025 [OS_009_2025_TST_adequacao.pdf](#));
- Considerando os eventos climáticos ocorridos desde o início da execução dos serviços, que não proporcionaram condições adequadas à execução em dados períodos de tempo;
- Considerando o andamento dos serviços e as necessidades que surgiram além do previsto no projeto e memorial descritivo com relação aos sistemas de drenagem das águas pluviais que eram compromisso do Município de Chopinzinho:
- **Seguem fotos das etapas previstas já concluídas.**



Procópio Kurpel, 3811 - São Miguel, Chopinzinho - PR, 85560-000, Brasil
(Imagem da placa do convênio instalada no Paço Municipal)



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagem da placa da obra)



(Imagem da placa da obra à margem da estrada readequada)



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

ETAPA 3
(Estaca 25 a 50 – 500 m)



(Imagens do início do trecho. Detalhe da medição do desnível do leito = média de 04%. Largura = 8m.)



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da altura de elevação do leito. Imagem à direita: detalhe da área adjacente.)

Página 3 de 7





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da porção medial e final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito na porção medial. Imagem à direita: detalhe da superfície e largura do leito ao final do trecho.)

ETAPA 5

(Estaca 75 a 100 – 500 m)



(Imagens do início do trecho. Detalhe da superfície do leito, proporção da largura e a presença de lavouras nas áreas adjacentes)

Página 4 de 7






MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito. Imagem à direita: detalhe da lateral do leito.)

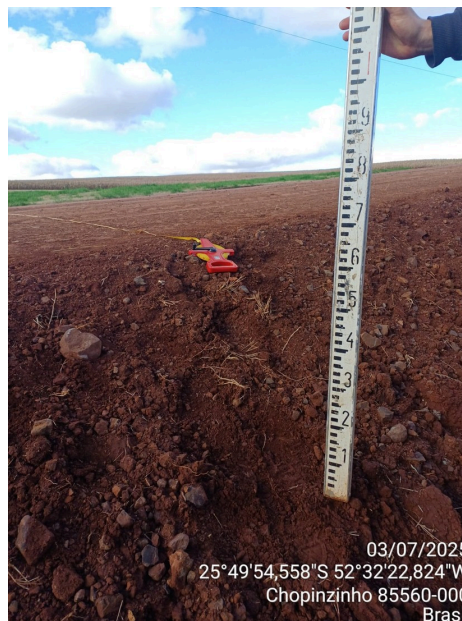

(Imagens da porção final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito e largura = 08 m. Imagem à direita: detalhe da altura de elevação do leito.)



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

ETAPA 7

(Estaca 125 a 150 – 500 m)



(Imagens do início do trecho e porção medial. Imagem à esquerda: Detalhe da superfície do leito e da área de lavoura adjacente. Imagem à direita: detalhe da superfície do leito na porção medial do trecho.



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da lateral e superfície do leito em entrada de curva. Imagem à direita: detalhe da superfície do leito em saída de curva.)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da porção final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da medição da inclinação e largura do leito. Imagem à direita: detalhe da altura de elevação do leito.)

RICARDO SCANDOLARA
Técnico Agrícola – CFTA 08164537993
Fiscal do Contrato 03/2025 – TRT N°: BR20250701784

Chopinzinho, 29 de Agosto de 2025.

Página 7 de 7





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 215D-5446-B634-191A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 29/08/2025 12:00:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/215D-5446-B634-191A>

**Ofício 37- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/09/2025 às 16:33:24

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Segue para os devidos fins, PLE da segunda medição (final) do Lote 01 do Contrato Administrativo 03/2025, para a apreciação pela gestão, para posteriores trâmites.

—

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

ADEQUACAO_PLE_2.pdf




PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4105409/2023	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA	NOME DA EMPRESA MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	Nº CTEF 03/2025
------------------------------------	-----------------------------	---	---	--	---------------------------

MENU

 Medição: **2** Período: **12/07/2025 a 22/09/2025** % Realizado Período.: **56,59%** % Realizado Acum.: **100,00%**

←

→

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA NA COMUNID

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

2	1	2	1	2	1	2																		
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Data das Medições											
		11/7/2025	22/9/2025										
Medições	Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	%	43,41%	56,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	84.561,30	110.254,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	43,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	84.561,30	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43	194.815,43

Chopinzinho

Local

segunda-feira, 22 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ricardo Scandolara**Profissão:** Técnico Agrícola em Agropecuária**CREA/CAU:** 08164537993**ART/RRT:** BR20250701784



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: FE1D-DF67-54BC-15CF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 22/09/2025 16:36:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FE1D-DF67-54BC-15CF>

**Ofício 35- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/09/2025 às 16:25:19

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Prezados, Boa tarde.

Segue para os devidos fins, relatório fotográfico da segunda medição (final) do Lote 01 do Contrato Administrativo 03/2025, para a apreciação pela gestão, para posteriores trâmites.

Atenciosamente,

—

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

RELATORIO_DE_MEDICAO_2_READEQUACAO.pdf



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO READEQUAÇÃO ESTRADA SANTA HELENA

SEGUNDA MEDIÇÃO (final)

REFERÊNCIA PROGRAMA	ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA EXECUÇÃO DE TST
CONTRATADA	MATINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 20.838.016/0001-85
CONTRATO Nº	Lote 01 do contrato 03/2025
OBJETO	Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra Readequação de Estrada, Pavimentação em TST e Construção de Terraços, no município de Chopinzinho, Paraná.

- Considerando a ordem de serviço para início dos trabalhos (REF.: Ofício 673/2025 [OS_009_2025_TST_adequacao.pdf](#));
- Considerando os eventos climáticos ocorridos desde o início da execução dos serviços, que não proporcionaram condições adequadas à execução em dados períodos de tempo;
- Considerando o andamento dos serviços e as necessidades que surgiram além do previsto no projeto e memorial descritivo com relação aos sistemas de drenagem das águas pluviais que eram compromisso do Município de Chopinzinho, acabando por ainda estarem sendo executados após a evolução dos serviços da readequação e considerando a primeira medição enviada:
- **Seguem fotos das etapas restantes já concluídas.**



Procópio Kurpel, 3811 - São Miguel, Chopinzinho - PR, 85560-000, Brasil

(Imagem da placa do convênio instalada no Paço Municipal)

Página 1 de 9





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagem da placa da obra)



(Imagem da placa da obra à margem da estrada readequada)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

ETAPA 2
(Estaca 1+9,584m a 25 – 470,42 m)



(Imagens do início do trecho. Detalhe para camada de aderência que o município teve que aplicar e presença de tubos de concreto para o sistema de drenagem posterior à readequação.)



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: altura de elevação do leito. Imagem à direita: ao fundo da imagem detalhe da presença de construções ao limite da margem de readequação.)



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da porção final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito em entrada de curva. Imagem à direita: detalhe da superfície e largura do leito em saída de curva.)

ETAPA 4 (Estaca 50 a 75 – 500 m)



(Imagens do início do trecho. À esquerda: detalhe da superfície do leito. À direita: detalhe da presença dos terraços nas áreas adjacentes.)

Página 4 de 9





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito em entrada de curva. Imagem à direita: detalhe da presença de terraços nas áreas adjacentes.)



(Imagens da porção final do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da superfície do leito. Imagem à direita: detalhe da altura de elevação do leito em relação à área adjacente terraceada.)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

ETAPA 6
(Estaca 100 a 125 – 500 m)



(Imagens do início do trecho. Imagem à esquerda: Detalhe do leito no início do trecho em entrada de curva. Imagem à direita: detalhe da proporção do leito readequado.)



(Imagens da porção medial do trecho. Imagem à esquerda: detalhe da passagem sobre boeiro e encaixe com estrada à montante. Imagem à direita: detalhe da superfície do leito.)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



08/08/2025
25°49'42"S 52°32'28"W
Estrada Sem Nome - Chopinzinho, PR, 85560-000, Brasil

(Imagem da porção final do trecho. Detalhe da superfície e proporção do leito e ao fundo da imagem, detalhe para encaixe com outra estrada à direita.)

ETAPA 8

(Estaca 150 a 175 + 14,09m – 514,09 m)



08/08/2025
25°49'30"S 52°32'41"W

(Imagem do início do trecho. Detalhe início do trecho com entrada de curva e início de serra. Ao fundo da imagem detalhe para as moradias adjacentes à estrada.

Página 7 de 9





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagem da porção medial do trecho. Sequência da imagem anterior e início da porção de maior acíve do trecho. Detalhe na porção central do leito para o revestimento com cascalho para tráfego.)



(Imagem da porção final do trecho. Detalhe da superfície do leito e, da presença e encaixe dos terraços ao fundo da imagem.)

Página 8 de 9





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

CONSIDERAÇÕES:

- Dado o acompanhamento “in loco” da execução dos serviços e o “RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 1 READEQUAÇÃO corrigido”, datado de 29 de Agosto de 2025 anexo ao despacho “27- 673/2025 do **Ofício 673/2025** “Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços” da Plataforma 1Doc e, levando em conta a evolução dos serviços, apresentando-se o presente relatório (**SEGUNDA MEDIÇÃO (final)**), **considera-se** por **encerrada** a OBRA referente ao “**Lote 01 (ADEQUAÇÃO DE ESTRADA – COMUNIDADE DE SANTA HELENA) do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2025**”, enquanto aguarda-se aprovação.

RICARDO SCANDOLARA
Técnico Agrícola – CFTA 08164537993
Fiscal do Contrato 03/2025 – TRT N°: BR20250701784

Chopinzinho, 22 de Setembro de 2025.

Página 9 de 9





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 3227-73A8-F043-F938

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 22/09/2025 16:26:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3227-73A8-F043-F938>

**Ofício 38- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/09/2025 às 16:39:38

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Considerando os 3 últimos despachos, segue RRE, para as devidas assinaturas e demais encaminhamentos.

Atenciosamente,

–

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

ADEQUACAO_RRE_2.pdf



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	Nº OPERAÇÃO 4105409/2023	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA EXECUÇÃO DE TST	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho	REPASSE 165.593,11	CONTRAPARTIDA 29.222,32	INVESTIMENTO 194.815,43	Nº RRE 2	

MENU

Situação do TC/CR:
NormalPercentual previsto em:
set-25 100,00%Saldo a
ReprogramarRepasse (R\$)
-Contrapartida (R\$)
-Para Metas preenchidas manua
valor medido nas colunas à dir

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL (3.48)	Em Análise	24000	m²	03/2025	2	194.815,43	84.561,30	110.254,13	194.815,43	100,00%
					(%)		(100,00%)	(43,41%)	(56,59%)	(100,00%)	
					Repasse		165.593,11	71.877,10	93.716,01	165.593,11	
					Contrapartida		29.222,32	12.684,20	16.538,12	29.222,32	100,00%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		194.815,43	84.561,30	110.254,13	194.815,43	

Chopinzinho

Local

segunda-feira, 22 de setembro de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: Álvaro Dênis Ceni Scolaro

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ricardo Scandolara

Profissão: Técnico Agrícola em Agropecuária

CREA/CAU: 08164537993

ART/RRT: BR20250701784

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Juliana Dias de Castro

Cargo: Gestora do Contrato



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F18-6C80-E0F4-E982

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 22/09/2025 16:40:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO (CPF 009.XXX.XXX-40) em 23/09/2025 09:29:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANA DIAS DE CASTRO (CPF 083.XXX.XXX-03) em 24/09/2025 16:43:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2F18-6C80-E0F4-E982>

**Ofício 33- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2025 às 17:27:03

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Considerando os 3 últimos despachos, segue RRE, para as devidas assinaturas e demais encaminhamentos.

Atenciosamente,

–

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

RRE_TERRACOS_1.pdf



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho		Nº OPERAÇÃO 4105409/2023	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO TERRACEAMENTO DE ÁREAS RURAIS AO LONGO DE ESTRADAS ADEQUADAS		MUNICÍPIO / UF Chopinzinho		REPASSE 135.744,94	CONTRAPARTIDA 23.954,98	INVESTIMENTO 159.699,92	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: set-25 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--	--	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	TERRACEAMENTO (22.058,0m.)	Em Análise	22058	m	03/2025	1	159.699,92	-	49.459,07	49.459,07	30,97%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(30,97%)	(30,97%)	
					Repasse		135.744,94	-	42.040,21	42.040,21	
					Contrapartida		23.954,98	-	7.418,86	7.418,86	30,97%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		159.699,92	-	49.459,07	49.459,07	

Chopinzinho

Local

Representante Tomador

Nome: Álvaro Dênis Ceni Scolaro

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 16 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ricardo Scandolara

Profissão: Técnico Agrícola em Agropecuária

CREA/CAU: 08164537993

ART/RRRT: BR20250701784

Responsável Financeiro

Nome: Juliana Dias de Castro

Cargo: Gestora do Contrato



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82C5-D1EC-47B5-F376

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 16/09/2025 17:27:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO (CPF 009.XXX.XXX-40) em 17/09/2025 10:08:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANA DIAS DE CASTRO (CPF 083.XXX.XXX-03) em 17/09/2025 11:38:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/82C5-D1EC-47B5-F376>

**Ofício 32- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2025 às 17:21:34

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Segue para os devidos fins, conforme orientações recebidas do Sr Lucas Kiyoshi Yamazaki - SOU-DE Boletim de Medição da primeira medição do Lote 03 do Contrato Administrativo 03/2025, para a apreciação pela gestão, para posteriores trâmites.

—

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

BOLETIM_DE_MEDICAO_TERRACOS_1.pdf

Município de Chopinzinho'



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho		Nº OPERAÇÃO 4105409/2023	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TERRACEAMENTO DE ÁREAS RURAIS AO LONGO DE ESTRADAS ADEQUADAS	INÍCIO DE OBRA 15/05/25
Nº CTEF 03/2025	EMPRESA EXECUTORA MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	CNPJ 20.838.016/0001-85	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 15/05/2025 a 16/09/2025
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 30,97%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: TERRACEAMENTO DE ÁREAS RURAIS AO LONGO DE ESTRADAS		TOTAL:	-	30,97	30,97	-	49.459,07	49.459,07
1.	TERRACEAMENTO (22.058,0m.)	159.699,92	-	30,97	30,97	-	49.459,07	49.459,07
1.1.	TERRACEAMENTO - COMUNIDADE STA. HELENA	159.699,92	-	30,97	30,97	-	49.459,07	49.459,07
1.1.1.	TERRACEAMENTO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP) -102281	159.699,92	-	30,97	30,97	-	49.459,07	49.459,07

Observações:

Foram possíveis e executados até o momento 6.832m (seis mil oitocentos e trinta e dois metros de terraços, sendo: 1.270m na ÁREA I; 1.560m na ÁREA III; 457m na ÁREA IV; 2.154m na ÁREA V; 540m na ÁREA VI e 851m na ÁREA VII.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Chopinzinho

Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ricardo Scandolara

Profissão: Técnico Agrícola em Agropecuária

CREA/CAU: 08164537993

ART/RRT: BR20250701784



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: B142-CF07-8B0F-252F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 16/09/2025 17:21:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B142-CF07-8B0F-252F>

**Ofício 30- 673/2025**

De: Ricardo S. - SMAPMA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2025 às 17:10:37

Setores envolvidos:

SMAPMA, GAB, SOU-DE, SMAPMA-MA, SMA-PP-ENG3, SMF-C-CNV

Execução de Obra Readequação de Estrada e Construção de Terraços

Prezados, Boa tarde.

Segue para os devidos fins, relatório fotográfico da primeira medição do Lote 03 do Contrato Administrativo 03/2025, para a apreciação pela gestão, para posteriores trâmites.

Atenciosamente,

—

Ricardo Scandolara
Técnico Agrícola

Anexos:

RELATORIO_DE_MEDICAO_1_TERRACOS.pdf



MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS NA READEQUAÇÃO
DE ESTRADA SANTA HELENA**

PRIMEIRA MEDIÇÃO

REFERÊNCIA PROGRAMA	ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS PARA EXECUÇÃO DE TST
CONTRATADA	MATINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 20.838.016/0001-85
CONTRATO Nº	Lote 03 do contrato 03/2025
OBJETO	Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra Readequação de Estrada, Pavimentação em TST e Construção de Terraços, no município de Chopinzinho, Paraná.

- Considerando a ordem de serviço para início dos trabalhos (REF.: Ofício 673/2025 OS_009_2025_TST_adequacao.pdf);

- Considerando os eventos climáticos ocorridos desde o início da execução dos serviços, que não proporcionaram condições adequadas à execução em dados períodos de tempo;

- Considerando o andamento dos serviços, disponibilidade das áreas (individuais de cada agricultor) e a concordância dos agricultores, para construção dos terraços para as áreas definidas no projeto:

- **Seguem fotos da construção dos terraços.**



28/08/2025
22J 347011 7139774
Procópio Kurpel, 3811 - São Miguel, Chopinzinho - PR, 85560-000, Brasil


(Imagem da placa do convênio instalada no Paço Municipal)

Página 1 de 10





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

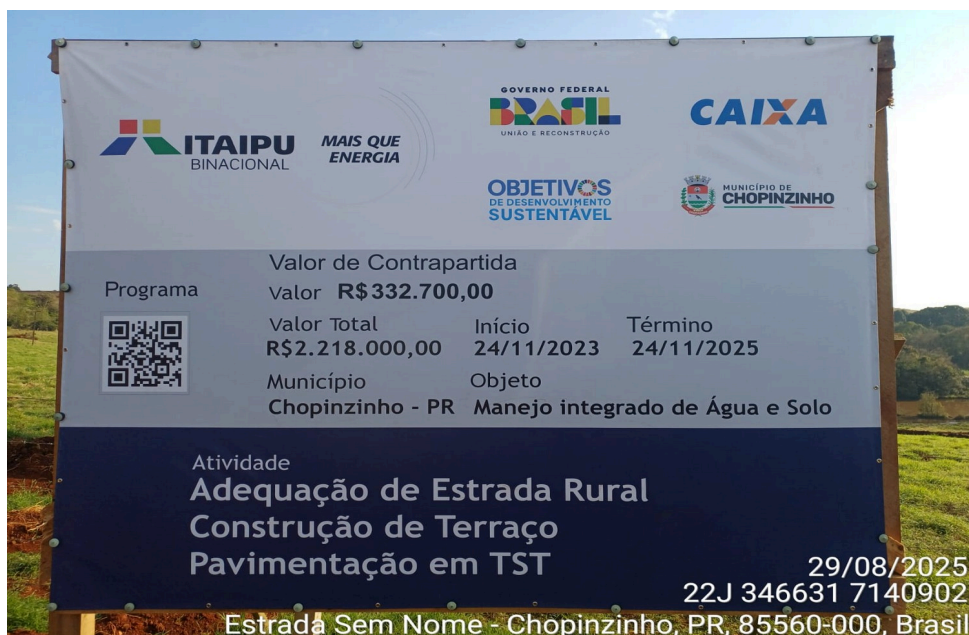

(Imagem da placa da obra)



(Imagem da placa da obra à margem da estrada readequada)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

TERRAÇOS ÁREA I



(Imagens da **ÁREA I**. Terraços construídos em área de pastagem)



(Imagens da **ÁREA I**. Detalhe para o encaixe do terraço em área de lavoura, com a estrada readequada.)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da **ÁREA I**. À esquerda detalhe do encaixe com a estrada. À direita detalhe da medição da altura do canal.



(Imagens da **ÁREA I** e **V**. Detalhe da presença dos terraços nas áreas adjacentes à estrada. À esquerda da imagem **ÁREA V**, à direita **ÁREA I**)

Página 4 de 10





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

TERRAÇOS ÁREA V



(Imagens da **ÁREA V**. Detalhe da presença dos terraços na **ÁREA V**.)



(Imagens da **ÁREA V**. Detalhe do encaixe do terraço com a estrada. Ao fundo da imagem terraço na **ÁREA IV**.)

Página 5 de 10





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

TERRAÇOS ÁREA IV



(Imagens da **ÁREA IV**. Presença de terraços na **ÁREA IV**. Área de lavoura e pastagem.)

TERRAÇOS ÁREA VI



(Imagens da **ÁREA VI**. Presença de terraços na **ÁREA VI**.)

Página 6 de 10





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da **ÁREA VI**. Detalhe ao fundo da imagem da sequência dos terraços na área com maior declividade, mantendo o espaçamento vertical determinado.)

TERRAÇOS ÁREA VII



(Imagens da **ÁREA VII**. Presença de terraços na **ÁREA VII**. Área íngreme e mista de lavoura e pastagem.)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da **ÁREA VII**. Sequência da imagem anterior. Área íngreme e mista de lavoura e pastagem. Detalhe da pastagem em topo de morro ao fundo da imagem, onde foi IMPRATICÁVEL dar sequência nos terraços da imagem anterior em função da declividade do terreno.)

TERRAÇOS ÁREA III



(Imagens da **ÁREA III**. Sequência de terraços em área de lavoura.)





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



(Imagens da ÁREA III. Sequência dos terraços da imagem anterior)

CONSIDERAÇÕES:

- Os terraços foram demarcados aproximadamente nas linhas definidas na imagem do Google Earth®, contida no memorial descritivo do terraçamento, mantendo-se o espaçamento vertical determinado no projeto;
- Dado o acompanhamento “in loco” e respeitando o espaçamento vertical determinado entre terraços, relata-se que em determinadas áreas a quantidade de terraços e as metragens possíveis de serem executadas, em função da declividade do terreno ou de a área em si comportar o total definido, estão contidas no quadro a seguir (Resumo das Metragens Executadas);
- Levando em conta que as áreas definidas no projeto para a execução dos terraços, não necessariamente eram de um mesmo proprietário, mas sendo de dois proprietários na maioria dos casos e, para que a empresa pudesse executar os trabalhos dependia da concordância e aceitação dos proprietários, e que o município de Chopinzinho, entre o interstício da contratação da empresa e início da execução dos serviços pleiteou alterações no projeto inicial com relação à metragem total de terraços a serem executados, segue resumo das metragens que foram “possíveis” e “executadas” até o momento em cada área:





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

RESUMO DAS METRAGENS EXECUTADAS

ÁREA	Nº DE TERRAÇOS (possíveis e executados)	METRAGEM TOTAL (executada)
I	08	1.270 metros
III	05	1.560 metros
IV	03	457 metros
V	09	2.154 metros
VI	08	540 metros
VII	06	851 metros

“Para a ÁREA II, os dois proprietários dos terrenos que perfazem a área definida para a execução, não concordaram e não aceitaram executar os terraços”.

“Para a ÁREA III, um dos proprietários dos terrenos que perfazem a área definida, não permitiu a continuidade dos trabalhos em seu terreno, acabando por ter apenas um terraço executado em sua área.

“Para a ÁREA VII, a declividade do terreno não permitiu alocar mais terraços projetados e dar sequência na metragem.

RICARDO SCANDOLARA
Técnico Agrícola – CFTA 08164537993
Fiscal do Contrato 03/2025 – TRT N°: BR20250701784

Chopinzinho, 16 de Setembro de 2025.

Página 10 de 10





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 2D68-44D2-B33E-DA08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 16/09/2025 17:11:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2D68-44D2-B33E-DA08>
