

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - PR 158 a Comunidade de Ponte Alta Esta intervenção foi concluída	Contrato 202/2020	365	17/07/2020	R\$ 783.168,50	100,00%

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - PR 158 a Comunidade de Ponte Alta

R\$ 783.168,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39210

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3547	2020	17/07/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	17/07/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/12/2023	202/2020	Contrato

Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	06.*3*.2**-90	ART (CREA)	17**2*2**89**	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**85**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**85**	Orçamento	Sim
CPF	07.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**94**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000746	R\$ 900.633,00	25/04/2019	
Contrato	202	2020	76.995.414/0001-60	9000747	R\$ 783.168,50	22/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000755	Medição	1	Jurisdicionado	27/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	3,90%

9000772	Medição	2	Jurisdicionado	10/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	7,63%
9000795	Medição	3	Jurisdicionado	08/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	14,89%
9000810	Medição	4	Jurisdicionado	06/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	18,56%
9000810	Medição	5	Jurisdicionado	05/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	18,56%
9000854	Medição	6	Jurisdicionado	17/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	23,06%
9000854	Medição	7	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	23,06%
9000875	Medição	8	Jurisdicionado	23/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	25,89%
9000875	Medição	9	Jurisdicionado	10/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	25,89%
9000875	Medição	10	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	25,89%
9000914	Medição	11	Jurisdicionado	04/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	31,27%
9000925	Medição	12	Jurisdicionado	08/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	35,55%
9000936	Medição	13	Jurisdicionado	23/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	40,34%
9000936	Medição	14	Jurisdicionado	10/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	40,34%
9000960	Medição	15	Jurisdicionado	28/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	44,96%
9000960	Medição	16	Jurisdicionado	15/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	44,96%
9000960	Medição	17	Jurisdicionado	15/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	44,96%
9000979	Medição	18	Jurisdicionado	23/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	49,26%
9000979	Medição	19	Jurisdicionado	12/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	49,26%
9000996	Medição	20	Jurisdicionado	02/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	53,22%
9001006	Medição	21	Jurisdicionado	25/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	57,21%
9001006	Medição	22	Jurisdicionado	15/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	57,21%
9001024	Medição	23	Jurisdicionado	26/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	60,22%
9001024	Medição	24	Jurisdicionado	22/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	60,22%
9001044	Paralisação	25	Jurisdicionado	15/07/2022			
9001068	Medição	26	Jurisdicionado	22/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 202/2020	100,00%
9001081	Conclusão	27	Jurisdicionado	03/10/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900038706079					

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - PR 158 a Comunidade de Ponte Alta

Documentos

R\$ 783.168,50



10 de julho de 2020
S 25° 51' 37", W 52° 31' 28"



10 de julho de 2020
S 25° 51' 37", W 52° 31' 28"



27 de julho de 2020
S 25° 55' 1", W 52° 28' 26"







7 de agosto de 2020
S 25° 54' 25", W 52° 29' 21"



7 de agosto de 2020
S 25° 54' 25", W 52° 29' 26"



7 de agosto de 2020
S 25° 54' 24", W 52° 29' 28"



7 de agosto de 2020
S 25° 54' 24", W 52° 29' 28"



7 de agosto de 2020
S 25° 54' 24", W 52° 29' 28"
































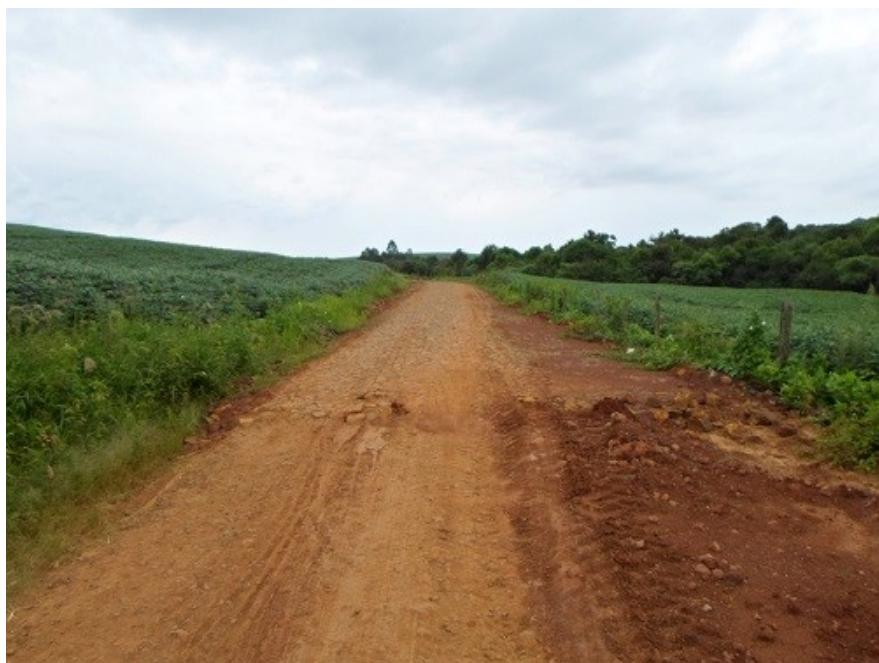





2021/02/22













2021/05/04















































02/02/2022





20/02/2022



02/02/2022





21 de mar. de 2022 08:41:31



- 21 de mar. de 2022 08:42:42



21 de mar. de 2022 08:44:01



21 de mar. de 2022 08:46:59







