

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS SENDO 10.200 M2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 55/2020	180	18/06/2020	R\$ 392.882,36	100,00%



# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24294

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1253	2020	01/06/2020	12217
1254	2020	01/06/2020	12217
565	2021	01/03/2021	12217

#### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	960	01/06/2020

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*6**68**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*6**68**	Fiscalização	Sim
CPF	89*.*0*.0**-34	ART (CREA)	17**2*2**57**	Execução de Obra	Sim


# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9284	R\$ 393.706,03	10/03/2020	
Contrato	55	2020	80.874.100/0001-86	9285	R\$ 392.882,36	13/03/2020	100,00%

# Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9286	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	5,56%
9288	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	9,00%
9303	Medição	3	Jurisdicionado	25/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	22,05%
9312	Medição	4	Jurisdicionado	22/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	25,90%

9321	Medição	5	Jurisdicionado	29/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	31,39%
9328	Medição	6	Jurisdicionado	30/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	36,89%
9340	Medição	7	Jurisdicionado	17/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	46,23%
9349	Medição	8	Jurisdicionado	28/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	50,00%
9354	Medição	9	Jurisdicionado	18/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	52,28%
9375	Medição	10	Jurisdicionado	16/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	59,97%
9382	Medição	11	Jurisdicionado	26/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	63,82%
9391	Medição	12	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	83,05%
9417	Medição	13	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	90,75%
9428	Medição	14	Jurisdicionado	29/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	100,00%
9429	Conclusão	15	Jurisdicionado	29/07/2021			



36.706,54

21.592,08

2.066,11 3.243,60 3.774,00 23.588,93 1.008,58 540,60

1.461,60 1.215,36 1.908,00 2.220,00 13.875,84 593,28 318,00

17/12/2020

30/11/2020


MEDIÇÕES - CONTRATO N° 055/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - CONTRATO Nº 055/2020

ÁREA: 10.200,00m², com 1.700 metros e 6,0 metros de largura

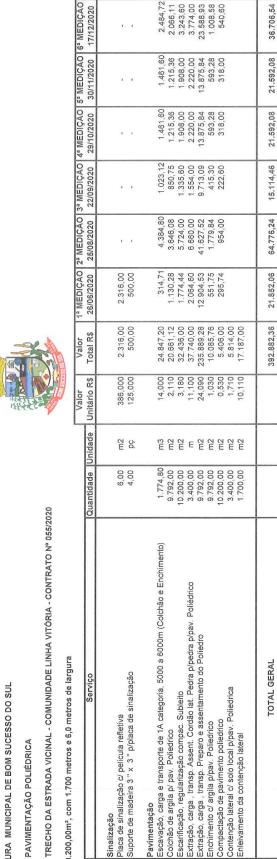

Pavimentação

416010 532600 535200 535200 521450 532650 532650 532700 575100 800000

Sinalização

820000 821000

181.633,45 88

VALOR ACUMALADO DAS MEDIÇÕES

SALDO A PAGAR

211.248,91 RS

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS UBBANOS ENGS. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

#### TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE LINHA VITÓRIA — 2º TRECHO, que está sendo executada em trecho de estrada vicinal, conforme Contrato nº 55/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 50,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de janeiro de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira Engenheiro Civil CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES - CONTRATO Nº 055/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - CONTRATO Nº 055/2020

ÁREA: 10.200,00m², com 1.700 metros e 6,0 metros de largura

AKEA	AKEA: 10.200.00MF. COM 1.700 Metros e 6,0 Metros de largura								the second secon	
				Valor	Valor	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	1º MEDIÇÃO 2º MEDIÇÃO 3º MEDIÇÃO 4º MEDIÇÃO 5º MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO
Código	Serviço	Quantidade Unidade	Unidade	Unitário R\$	Total R\$	26/06/2020	25/08/2020	22/09/2020	29/10/2020	30/11/2020
820000 821000	Sinalização 820000 Placa de sinalização c/ pelicula refletiva 821000 Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	6,00	m bç	386,000	2.316,00	2.316,00	1 1	1 1	1 1	1 1
416010 532600 500000 535200 521450 532650 532700 575100 800000	Pavimentação 416010 Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento) 522600 Colchão de argila p/ pav. Poliedrico 532600 Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico 532650 Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro 532650 Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico 532650 Compactação de pavimento poliedrico 532700 Compactação de pavimento poliedrico 575100 Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica 800000 Enleivamento da contenção lateral	1.774,80 9.792,00 10.200,00 3.400,00 9.792,00 10.200,00 3.400,00 1.700,00	2222222222	14,000 2,110 3,180 11,100 24,090 1,030 0,530 1,710	24.847,20 20.661,12 32.450,00 37.740,00 235.889,28 10.085,76 5.406,00 5.814,00	314,71 1.130,28 1.774,44 2.064,60 12.904,53 551,75 295,74	4.384,80 3.646,08 5.724,00 6.660,00 41.627,52 1.779,84 954,00	1.023,12 860,75 1.335,60 1.554,00 9.713,09 415,30	1.461,60 1.215,36 1.900,00 2.220,00 13.875,84 593,28 318,00	1,461,60 1,215,36 1,908,00 2,220,00 13,875,84 593,28 318,00
	TOTAL GERAL				392.882,36	21.852,06	64.776,24	15.114,46	21.592,08	21.592,08

VALOR ACUMALADO DAS MEDIÇÕES

SALDO A PAGAR

R\$ 66.581,97

326.300,39

R\$

5,50

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sui

Fábio Júnior de Oliveira DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENGS. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

5.115,60 4.253,76 6.678,00 7.770,00 48,565,44 2.076,48 1.113,00

1.023,12 850,75 1.335,60 1.554,00 9.713,09 415,30 222,60

2.046,24 1.701,50 2.671,20 3.108,00 19,426,18 830,59 445,20

1.607,76 1.336,90 2.098,80 2.442,00 15.263,42 652,61 349,80

2.484,72 2.066,11 3.243,60 3.774,00 23.588,93 1.008,58 540,60

75.572,28

15.114,46

30.228,91

23.751,29

36.706,54

6ª MEDIÇAO | 7ª MEDIÇAO | 8ª MEDIÇAO | 9ª MEDIÇAO | 10ª MEDIÇAO | 18/02/2021 | 16/03/2021 | 26/04/2021 | 31/05/2021

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul Fábio Júnior de Oliveira ORETOR DEPTO. DE OBRAS E SENYGOS URANOS ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

MEDIÇÕES - CONTRATO Nº 055/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - CONTRATO Nº 055/2020

ÁREA: 10.200,00m², com 1.700 metros e 6,0 metros de largura

				Valor	Valor	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO 2ª MEDIÇÃO 3ª MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO 5ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO
Código	Serviço	Quantidade Unidade	Unidade	Unitário R\$	Total R\$	26/06/2020	25/08/2020	22/09/2020	29/10/2020	30/11/2020
820000	Sinalização 820000 Placa de sinalização c/ película refletiva 821000 Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	6,00	т2 рç	386,000 125,000	2.316,00	2.316,00	1 (	) (f	J. U	JE 1
416010 532600 500000 535200 521450 532650 532700 575100 800000	Pavimentação  416010 Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento)  522600 Colchãão de argila p/ pav. Poliedrico 500000 Escarificação, regularização compace. Subleito 523450 Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico 524450 Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro 522650 Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico 522700 Compactação de pavimento poliedrico 522700 Compactação de pavimento poliedrico 525700 Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica 52600 Enleivamento da contenção lateral	1.774,80 9.792,00 10.200,00 3.400,00 9.792,00 9.792,00 10.200,00 3.400,00 1.700,00	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	14,000 2,110 3,180 11,100 24,090 1,030 0,530 1,710 10,110	24.847,20 20.661,12 32.436,00 37.740,00 235.889,28 10.085,76 5.406,00 5.814,00	314,71 1.130,28 1.774,44 2.064,53 12.904,53 551,75 295,74	4.384,80 3.646,08 5.724,00 6.660,00 41.627,52 1.779,84 954,00	1.023,12 850,75 1.335,60 1.554,00 9.713,09 415,30	1.461,60 1.215,36 1.908,00 2.22,00 13.875,84 593,28	1.461,60 1.215,36 1.908,00 2.220,00 13.875,84 593,28
	TOTAL GERAL				392.882,36	21.852,06	64.776,24	15.114,46	21.592,08	21.592,08

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

392.882,36

\$ &

VALOR ACUMALADO DAS MEDIÇÕES

SALDO A PAGAR

Fábio Júnior de Oliveira Diretor depto. De Obras e servicos urbanos ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECKETO Nº 2.350

6° MEDIÇÃO 7° MEDIÇÃO 8° MEDIÇÃO 9° MEDIÇÃO 10° MEDIÇÃO 11° MEDIÇÃO 12° MEDIÇÃO 171° MEDIÇÃO 12° MEDIÇÃO 17112/2020 18/02/2021 16/03/2021 28/07/2021 29/07/2021	3		9 1 877 69		<u>-</u>	1.265,40	7.909,23	830,59 338,17	445,20 181,26	5.814,00	17.187,00	36.353,05
11ª MEDIÇĀ 30/06/2021	9	::1	2 046 24		2.671,20	3.108,00	19.426,18	830	445			30.228,91
10ª MEDIÇÃO 31/05/2021	ä	1	7 11 7 8	4.253.76	6.678,00	7.770,00	48.565,44	2.076,48	1.113,00			75.572,28
9ª MEDIÇÃO 26/04/2021	1	810	1 023 12		1.335,60	1.554,00	9.713,09	415,30	222,60			15.114,46
8ª MEDIÇÃO 16/03/2021	9	(1)	2 046 24		2.671,20	3.108,00	19.426,18	830,59	445,20			30.228,91
7ª MEDIÇÃO 18/02/2021	2	1	1 607 76	1.336.90	2.098,80	2.442,00	15.263,42	652,61	349,80			23.751,29
6ª MEDIÇÃO 17/12/2020	ā	ı	2 484 72	2.066.11	3.243,60	3.774,00	23.588,93	1.008,58	540,60			36.706,54

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira Dretor depro, de obras e serviços urbanos Engª, civil, crea pr 82,120/d - decreto nº 2,350
