

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2026	Recape Asfáltico em CBUQ Linha Surubi e Barra do Fartura Esta intervenção está em andamento	Contrato 30/2026	180	09/04/2026	R\$ 3.312.938,15	1,69%

Nº9/2026
Data Inicial: 09/04/2026

Recape Asfáltico em CBUQ Linha Surubi e Barra do Fartura

R\$ 3.312.938,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3295

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3380	2026	13/05/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/03/2026	30	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**41**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**41**	Fiscalização	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**40**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**40**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5914	R\$ 3.314.806,00	05/11/2025	
Contrato	30	2026	80.869.886/0001-43	5915	R\$ 3.312.938,15	09/03/2026	1,69%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5916	Medição	1	Jurisdicionado	11/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2026	1,69%

5931	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2026	1,69%
------	---------	---	----------------	------------	------------------------------	---------------------	-------


Nº9/2026
Data Inicial: 09/04/2026

Recape Asfáltico em CBUQ Linha Surubi e Barra do Fartura

Documentos

R\$ 3.312.938,15

Proposta de Preços



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

MUNICÍPIO DE SULINA- PR

CONCORRÊNCIA

Nº 90005/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ: 77.744.134/0001-41

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná



PROPOSTA DE PREÇOS

Chopinzinho, 09 de Março de 2026.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 90005/2026

Objeto: Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 20.040,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.


Trechos:

- ESTRADA RURAL (LINHA SURUBI E BARRA DO ERVA)

A Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE SULINA, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 3.312.938,15 (Três milhões trezentos e doze mil novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MOISES DE GASPERIN, portador do CPF 518.634.809-00.

Representante Legal da Proponente:	Assinatura:
Nome: MOISES DE GASPERIN CPF: 518.634.809-00 	

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná


PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	SULINA	SAM	66			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1			
Nome da Empresa:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ	77.744.134/0001-41			
Representante Legal:	MOISES DE GASPERIN	Data da Proposta:	09/03/2026 - seg			
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes ítems (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	409,30	3.100,75	3.510,05	0,10%	
2	TERRAPLENAGEM	35.681,89	-	35.681,89	1,08%	
3	DRENAGEM	42.568,68	72.516,98	115.085,66	3,47%	
4	BASE / SUB-BASE	515.765,70	717.609,31	1.233.375,01	37,24%	
5	REVESTIMENTO	404.146,75	1.396.473,61	1.800.620,36	54,36%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.562,75	37.277,15	55.839,90	1,69%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	59.742,87	8.542,41	68.285,28	2,06%	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		1.076.877,94	2.235.520,21	3.312.398,15	100,00%	
		32,51%	67,49%			


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO – RESP. TÉCNICA
 CREA PR 203.527/D



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 MOISÉS DE GASPERIN – REP. LEGAL
 CPF 518.634.809-00

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PROPO
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SULINA		PRIORIDADE Nº	79	SAM	66
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1		
Local da Obra :	LINHA BARRA DO ERVA		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			05/11/2025 - qua	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.314.806,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.078.232,64	Valor total dos Materiais: R\$ 2.236.573,36		
			32,53%	67,47%		
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 3.312.398,15	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.076.877,94	Valor total dos Materiais: R\$ 2.235.520,21		
			32,51%	67,49%		
Empresa Participante:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...	(0,07 %)		Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	180	R\$ 3.312.398,15				
Medição 1 - Início	30	R\$ 55.836,18	INICIARÁ COM A COLOCAÇÃO DA PLACA DA OBRA; EXECUTARÁ TODOS OS BUEIROS NOVOS E/OU A AMPLIAR, ASSIM COMO AS ESCAVAÇÕES E REATERROS DAS VALAS DE DRENAGEM			
Medição 2	30	R\$ 380.672,36	EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM, ASSIM COMO O MACADAME E A CAMADA DE BLOQUEIO EM TODO O TRECHO; REALIZARÁ OS ENSAIOS CORRESPONDENTES AOS MATERIAIS APLICADOS			
Medição 3	30	R\$ 392.953,38	EXECUTARÁ PARCIALMENTE A BASE EM BGS, ASSIM COMO A LIMPEZA DE TODA A PISTA; EXECUTARÁ A IMPRIMAÇÃO DA BASE EXECUTADA, ASSIM COMO REALIZARÁ OS RESPECTIVOS ENSAIOS DOS MATERIAIS APLICADOS			
Medição 4	30	R\$ 978.574,56	EXECUTARÁ PARCIALMENTE A BASE EM BGS, PARCIALMENTE O REVESTIMENTO EM CBUQ, ASSIM COMO REALIZARÁ OS RESPECTIVOS ENSAIOS CORRESPONDENTES			
Medição 5	30	R\$ 961.438,94	FINALIZARÁ A BASE EM BGS, A IMPRIMAÇÃO E EXECUTARÁ PARCIALMENTE O REVESTIMENTO EM CBUQ, ASSIM COMO REALIZARÁ OS RESPECTIVOS ENSAIOS DOS MATERIAIS APLICADOS. EXECUTARÁ E FINALIZARÁ OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM COMO ALAS E CAIXAS			
Medição 6	30	R\$ 542.922,74	FINALIZARÁ TODOS OS SERVIÇOS			

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
		09/03/2026 - seg
MOISES DE GASPERIN	CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.627/D	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE		

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII		
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2012		
IMPOSTOS	ISS =	2,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	5,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,74	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21	0,85
LUCRO	8,69	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	24,03	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	24,03%	✓
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	✓

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
 MOISÉS DE GASPERIN	09/03/2026 - seg
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	
 CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.527/D	

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI	1,00 %	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75 %	
B2	Feriados	3,41 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	
B4	13º Salário	10,58 %	
B5	Licença Paternidade	0,07 %	
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	
B7	Dias de Chuva	1,30 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	
B9	Férias Gozadas	12,30 %	
B10	Salário Maternidade	0,03 %	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	47,14 %	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09 %	
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82 %	
C5	Indenização Adicional	0,32 %	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,75 %	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,82 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34 %	-
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,16 %	-
TOTAL (A+B+C+D)		112,85 %	-

OBSERVAÇÕES:

Empresa: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Data da Proposta: 09/03/2026 - seg


 MOISES DE GASPARIN
 Representante Empresa:


 CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
 Resp. Téc. Empresa:

Nome: KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
 Contadora
 CRC PR N.º 065328/O-8



25°42'16,77"S 52°42'24,258"W
13 de maio de 2026 10:40







































PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **790/2025** SEAB
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **30/2026** DATA ASSINATURA : **19/03/2026**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.312.938,15**
 SAM : Nº **66**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **05/05/2026**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **15/09/2026**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **14/03/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA**

Nº DA LICITAÇÃO: **005/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.510,05	100,00%	3.510,05	3.510,05		3.510,05	100,00%
2		TERRAPLENAGEM		-		35.681,89	-		-	
3		DRENAGEM	45,47%	52.326,13	45,47%	115.085,66	52.326,13		52.326,13	45,47%
4		BASE / SUB-BASE		-		1.233.375,01	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		1.800.620,36	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		56.368,96	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		68.296,22	-		-	
TOTAL CRONOGRAMA				55.836,18		TOTAL MEDIÇÃO	55.836,18	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	55.836,18	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$55.836,18

1,69 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA, nº 005/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	55.836,18	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	55.836,18	100,00%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

Município de Sulina

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA LICITADA PELA LEI Nº 14.133 / 2021										ESTADO DO PARANÁ					
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
										MÊS	MAI				
										MÊS	MAI				
										PARCELA	1	DATA	05/05/2026 - ter		
MUNICÍPIO: SULINA										CÓDIGO SAM MUNIC.: 324		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEN DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										SAM 66		Nº 30/2026		Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA										CNPJ: 77.744.134/0001-41		DATA: 19/03/2026		DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1	00051	550	SERVICOS PRELIMINARES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.510,05	3.510,05	3.510,05	-			
2	5201008	554	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	m3	1.068,80	0,35%	0,13%	0,13%	10,96	-	11.714,05	11.714,05			
	411000	DER	TERRAPLENAGEM	m3	2.004,00	0,72%	0,03%	0,03%	11,96	-	23.967,84	23.967,84			
3	600300	589	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	373,92	100,00%	0,13%	0,13%	11,09	4.146,77	4.146,77	-			
	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	42,00	100,00%	0,03%	0,03%	23,58	990,36	990,36	-			
	601200	DER	Reaterro e aploamento mecânico	m3	295,78	100,00%	0,30%	0,30%	33,72	9.973,70	9.973,70	-			
	620000	DER	Boca (Ala) de BSTD a 0,40 m	un	1,00	0,03%	-	-	976,17	-	976,17	976,17			
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTD a 0,60 m	un	33,00	1,50%	-	-	1.503,04	-	49.600,32	49.600,32			
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTD a 1,00 m	un	2,00	0,18%	-	-	3.045,67	-	6.091,34	6.091,34			
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTD a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	2,00	100,00%	0,01%	0,01%	154,55	309,10	309,10	-			
	610600D	DER/PRC	Corpo de BSTD a 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	180,00	100,00%	1,03%	1,03%	189,83	34.169,40	34.169,40	-			
	611000A	DER/PRC	Corpo de BSTD a 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	4,00	100,00%	0,08%	0,08%	684,20	2.736,80	2.736,80	-			
	BLSC150	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	2,00	0,18%	-	-	3.045,85	-	6.091,70	6.091,70			
4	532100	556	BASE / SUB-BASE	m2	300,60	1,77%	-	-	195,22	-	58.685,13	58.685,13			
	511100A	DER/PRC	Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4"	m2	10.020,00	1,53%	-	-	5,07	-	15.192,32	15.192,32			
	531000	DER	Regularização compac-subleito 100% PN	m3	3.481,95	26,98%	-	-	256,74	-	893.955,84	893.955,84			
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	1.082,30	6,94%	-	-	212,45	-	229.934,64	229.934,64			
5	PAV-089	551	REVESTIMENTO	m2	20.040,00	0,53%	-	-	0,87	-	17.434,80	17.434,80			
	5501008	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.114,80	0,46%	-	-	0,63	-	15.192,32	15.192,32			
	589190A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAL - exclusive emulsão	ton	26,53	3,75%	-	-	4.688,28	-	124.380,07	124.380,07			
	561100A	DER/PRC	Pintura de lição com RR-1C - exclusive emulsão	m2	20.040,00	0,26%	-	-	0,43	-	8.617,20	8.617,20			
	5894208	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de lição	ton	10,02	1,43%	-	-	4.721,68	-	47.311,24	47.311,24			
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.505,00	23,37%	-	-	309,02	-	774.095,10	774.095,10			
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	130,26	24,56%	-	-	6.245,89	-	813.589,63	813.589,63			
6	822000	552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	m2	1.202,40	1,22%	-	-	33,55	-	40.340,52	40.340,52			
	820000F	DER/PRC	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	8,00	0,15%	-	-	638,37	-	5.106,96	5.106,96			
	820000I	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	17,00	0,33%	-	-	642,44	-	10.921,48	10.921,48			
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	un	-	-	-	-	-	-	-	-			
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos												

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

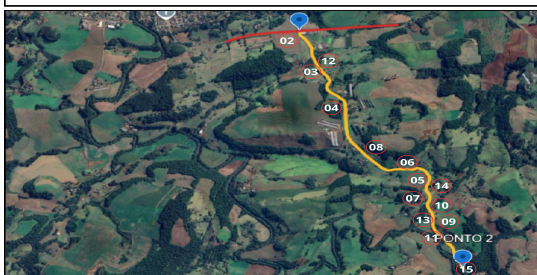
Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medicação:	66 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Contrato Nº:	30/2026
Data da Vistoria:	05/05/2026

Objeto:

Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 20.040,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **09/04/2026** até **05/05/2026**.

SERVIÇOS EXECUTADOS

	
1 PLACA DA OBRA	1 QR CODE DA PLACA
	
1 MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS	2 SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



3 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



4 | TRECHO DO PROJETO - ESTRADA DE LINHA SURUBI



5 | TRECHO DO PROJETO - ESTRADA DE LINHA SURUBI



6 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



7 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



9 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



10 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 1,00 SEM BERÇO C/ ARMAÇÃO SÍMPLES PA-1 - ESTRADA DE



11 | SERVIÇO EXECUTADO DE ESCAVAÇÃO DE BUEIRO, REMOÇÃO DE BUEIRO 0,40M, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO, CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/19747/lote/24612/medicao/19815/relatorio-fotografico/8861>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 22 de junho de 2026.

Luciano Steinemann Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR31879-D

**PARANACIDADE**

Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (22/06/2026 07:49:10)

Nome/controlado do arquivo:
2026062207491042.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062207491042>
