

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2026	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Arnaldo - Secretária Esta intervenção está em andamento	Contrato 21/2026	180	19/02/2026	R\$ 520.000,00	37,15%

Nº6/2026
Data Inicial: 19/02/2026

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Arnaldo - Secretária

R\$ 520.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3106	2026	05/05/2026	12543
3104	2026	05/05/2026	12543
3105	2026	05/05/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/02/2027	21	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*4**97**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*4**97**	Orçamento	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	16**1*0*	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5905	R\$ 631.617,78	06/10/2025	
Contrato	21	2026	80.869.886/0001-43	5906	R\$ 520.000,00	20/01/2026	37,15%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5907	Medição	1	Jurisdicionado	10/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2026	21,37%
5930	Medição	2	Jurisdicionado	20/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2026	37,15%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900284565273					

Nº6/2026
Data Inicial: 19/02/2026

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Arnaldo - Secretária

Documentos

R\$ 520.000,00

**MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA****CNPJ: 16.700.335/0001-52****Rua Frei Vito Berscheid, nº 828, Centro, Saudade do Iguaçu – PR,****CEP 85568-000****E-mail: mg.construcaocivil@hotmail.com****Fone: (46) 9 8405-6851**

**ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS FINAL**

Ao**MUNICÍPIO DE SULINA****Referência: Concorrência Eletrônica n.º Nº 10/2025**

Objeto: Reforma e ampliação de escola municipal contendo espaço para secretaria, almoxarifado, sala de professores, sala de pedagogia, direção, copa, lavabos e salas de aula.

Reforma e ampliação de escola municipal contendo: serviços preliminares e administração de obra, movimentação de terra, drenagem e águas pluviais; fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, muros e fechos; cobertura, esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, instalações de combate à incêndio; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e calçamento externo; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto.

A empresa Licitante **MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, CNPJ n.º 16.700.335/0001-52, com sede na Rua Frei Vito Berscheid, nº 828, Bairro: Centro, Saudade do Iguaçu, Paraná, CEP: 85568-000, fone: (46) 9 8405-6851, E-mail: mg.construcaocivil@hotmail.com, Inscrição Estadual: 90861294-90, Banco: Sicredi, Agência: 0740, C/C: 59508-0, propõe ao MUNICÍPIO DE a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.:

- 1) O preço proposto é de R\$ 520.000,00(quinientos e vinte mil reais).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, MARCIO GALLINA, inscrito no CPF nº. 027.917.999-58, e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr. RODRIGO PIRES FRANCO, CREA e/ou CAU n.º A91039-2 e CPF: 060.543.606-12, Título de Arquiteto e Urbanista,

Saudade do Iguaçu, PR, 20 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente



MARCIO GALLINA

Data: 20/01/2026 11:13:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO GALLINA
RG Nº 5.980.314-0 SSP/PR
CPF: 027.917.999-58



MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 16.700.335/0001-52

Rua Frei Vito Berscheid, nº 828, Centro, Saudade do Iguaçu – PR,

CEP 85568-000

E-mail: mg.construcaocivil@hotmail.com

Fone: (46) 9 8405-6851

SÓCIO ADMINISTRADOR



Documento assinado digitalmente

RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 20/01/2026 10:16:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO PIRES FRANCO

ARQUITETO E URBANISTA

CAU n.º A91039-2

CPF: 060.543.606-12

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO									
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS:					11,10%		BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS:		
BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.:					20,34%				
Empresas: MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA									
Menor Preço (%) calculado...					(17,67 %)		VALOR GLOBAL DA Proposta:		R\$ 520.000,00
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL									
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAMENT SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAMENT COM BDI	PREÇO UNITARIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENT (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(17,66 %)	3.352,05	1.960,88	5.312,93	
7,07	3,15	8,50	3,80	12,30	(20,34 %)	14,28	6,38	20,68	
30,16	34,52	36,20	41,55	77,84	(17,52 %)	2.939,49	3.365,55	6.305,04	
330,06	2.151,20	368,28	2.589,75	2.987,03	(17,67 %)	368,28	2.589,75	2.987,03	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	1.186,75	1.796,58	2.982,33	
79,32	34,28	85,46	41,22	136,68	(17,67 %)	802,55	385,41	1.277,98	
17,11	15,08	26,59	12,13	32,72	(17,86 %)	102,05	60,85	163,60	
6,86	5,26	6,86	8,25	6,91	(17,27 %)	109,80	56,75	166,53	
4,41	162,71	5,31	198,81	201,12	(17,67 %)	5,31	195,81	201,12	
10,08	432,78	12,11	496,74	508,85	(17,67 %)	24,22	800,48	1.017,70	
8,69	26,80	10,46	32,25	42,71	(17,68 %)	20,62	64,50	85,42	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	18.453,78	69.676,93	78.624,78	
27,12	146,62	32,43	175,24	207,47	(17,68 %)	7.593,70	42.820,35	50.414,05	
119,68	119,86	146,02	139,43	259,45	(17,67 %)	6.211,58	6.013,02	12.225,20	
4,76	10,14	5,73	10,21	17,04	(17,67 %)	866,04	1.625,46	2.892,04	
3,08	9,26	4,31	11,15	15,46	(17,63 %)	2.658,84	6.749,15	9.357,84	
2,59	7,07	2,40	9,59	12,05	(17,65 %)	783,02	3.052,30	3.835,32	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	43.392,46	158.025,49	146.522,95	
74,65	134,27	89,83	181,58	251,41	(17,67 %)	11.003,28	19.791,03	30.795,21	
80,06	68,92	96,35	85,54	176,89	(17,67 %)	9.320,74	7.707,08	17.124,72	
21,69	50,86	26,10	97,31	123,41	(17,67 %)	5.053,45	18.841,16	23.894,61	
4,17	8,90	5,01	10,71	15,72	(17,76 %)	2.446,38	5.229,69	7.676,07	
4,91	10,52	5,91	12,66	18,57	(17,69 %)	553,18	1.184,38	1.738,16	
3,52	9,61	4,23	11,58	15,79	(17,67 %)	3.381,89	9.342,22	12.624,11	
2,49	6,18	2,99	9,94	12,83	(17,65 %)	753,18	2.478,75	3.231,88	
15,94	458,03	19,18	501,80	570,94		175,50	5.048,97	5.224,47	
27,21	121,41	32,74	146,10	179,84	(17,68 %)	6.122,38	27.320,75	33.443,08	
22,01	66,50	27,57	80,23	107,60	(17,67 %)	1.011,82	2.937,10	3.948,92	
21,56	61,78	26,56	78,85	99,95	(17,67 %)	461,91	1.310,08	1.771,99	
22,01	64,50	27,57	77,49	105,06	(17,67 %)	1.011,82	2.843,88	3.855,70	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	16.269,22	19.629,34	34.897,68	
37,84	40,13	45,53	48,20	93,62	(17,67 %)	14.416,18	15.290,06	29.708,22	
13,11	67,43	15,77	81,15	96,92	(17,66 %)	843,06	4.308,28	5.151,34	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	3.821,47	28.995,81	32.817,69	
4,19	23,39	5,94	28,15	33,19	(17,66 %)	922,32	5.151,45	6.073,77	
4,00	20,28	4,81	24,40	29,21	(17,76 %)	1.060,09	5.520,77	6.519,87	

[illegible][illegible]

[illegible]

Documento assinado digitalmente



MARCIO GALLINA

Data: 20/01/2026 11:02:18-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente

RODRIGO PIRES FRANCO

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[illegible]

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA - CREA PR-199.167D - ART/RRT Nº 1720240000001	GILBERTO JOÃO ROSSI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Desenho autorizado de PARANACIDADE










































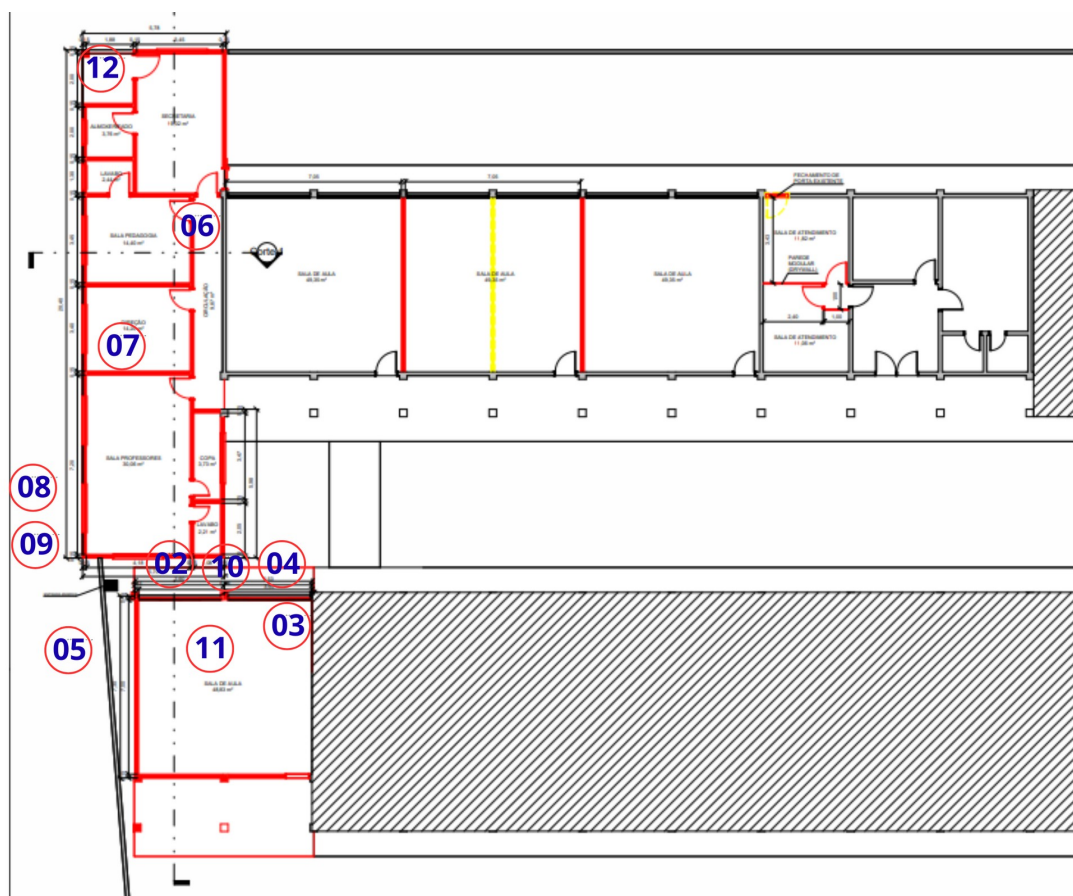



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SULINA**

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO :	SULINA		
PROJETO :	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL		
CONVÊNIO :	Nº	PAM	
EMPRESA VENCEDORA :	MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
CNPJ :	16.700.335/0001-52		
CONTRATO EMPREITADA Nº :	21/2026		DATA ASSINATURA :
VALOR TOTAL CONTRATADO :	520.000,00		
SAM :	Nº	62	MODALIDADE
LOTE :	Nº	1	

MEDICÃO Nº:	1
DATA DA MEDICÃO :	10/06/2026
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:	1
PRAZO DE EXECUÇÃO:	18/08/2026
PRAZO DE VIGÊNCIA:	14/02/2027

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: 001/2024

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	9.312,73	99,78%	9.312,73	9.292,07		9.292,07	99,78%
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	91,47%	2.663,99	53,25%	2.912,32	1.550,75		1.550,75	53,25%
3		FUNDACOES	100,00%	79.024,68	100,00%	79.024,68	79.024,68		79.024,68	100,00%
4		ESTRUTURAS	1,20%	1.741,49	8,34%	145.328,95	12.123,70		12.123,70	8,34%
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	8,07%	34.887,57	2.814,60		2.814,60	8,07%
6		COBERTURA	-	-	-	32.527,08	-		-	-
7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	44.639,09	-		-	-
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	-	31.339,22	-		-	-
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	53,85%	8.916,50	-	16.556,54	-		-	-
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	6,30%	7.741,08	5,13%	122.924,90	6.309,90		6.309,90	5,13%
12	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	546,92	-		-	-
		TOTAL CRONOGRAMA	109.400,47	TOTAL MEDIÇÃO		111.115,70	OK		Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	111.115,70	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$111.115,70

21,37 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA	% META
--	--------

META ATÉ 1ª ETAPA =	109.400,49
----------------------------	-------------------

REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	111.115,70	101,57%
----------------------------	------------	---------

META FINANCEIRA ATINGIDA

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 16/06/2026 08:15:58-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**PARANACIDADE**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- GILBERTO JOAO ROSSI (16/06/2026 09:33:36 - CPF: 03160453901)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas José Chioquetta (16/06/2026 09:33:36)

Nome do arquivo:

2026061609333665.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026061609333665>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA											ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021											REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: SULINA											MEDICÃO PARCELA	1	DATA	10/06/2026 - que
SUBPROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL											CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITEIRA: MG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											Nº	21/2026	Nº	
CNPJ: 16.700.335/0001-52											DATA:	19/02/2026	DATA	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Esc. citada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1	561		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1			REMOÇÃO DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97644	SINAPI		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m2	1,68	-	1,68				12,30	-	20,66	20,66
1.1.2			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99059	SINAPI		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	m	81,00	-	81,00	100,00%	1,21%	1,21%	77,84	6.305,04	6.305,04	-
1.2			ADMINISTRAÇÃO E CANTO DE OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00051	ORSE		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,57%	0,57%	2.987,03	2.987,03	2.987,03	-
2	562		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2			ESCOVAÇÃO MECÂNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96527	SINAPI		ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	m3	9,35	-	9,35	100,00%	0,25%	0,25%	136,68	1.277,95	1.277,95	-
93382	SINAPI		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m3	5,00	-	5,00	100,00%	0,03%	0,03%	32,72	163,60	163,60	-
2.1.9			COMPACTAÇÃO MECÂNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97084	SINAPI		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO DE LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	m2	183,00	-	183,00	65,57%	0,03%	0,02%	0,91	109,20	166,53	57,33
2.4			CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4			CAIXA DE GORDURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98102	SINAPI		CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	un	1,00	-	1,00		0,04%		201,12	-	201,12	201,12
97897	SINAPI		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,5 M. AF. 12/2020	un	2,00	-	2,00		0,20%		508,85	-	1.017,70	1.017,70
2.4.6			CAIXAS SIFONADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89482	SINAPI		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RANAL DE ENCAIXAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	un	2,00	-	2,00		0,02%		42,71	-	85,42	85,42
3	563		FUNDAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x			SERVIÇOS DE FUNDOS - FUNDACOES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92270	SINAPI		FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	m2	244,98	-	244,98	100,00%	9,79%	9,79%	207,87	50.923,99	50.923,99	-
96529	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF. 01/2024	m2	43,13	-	43,13	100,00%	2,35%	2,35%	283,45	12.225,20	12.225,20	-
96545	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	149,50	-	149,50	100,00%	0,52%	0,52%	17,94	2.682,03	2.682,03	-
96546	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	605,30	-	605,30	100,00%	1,80%	1,80%	15,46	9.357,94	9.357,94	-
96547	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 X 12 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	318,30	-	318,30	100,00%	0,74%	0,74%	12,05	3.835,52	3.835,52	-
4	564		ESTRUTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1			FORMAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2			FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92447	SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-SIEMTO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m2	122,49	-	122,49		5,92%		251,41	-	30.795,21	30.795,21
92411	SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-SIEMTO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m2	96,81	-	96,81		3,29%		176,89	-	17.124,72	17.124,72
92269	SINAPI		FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 09/2020	m2	193,62	-	193,62	33,57%	4,60%	1,54%	123,41	8.021,65	23.894,64	15.872,99
4.2			ARMADURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3			ARMAÇÃO CA-50 E CA-60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92759	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	488,30	-	488,30	16,38%	1,48%	0,24%	15,72	1.257,60	7.676,08	6.418,48
92777	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	93,60	-	93,60	16,03%	0,33%	0,05%	18,57	278,55	1.738,15	1.459,60
92778	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	799,50	-	799,50	16,26%	2,43%	0,40%	15,79	2.052,70	12.624,11	10.571,41
92779	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	251,90	-	251,90	15,88%	0,62%	0,10%	12,83	513,20	3.231,88	2.718,68
4.3			CONCRETOS E GUAITES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4			ESTRUTURAL USIMADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.1			CONCRETAGENS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97096	SINAPI		CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	m3	9,15	-	9,15		1,00%		570,98	-	5.224,47	5.224,47
4.5			LAJES PRÉ-MOLDADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2			LAJES PRÉ-MOLDADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101964	SINAPI		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CEBRÃO, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	m2	187,00	-	187,00		6,43%		178,84	-	33.443,08	33.443,08
4.6			ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.1			MANUTENÇÃO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2			ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2.1			CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93186	SINAPI		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2024	m	36,70	-	36,70		0,76%		107,60	-	3.948,92	3.948,92
93188	SINAPI		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2024	m	17,80	-	17,80		0,34%		99,55	-	1.771,99	1.771,99
93196	SINAPI		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2024	m	36,70	-	36,70		0,74%		105,06	-	3.855,70	3.855,70
5	565		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUIROS E FECHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1			ALVENARIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2			ENCUNHAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103330	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m2	316,63	-	316,63	9,47%	5,71%	0,54%	93,82	2.814,60	29.706,23	26.891,63
5.2			DIVISÓRIAS E PAREDES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3			PLACAS DE GESSO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96358	SINAPI		PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 01x1x1 CM PP, 30x30 CM. AF. 03/2023, RS.	m2	53,46	-	53,46		1,00%		96,92	-	5.181,34	5.181,34
6	566		COBERTURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2			ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92566	SINAPI		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO ANABRILHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	183,00	-	183,00		1,17%		33,19	-	6.073,77	6.073,77
92543	SINAPI		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	226,63	-	226,63		1,27%		29,21	-	6.619,86	6.619,86
6.5			TELHA METÁLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94213	SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF. 07/2019	m2	226,63	-	226,63		3,15%		72,24	-	16.371,75	16.371,75
6.11			CAIUS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94227	SINAPI		CAIUS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSIVE LANCAMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	55,00	-	55,00		0,67%		62,94	-	3.461,70	3.461,70
7	567		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3			PORTAS EM MADEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.8			VENEZIANAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid Licitada	Diferença	Quantid LICITADA	% Eas- cutada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	100680	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXCLUSÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	2,00	-	2,00	0,48%			1.249,79	-	2.499,58	2.499,58
	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXCLUSÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	9,00	-	9,00	2,42%			1.397,43	-	12.576,87	12.576,87
	7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	2,10	-	2,10	0,61%			1.518,23	-	3.188,28	3.188,28
	7.1.11		JANELAS EM ALUMÍNIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2004	m2	1,20	-	1,20	0,16%			674,04	-	808,85	808,85
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2004	m2	32,16	-	32,16	4,68%			756,01	-	24.313,28	24.313,28
	7.2		VIDROS E ESPELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2.2		VIDROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	un	1,00	-	1,00	0,24%			1.252,23	-	1.252,23	1.252,23
8		568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	135,00	-	135,00	0,28%			10,70	-	1.444,50	1.444,50
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	554,70	-	554,70	0,89%			8,37	-	4.642,84	4.642,84
	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	3,90	-	3,90	0,01%			17,87	-	69,69	69,69
	8.2.5		CAIXAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	2.036,00	-	2.036,00	2,07%			5,29	-	10.770,44	10.770,44
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	33,00	-	33,00	0,05%			7,73	-	255,09	255,09
	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	45,80	-	45,80	0,10%			10,84	-	496,47	496,47
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	16,90	-	16,90	0,09%			26,95	-	455,46	455,46
	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	67,50	-	67,50	0,37%			28,46	-	1.921,05	1.921,05
	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	3,90	-	3,90	0,04%			56,46	-	220,19	220,19
	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	15,30	-	15,30	0,30%			100,64	-	1.539,79	1.539,79
	8.2.8		CAIXAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	7,00	-	7,00	0,06%			41,86	-	293,02	293,02
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	22,00	-	22,00	0,10%			24,37	-	536,14	536,14
	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	48,00	-	48,00	0,15%			15,78	-	757,44	757,44
	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.400.400.4 M. AF. 12/2020	un	1,00	-	1,00	0,04%			231,12	-	231,12	231,12
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	-	1,00	0,10%			506,43	-	506,43	506,43
	8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	10,00	-	10,00	0,03%			13,31	-	133,10	133,10
	8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	3,00	-	3,00	0,04%			63,34	-	190,02	190,02
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	-	1,00	0,01%			65,03	-	65,03	65,03
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	4,00	-	4,00	0,05%			68,20	-	272,80	272,80
	8.2.11.4		OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	-	1,00	0,14%			716,82	-	716,82	716,82
	8.2.12		INTERRUPTORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	8,00	-	8,00	0,06%			36,08	-	288,64	288,64
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	1,00	-	1,00	0,01%			54,75	-	54,75	54,75
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	4,00	-	4,00	0,06%			73,39	-	293,56	293,56
	8.2.12.2		PARALELOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	1,00	-	1,00	0,01%			44,01	-	44,01	44,01
	8.2.13		TOMADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	7,00	-	7,00	0,08%			58,21	-	407,47	407,47
	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	8,00	-	8,00	0,07%			42,82	-	342,56	342,56
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	48,00	-	48,00	0,35%			37,76	-	1.812,48	1.812,48
	8.2.20		LÂMPADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	un	55,00	-	55,00	0,39%			36,44	-	2.004,20	2.004,20
	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	un	9,00	-	9,00	0,03%			16,71	-	150,39	150,39
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39467	PM_324	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TIPO AC)	un	4,00	-	4,00	0,08%			105,93	-	423,72	423,72
9		569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2024	m	14,00	-	14,00	0,03%			10,36	-	145,04	145,04
	90466	SINAPI	CHUBREMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2024	m	14,00	-	14,00	0,05%			19,08	-	267,12	267,12
	9.3.14		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102592	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIÂMETRO DE 35 MM. AF. 06/2021	un	2,00	-	2,00	7,62			7,62	-	15,24	15,24
	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUIDOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	un	1,00	-	1,00	0,17%			880,83	-	880,83	880,83
	9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMÁRIA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 04/2024	m	35,58	-	35,58	0,40%			58,61	-	2.085,34	2.085,34
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Município de Sulina

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 04/2024	m	3,39	-	3,39	0,05%			80,35	-	272,39	272,39
	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIÇOS. AF. 04/2024	m	6,62	-	6,62	0,15%			116,26	-	769,64	769,64
	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIÇOS. AF. 04/2024	m	15,81	-	15,81	0,26%			84,50	-	1.335,95	1.335,95
	9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020_PA	un	1,00	-	1,00	0,61%			3.171,47	-	3.171,47	3.171,47
	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020_PA	un	1,00	-	1,00	0,65%			3.367,05	-	3.367,05	3.367,05
	9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.4.2		BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	1,00	-	1,00	0,08%			429,91	-	429,91	429,91
	9.4.5		LAVATÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUMA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00	0,38%			984,25	-	1.968,50	1.968,50
	9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00	0,26%			667,89	-	1.335,78	1.335,78
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00	0,02%			46,39	-	92,78	92,78
	9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00	0,04%			99,81	-	199,62	199,62
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00	0,02%			53,66	-	107,32	107,32
	9.4.10		REGISTROS E VÁLVULAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LÁTIÃO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	un	2,00	-	2,00	0,02%			56,28	-	112,56	112,56
10	570		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PRIMER MANUAL. AF. 01/2020	m2	633,26	-	633,26	0,71%			5,84	-	3.698,24	3.698,24
	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESMONTADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PRIMER EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	m2	187,00	-	187,00	0,61%			16,86	-	3.152,82	3.152,82
	10.1.3		EMBOCO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 03/2024	m2	633,26	-	633,26	5,33%			43,73	-	27.692,46	27.692,46
	10.1.9		CERÂMICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023	m2	28,91	-	28,91	0,58%			104,35	-	3.016,76	3.016,76
	10.2		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF. 09/2023	m2	165,62	-	165,62	81,51%	1,49%	1,21%	46,74	6.309,90	7.741,08	1.431,18
	10.2.10		PEITROLIL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101965	SINAPI	PEITROLIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	m	29,46	-	29,46	0,82%			144,88	-	4.268,16	4.268,16
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2024	m2	183,00	-	183,00	1,73%			49,19	-	9.001,77	9.001,77
	10.3.6		PISO CERÂMICO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023_P2	m2	183,00	-	183,00	2,53%			71,97	-	13.170,51	13.170,51
	10.3.12	SINAPI	PISO DE CONCRETO	m2	183,00	-	183,00	2,64%			75,04	-	13.732,32	13.732,32
	10.3.13	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	m2	183,00	-	183,00	0,32%			13,73	-	1.660,78	1.660,78
	88650	SINAPI	SOLTEIRAS E RODAPES	m	120,96	-	120,96	0,32%			13,73	-	1.660,78	1.660,78
	10.4		PINTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.4.2		EMASSAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m2	187,00	-	187,00	1,49%			41,55	-	7.769,85	7.769,85
	10.4.3		MASSA ÚNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	m2	316,63	-	316,63	2,19%			35,98	-	11.392,35	11.392,35
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m2	633,26	-	633,26	0,56%			4,61	-	2.919,33	2.919,33
	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m2	187,00	-	187,00	0,21%			5,85	-	1.093,95	1.093,95
	10.4.8		PINTURA EM MADEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102213	SINAPI	PINTURA VERNEZ (UNICOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m2	19,95	-	19,95	0,09%			24,49	-	488,58	488,58
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m2	633,26	-	633,26	1,72%			14,09	-	8.922,63	8.922,63
	10.4.13		PINTURA EM TETOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m2	187,00	-	187,00	0,62%			17,13	-	3.203,31	3.203,31
12	12	572	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m2	187,00	-	187,00	0,10%			2,75	-	514,25	514,25
	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m2	28,91	-	28,91	0,01%			1,13	-	32,67	32,67
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:		21,04%	% EXECUTADO:		21,37%	SOMAS	111.115,70	520.000,00	408.884,30
OBSERVAÇÕES:											Valor Total do Contrato: R\$520.000,00			
											Medição Acumulada: 111.115,70			
											Total Anterior: -			
											Valor e % executado desta Medição: R\$111.115,70 21,37 %			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														
MG CONSTRUCAO CIVIL LTDA Arg. Rodrigo Pires Franco C.A.I.: 481833-2					PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA Lucas José Chioquetta ENGº CIVIL - CREA -PR 209647-D					PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA GILBERTO JOÃO ROSSI				

**PARANACIDADE**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- GILBERTO JOAO ROSSI (16/06/2026 09:03:15 - CPF: 03160453901)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas José Chioquetta (16/06/2026 09:25:36)

Nome do arquivo:

2026061609253647.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026061609253647>

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medicação:	62 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	21/2026
Data da Vistoria:	14/05/2026

Objeto:

Reforma e ampliação de escola municipal contendo espaço para secretaria, almoxarifado, sala de professores, sala de pedagogia, direção, copa, lavabos e salas de aula.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/03/2026 até 14/05/2026.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA



1 | QR CODE DA PLACA

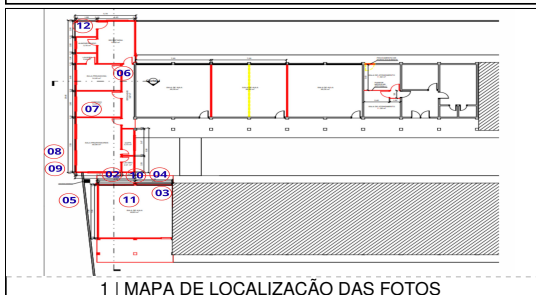


1 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



2 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO



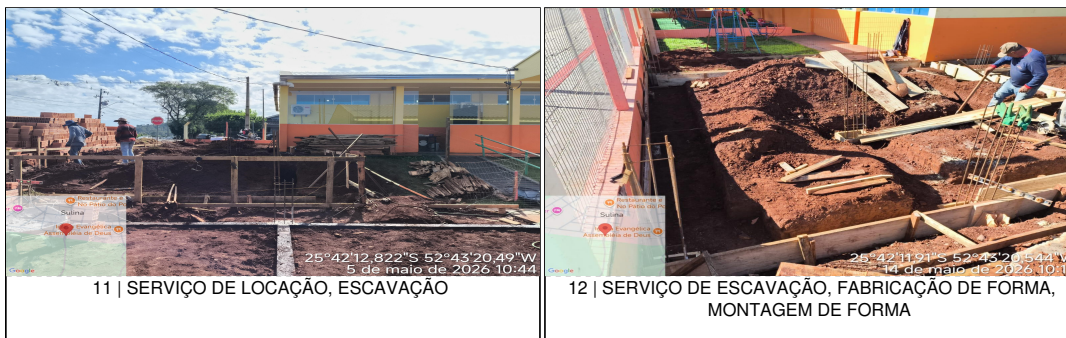

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/18755/lote/23717/medicao/18890/relatorio-fotografico/8790>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 10 de junho de 2026.

Lucas José Chioquetta
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: PR209647-D

**PARANACIDADE**

Documento assinado eletronicamente por:
Lucas José Chioquetta (10/06/2026 09:01:04)

Nome/controlado do arquivo:
2026061009010450.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026061009010450>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
PROJETO : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL**
CONVÊNIO : Nº **1** PAM
EMPRESA VENCEDORA : **MG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**
CNPJ : **16.700.335/0001-52**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **21/2026** DATA ASSINATURA : **19/02/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **520.000,00**
SAM : Nº **62**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
DATA DA MEDIÇÃO : **08/07/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **2**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **18/08/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **14/02/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	9.312,73	99,78%	9.312,73	9.292,07	9.292,07	-	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	2.912,32	54,65%	2.912,32	1.591,70	1.550,75	40,95	1,41%
3		FUNDACOES	100,00%	79.024,68	100,00%	79.024,68	79.024,68	79.024,68	-	
4		ESTRUTURAS	24,17%	35.130,99	52,67%	145.328,95	76.543,21	12.123,70	64.419,51	44,33%
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	50,00%	17.443,32	56,47%	34.887,57	19.702,20	2.814,60	16.887,60	48,41%
6		COBERTURA		-		32.527,08	-	-	-	
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-		44.639,09	-	-	-	
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-		31.339,22	-	-	-	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	53,85%	8.916,50		16.556,54	-	-	-	
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	6,30%	7.741,08	5,70%	122.924,90	7.011,00	6.309,90	701,10	0,57%
12	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		546,92	-	-	-	
TOTAL CRONOGRAMA				160.481,62		TOTAL MEDIÇÃO	193.164,86			
								OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								111.115,70	82.049,16	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: **R\$82.049,16** **15,78 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2ª ETAPA		% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	160.481,64	
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	193.164,86	120,37%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA											ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021											REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
Mês											MEDICÃO PARCELA A	2	DATA	08/07/2026 - qua
CÓDIGO SAM MUNIC.: 324											CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Lote 1											Nº	21/2026	Nº	
CNPJ: 16.700.335/0001-52											DATA:	19/02/2026	DATA	
MUNICÍPIO: SULINA											ORÇAMENTO			
SUBPROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL											Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
FIRMA EMPREITEIRA: IMG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA														
MEDICÃO DOS SERVIÇOS														
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Enfilh. (ABC)	% Total				
GLOBAL - LOTE 1														
1		561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-				-	-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-	-	-				-	-	-	-
	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	1,68	-	1,68				12,30	-	20,66	20,66
	1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024		-	-	-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	81,00	-	81,00	100,00%	1,21%	1,21%	77,84	6.305,04	6.305,04	-
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-				-	-	-	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTEIOTES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,57%	0,57%	2.987,03	2.987,03	2.987,03	-
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCOVAÇÃO MECÂNICA		-	-	-				-	-	-	-
	96527	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m3	9,35	-	9,35	100,00%	0,25%	0,25%	136,68	1.277,95	1.277,95	-
	93382	SINAPI	RETEIRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	5,00	-	5,00	100,00%	0,03%	0,03%	32,72	163,60	163,60	-
	2.1.9		COMPACTAÇÃO MECÂNICA		-	-	-				-	-	-	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m2	183,00	-	183,00	90,16%	0,03%	0,03%	0,91	150,15	166,53	16,38
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-				-	-	-	-
	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	un	1,00	-	1,00		0,04%		201,12	-	201,12	201,12
	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un	2,00	-	2,00		0,20%		508,85	-	1.017,70	1.017,70
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-	-	-				-	-	-	-
	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	un	2,00	-	2,00		0,02%		42,71	-	85,42	85,42
3		563	FUNDACOES		-	-	-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES		-	-	-				-	-	-	-
	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	244,98	-	244,98	100,00%	9,79%	9,79%	207,87	50.923,99	50.923,99	-
	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m2	43,13	-	43,13	100,00%	2,35%	2,35%	283,45	12.225,20	12.225,20	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	149,50	-	149,50	100,00%	0,52%	0,52%	17,94	2.682,03	2.682,03	-
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	605,30	-	605,30	100,00%	1,80%	1,80%	15,46	9.357,94	9.357,94	-
	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	318,30	-	318,30	100,00%	0,74%	0,74%	12,05	3.835,52	3.835,52	-
4		564	ESTRUTURAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-				-	-	-	-
	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTEIOTE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	122,49	-	122,49	71,03%	5,92%	4,20%	251,41	21.872,67	30.795,21	8.922,54
	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	96,81	-	96,81	71,27%	3,29%	2,34%	176,89	12.205,41	17.124,72	4.919,31
	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_09/2020	m2	193,62	-	193,62	73,86%	4,60%	3,40%	123,41	17.647,63	23.894,64	6.247,01
	4.2		ARMADURAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-	-	-				-	-	-	-
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	488,30	-	488,30	67,58%	1,48%	1,00%	15,72	5.187,60	7.676,08	2.488,48
	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	93,60	-	93,60	69,44%	0,33%	0,23%	18,57	1.207,05	1.738,15	531,10
	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	799,50	-	799,50	66,29%	2,43%	1,61%	15,79	8.368,70	12.624,11	4.255,41
	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	251,90	-	251,90	67,49%	0,62%	0,42%	12,83	2.181,10	3.231,88	1.050,78
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USIMDO		-	-	-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-				-	-	-	-
	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EXC 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m3	9,15	-	9,15		1,00%		570,98	-	5.224,47	5.224,47
	4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m2	187,00	-	187,00		6,43%		178,84	-	33.443,08	33.443,08
	101964	SINAPI	ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.1		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.2		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-	-	-				-	-	-	-
	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024	m	36,70	-	36,70	81,74%	0,76%	0,63%	107,60	3.228,00	3.948,92	720,92
	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024	m	17,80	-	17,80	84,27%	0,34%	0,29%	99,55	1.493,25	1.771,99	278,74
	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2024	m	36,70	-	36,70	81,74%	0,74%	0,60%	105,06	3.151,80	3.855,70	703,90
5		565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-				-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-	-	-				-	-	-	-
	5.1.1.2		ENCHIMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	316,63	-	316,63	66,32%	5,71%	3,79%	93,82	19.702,20	29.706,23	10.004,03
	5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES		-	-	-				-	-	-	-
	5.2.3		PLACAS DE GESSO		-	-	-				-	-	-	-
	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM IGUAS SIMPLES. SEM VÃOS. AF_07/2023. PS	m2	53,46	-	53,46		1,00%		96,92	-	5.181,34	5.181,34
6		566	COBERTURA		-	-	-				-	-	-	-
	6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA		-	-	-				-	-	-	-
	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTEIADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	183,00	-	183,00		1,17%		33,19	-	6.073,77	6.073,77
	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	226,63	-	226,63		1,27%		29,21	-	6.619,86	6.619,86
	6.5		TELHA METÁLICA		-	-	-				-	-	-	-
	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m2	226,63	-	226,63		3,15%		72,24	-	16.371,75	16.371,75
	6.11		CALHAS		-	-	-				-	-	-	-
	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	55,00	-	55,00		0,67%		62,94	-	3.461,70	3.461,70
7		567	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-				-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-	-	-				-	-	-	-
	7.1.3		PORTAS EM MADEIRA		-	-	-				-	-	-	-
	7.1.3.8		VENEZIANAS		-	-	-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef.De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	100680	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	un	2,00	-	2,00	0,48%			1,249,79	-	2,499,58	2,499,58
	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	un	9,00	-	9,00	2,42%			1,397,43	-	12,576,87	12,576,87
	7,1,6		PORTAS EM ALUMÍNIO			-	-	-			-	-	-	-
	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m2	2,10	-	2,10	0,61%			1,518,23	-	3,188,28	3,188,28
	7,1,1,1		JANELAS EM ALUMÍNIO			-	-	-			-	-	-	-
	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m2	1,20	-	1,20	0,16%			674,04	-	808,85	808,85
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m2	32,16	-	32,16	4,68%			756,01	-	24,313,28	24,313,28
	7,2		VIDROS E ESPELHOS			-	-	-			-	-	-	-
	7,2,2		VIDROS			-	-	-			-	-	-	-
	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X120 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	un	1,00	-	1,00	0,24%			1,252,23	-	1,252,23	1,252,23
8		568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			-	-	-			-	-	-	-
	8,2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	-	-			-	-	-	-
	8,2,1		MANUTENÇÃO / REPAROS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	-	-			-	-	-	-
	90447	SINAPI	RASCO LINEAR MANA EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	m	135,00	-	135,00	0,28%			10,70	-	1,444,50	1,444,50
	8,2,3		ELETRODUTOS E CONEXÕES			-	-	-			-	-	-	-
	8,2,3,1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS			-	-	-			-	-	-	-
	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	m	554,70	-	554,70	0,89%			8,37	-	4,642,84	4,642,84
	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	m	3,90	-	3,90	0,01%			17,87	-	69,69	69,69
	8,2,5		CHABIS			-	-	-			-	-	-	-
	8,2,5,2		ISOLAMENTO 0,6/1KV			-	-	-			-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	m	2,036,00	-	2,036,00	2,07%			5,29	-	10,770,44	10,770,44
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	m	33,00	-	33,00	0,05%			7,73	-	255,09	255,09
	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	m	45,80	-	45,80	0,10%			10,84	-	496,47	496,47
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	m	16,90	-	16,90	0,09%			26,95	-	455,46	455,46
	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	m	67,50	-	67,50	0,37%			28,46	-	1,921,05	1,921,05
	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	m	3,90	-	3,90	0,04%			56,46	-	220,19	220,19
	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	m	15,30	-	15,30	0,30%			100,64	-	1,539,79	1,539,79
	8,2,8		CAIXAS			-	-	-			-	-	-	-
	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	7,00	-	7,00	0,06%			41,86	-	293,02	293,02
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	22,00	-	22,00	0,10%			24,37	-	536,14	536,14
	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	48,00	-	48,00	0,15%			15,78	-	757,44	757,44
	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	un	1,00	-	1,00	0,04%			231,12	-	231,12	231,12
	8,2,9		QUADROS DE ENERGIA			-	-	-			-	-	-	-
	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	1,00	-	1,00	0,10%			506,43	-	506,43	506,43
	8,2,11		DISJUNTORES			-	-	-			-	-	-	-
	8,2,11,1		MONOPOLARES			-	-	-			-	-	-	-
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	10,00	-	10,00	0,03%			13,31	-	133,10	133,10
	8,2,11,2		BIPOLARES			-	-	-			-	-	-	-
	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	3,00	-	3,00	0,04%			63,34	-	190,02	190,02
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	1,00	-	1,00	0,01%			65,03	-	65,03	65,03
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	4,00	-	4,00	0,05%			68,20	-	272,80	272,80
	8,2,11,4		OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR			-	-	-			-	-	-	-
	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	1,00	-	1,00	0,14%			716,82	-	716,82	716,82
	8,2,12		INTERRUPTORES			-	-	-			-	-	-	-
	8,2,12,1		SIMPLES			-	-	-			-	-	-	-
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	8,00	-	8,00	0,06%			36,08	-	288,64	288,64
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	1,00	-	1,00	0,01%			54,75	-	54,75	54,75
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	4,00	-	4,00	0,06%			73,39	-	293,56	293,56
	8,2,12,2		PARALELOS			-	-	-			-	-	-	-
	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	1,00	-	1,00	0,01%			44,01	-	44,01	44,01
	8,2,13		TOMADAS			-	-	-			-	-	-	-
	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	7,00	-	7,00	0,08%			58,21	-	407,47	407,47
	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	8,00	-	8,00	0,07%			42,82	-	342,56	342,56
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	un	48,00	-	48,00	0,39%			37,76	-	1,812,48	1,812,48
	8,2,20		LÂMPADAS			-	-	-			-	-	-	-
	8,2,20,5		LÂMPADARIAS DE LED			-	-	-			-	-	-	-
	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	un	55,00	-	55,00	0,39%			36,44	-	2,004,20	2,004,20
	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	un	9,00	-	9,00	0,03%			16,71	-	150,39	150,39
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			-	-	-			-	-	-	-
	39467	PM_324	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45kA (TIPO AC)	un	4,00	-	4,00	0,08%			105,93	-	423,72	423,72
9		569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			-	-	-			-	-	-	-
	9,3		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			-	-	-			-	-	-	-
	9,3,1		MANUTENÇÃO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA			-	-	-			-	-	-	-
	90443	SINAPI	RASCO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	m	14,00	-	14,00	0,03%			10,36	-	145,04	145,04
	90466	SINAPI	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	m	14,00	-	14,00	0,05%			19,08	-	267,12	267,12
	9,3,1,4		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS			-	-	-			-	-	-	-
	102592	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM, AF_06/2021	un	2,00	-	2,00				7,62	-	15,24	15,24
	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	un	1,00	-	1,00	0,17%			880,83	-	880,83	880,83
	9,3,1,6		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA			-	-	-			-	-	-	-
	9,3,1,6,1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA			-	-	-			-	-	-	-
	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_04/2024	m	35,58	-	35,58	0,40%			58,61	-	2,085,34	2,085,34
	9,3,2,4		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS			-	-	-			-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef.De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_04/2024	m	3,39	-	3,39	0,05%			80,35		272,39	272,39
	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF_04/2024	m	6,62	-	6,62	0,15%			116,26		769,64	769,64
	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG, SANIT., PRUMADA ESG, SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_04/2024	m	15,81	-	15,81	0,26%			84,50		1.335,95	1.335,95
	93,33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO			-	-				-		-	-
	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	un	1,00	-	1,00	0,61%			3.171,47		3.171,47	3.171,47
	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	un	1,00	-	1,00	0,65%			3.367,05		3.367,05	3.367,05
	9,4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS			-	-				-		-	-
	9,4,2		BANCKADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	-	1,00	0,08%			429,91		429,91	429,91
	9,4,5		LAVATÓRIOS			-	-				-		-	-
	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00	0,38%			984,25		1.968,50	1.968,50
	9,4,6		APARELHOS SANITÁRIOS			-	-				-		-	-
	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00	0,26%			667,89		1.335,78	1.335,78
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00	0,02%			46,39		92,78	92,78
	9,4,9		SABONETEIRAS E PAREDEIRAS			-	-				-		-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00	0,04%			99,81		199,62	199,62
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	-	2,00	0,02%			53,66		107,32	107,32
	9,4,10		REGISTROS E VÁLVULAS			-	-				-		-	-
	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	-	2,00	0,02%			56,28		112,56	112,56
10	570		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			-	-				-		-	-
	10,1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			-	-				-		-	-
	10,1,2		CHAPISCO			-	-				-		-	-
	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRFPRADO MANUAL. AF_10/2022	m2	633,26	-	633,26	0,71%			5,84		3.698,24	3.698,24
	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESMOLDADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m2	187,00	-	187,00	0,61%			16,86		3.152,82	3.152,82
	10,1,3		EMBOCO			-	-				-		-	-
	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_02/2024	m2	633,26	-	633,26	5,33%			43,73		27.692,46	27.692,46
	10,1,9		CERÂMICAS			-	-				-		-	-
	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A NÍVEL ALTURA DAS PAREDES. AF_07/2023	m2	28,91	-	28,91	0,58%			104,35		3.016,76	3.016,76
	10,2		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES			-	-				-		-	-
	10,2,4		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS			-	-				-		-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	165,62	-	165,62	90,57%	1,49%	1,35%	46,74	7.011,00	7.741,08	730,08
	10,2,10		PEITORES			-	-				-		-	-
	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ACOTIVO. AF_11/2020	m	29,46	-	29,46	0,82%			144,88		4.268,16	4.268,16
	10,3		REVESTIMENTO DE PISOS			-	-				-		-	-
	10,3,2		CONTRAPISO			-	-				-		-	-
	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSEURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	183,00	-	183,00	1,73%			49,19		9.001,77	9.001,77
	10,3,6		PISO CERÂMICO			-	-				-		-	-
	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m2	183,00	-	183,00	2,53%			71,97		13.170,51	13.170,51
	10,3,12		PISO DE CONCRETO			-	-				-		-	-
	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	m2	183,00	-	183,00	2,64%			75,04		13.732,32	13.732,32
	10,3,13		SOLERAS E RODAPÉS			-	-				-		-	-
	88650	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60CM. AF_02/2023	m	120,96	-	120,96	0,32%			13,73		1.660,78	1.660,78
	10,4		PINTURAS			-	-				-		-	-
	10,4,2		EMASSAMENTO			-	-				-		-	-
	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIVRAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	187,00	-	187,00	1,49%			41,55		7.769,85	7.769,85
	10,4,3		MASSA ÚNICA			-	-				-		-	-
	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m2	316,63	-	316,63	2,19%			35,98		11.392,35	11.392,35
	10,4,7		FUNDO PREPARADOR			-	-				-		-	-
	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	633,26	-	633,26	0,56%			4,61		2.919,33	2.919,33
	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	187,00	-	187,00	0,21%			5,85		1.093,95	1.093,95
	10,4,8		PINTURA EM MADEIRA			-	-				-		-	-
	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	19,95	-	19,95	0,09%			24,49		488,58	488,58
	10,4,11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA			-	-				-		-	-
	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	633,26	-	633,26	1,72%			14,09		8.922,63	8.922,63
	10,4,13		PINTURA EM TETOS			-	-				-		-	-
	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	187,00	-	187,00	0,62%			17,13		3.203,31	3.203,31
12	572		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			-	-				-		-	-
	12,1		LIMPEZAS			-	-				-		-	-
	12,1,2		LIMPEZA DE PISOS			-	-				-		-	-
	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF_04/2019	m2	187,00	-	187,00	0,10%			2,75		514,25	514,25
	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019	m2	28,91	-	28,91	0,01%			1,13		32,67	32,67
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREMISTO :		30,86%	% EXECUTADO :		37,15%	SOMAS	193.164,86	520.000,00	326.835,14

OBSERVAÇÕES:

Documento assinado digitalmente



RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 16/07/2026 08:59:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente



LUCAS JOSE CHIOQUETTA

Data: 20/07/2026 21:33:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILBERTO JOAO

ROSSI:031604539

01

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
 Assinatura: 16/07/2026
 CN=GILBERTO JOAO, OU=GILBERTO JOAO, C=BRASIL
 CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL
 CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL
 CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL
 CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO

Assinatura: 16/07/2026

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

CN=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, OU=LUCAS JOSE CHIOQUETTA, C=BRASIL

Valor Total do Contrato:

R\$520.000,00

Medição Acumulada:

193.164,86

Total Anterior:

111.115,70

Valor e % executado desta Medição:

R\$82.049,16

15,78 %

MG CONSTRUCO CIVIL LTDA
 Arq. Rodrigo Pires Franco
 CAU: A91039-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
 Lucas José Chioquetta
 ENGº CIVIL - CREA 4PR 209647-0

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
 GILBERTO JOAO ROSSI

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medicação:	62 / 1 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	21/2026
Data da Vistoria:	08/07/2026

Objeto:

Reforma e ampliação de escola municipal contendo espaço para secretaria, almoxarifado, sala de professores, sala de pedagogia, direção, copa, lavabos e salas de aula.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 15/05/2026 até 08/07/2026.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA



1 | DETALHE DA PLACA

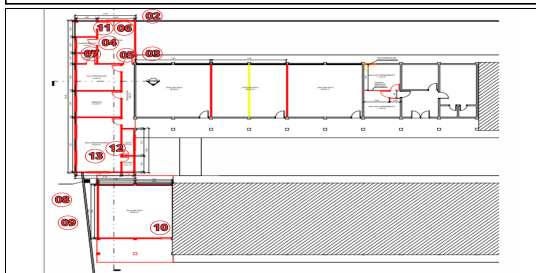

1 | MAPA DAS FOTOS



2 | SERVIÇOS EXECUTADOS



3 | SERVIÇOS EXECUTADOS



4 | SERVIÇOS EXECUTADOS



5 | SERVIÇOS EXECUTADOS



6 | SERVIÇOS EXECUTADOS



7 | SERVIÇOS EXECUTADOS



8 | SERVIÇOS EXECUTADOS



9 | SERVIÇOS EXECUTADOS



10 | SERVIÇOS EXECUTADOS



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/18755/lote/23717/medicao/21414/relatorio-fotografico/10614>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 16 de julho de 2026.

Lucas José Chioquetta
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: PR209647-D

**PARANACIDADE**

Documento assinado eletronicamente por:
Lucas José Chioquetta (16/07/2026 08:53:35)

Nome/controlado do arquivo:
2026071608533507.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071608533507>
