

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2026	Pavimentação em CBUQ Estrada Linha Sede Ouro 13.560,00 m² Esta intervenção está em andamento	Contrato 29/2026	180	09/04/2026	R\$ 3.072.321,12	3,66%

Nº7/2026
Data Inicial: 09/04/2026

**Pavimentação em CBUQ Estrada Linha Sede
Ouro 13.560,00 m²**

R\$ 3.072.321,12

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003741

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3345	2026	12/05/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/03/2027	29	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**74**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**11**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**82**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*5**82**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5908	R\$ 3.079.218,41	18/11/2025	
Contrato	29	2026	80.869.886/0001-43	5909	R\$ 3.072.321,12	06/03/2026	3,66%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5910	Medição	1	Jurisdicionado	10/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	3,66%

5933	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	3,66%
------	---------	---	----------------	------------	------------------------------	---------------------	-------

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900278733775					


Nº7/2026
Data Inicial: 09/04/2026

**Pavimentação em CBUQ Estrada Linha Sede
Ouro 13.560,00 m²**

Documentos

R\$ 3.072.321,12

Proposta de Preços

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA.**

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

MUNICÍPIO DE SULINA - PR

CONCORRÊNCIA

Nº 90004/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CNPJ: 77.744.134/0001-41

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopininho - Paraná



PROPOSTA DE PREÇOS

Chopinzinho, 06 de Março de 2026.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 90004/2026

Objeto: Pavimentação de Estrada Rural/ Vicinal em CBUQ, 13.560,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos: - Estrada rural linha sede ouro

A Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE SULINA, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 3.072.321,12 (Três milhões setenta e dois mil trezentos e vinte um reais e doze centavos).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MOISES DE GASPERIN, portador do CPF 518.634.809-00.

Representante Legal da Proponente:	Assinatura:
Nome: MOISES DE GASPERIN CPF: 518.634.809-00	

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	SULINA	SAM	69			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	1			
Nome da Empresa:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ	77.744.134/0001-41			
Representante Legal:	MOISES DE GASPERIN	Data da Proposta:	06/03/2026 - sex			
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	434,11	3.100,75	3.534,86	0,11%	
2	TERRAPLENAGEM	93.998,67	-	93.998,67	3,05%	
3	DRENAGEM	22.262,17	28.631,58	50.893,75	1,66%	
4	BASE / SUB-BASE	693.986,06	931.214,19	1.625.200,25	52,90%	
5	REVESTIMENTO	270.255,20	942.346,02	1.212.601,22	39,47%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	11.800,10	19.700,43	31.500,53	1,03%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	47.998,21	6.593,63	54.591,84	1,78%	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		1.140.734,52	1.931.586,60	3.072.321,12	100,00%	
		37,13%	62,87%			


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
MOISÉS DE GASPERIN – REP. LEGAL
CPF 518.634.809-00


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO – RESP. TÉCNICA
CREA PR 203.527/D

[illegible][illegible]

Carolina de Araújo
PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO – RESP. TÉCNICA
 CREA PR 203.527/D


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
MOISÉS DE GASPERIN – REP. LEGAL
CPF 518.634.809-00

Coordenador de Ensino

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PROPO
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SULINA	PRIORIDADE Nº 82	SAM	69
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		18/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.079.218,41	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.144.288,87 37,16%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.934.929,54 62,84%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 3.072.321,12	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.140.734,52 37,13%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.931.586,60 62,87%
Empresa Participante: PEDREIRA SANTIAGO LTDA				
Menor Preço (desconto calculado)...	(0,22 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	
TOTAL:	180	R\$ 3.072.321,12		
Medição 1 - Início	30	R\$ 107.902,42	INICIARÁ INSTALANDO A PLACA DA OBRA E EXECUTANDO A TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE AS CAIXAS DE RETENÇÃO;	
Medição 2	30	R\$ 219.258,59	EXECUTARÁ AS REMOÇÕES DOS BUEIROS IDENTIFICADOS, ASSIM COMO EXECUTARÁ OS NOVOS BUEIROS; EXECUTARÁ TAMBÉM A REGULARIZAÇÃO DO TRECHO E A CAMADA DE BLOQUEIO;	
Medição 3	30	R\$ 853.925,36	EXECUTARÁ A SUB-BASE DE TODO O TRECHO;	
Medição 4	30	R\$ 315.939,65	EXECUTARÁ PARCIALMENTE A BASE DO TRECHO;	
Medição 5	30	R\$ 1.128.156,33	EXECUTARÁ O RESTANTA DA BASE E PARCIALMENTE O REVESTIMENTO ASFÁLTICO;	
Medição 6	30	R\$ 447.138,77	EXECUTARÁ O RESTANTE DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E A SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ASSIM COMO AS ALAS DOS BUEIROS, FINALIZANDO A OBRA.	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):  MOISES DE GASPERIN	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):  CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.527/D	Data da Proposta: 06/03/2026 - sex
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE		

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII		
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/20		
IMPOSTOS	ISS =	2,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	5,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,74	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21	0,85
LUCRO	8,69	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	24,03	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	24,03%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):  MOISES DE GASPERIN	Data da Proposta: 06/03/2026 - sex
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):  CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.527/D	

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI	1,00 %	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75 %	
B2	Feriados	3,41 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	
B4	13º Salário	10,58 %	
B5	Licença Paternidade	0,07 %	
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	
B7	Dias de Chuva	1,30 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	
B9	Férias Gozadas	12,30 %	
B10	Salário Maternidade	0,03 %	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	47,14 %	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09 %	
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82 %	
C5	Indenização Adicional	0,32 %	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,75 %	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,82 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34 %	-
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,16 %	-
TOTAL (A+B+C+D)		112,85 %	-


OBSERVAÇÕES:

			
Empresa: PEDREIRA SANT'ASSIS LTDA		Data da Proposta: 23/02/2026 - seg	
MOISÉS DE GASPARIN Representante Empresa:		CAROLINA TAVARES DE ARAUJO Resp. Téc. Empresa:	


 KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
 CONTADORA
 CRC PR N.º 065328/O-8



-25.668660,-52.743235
Sulina, PR

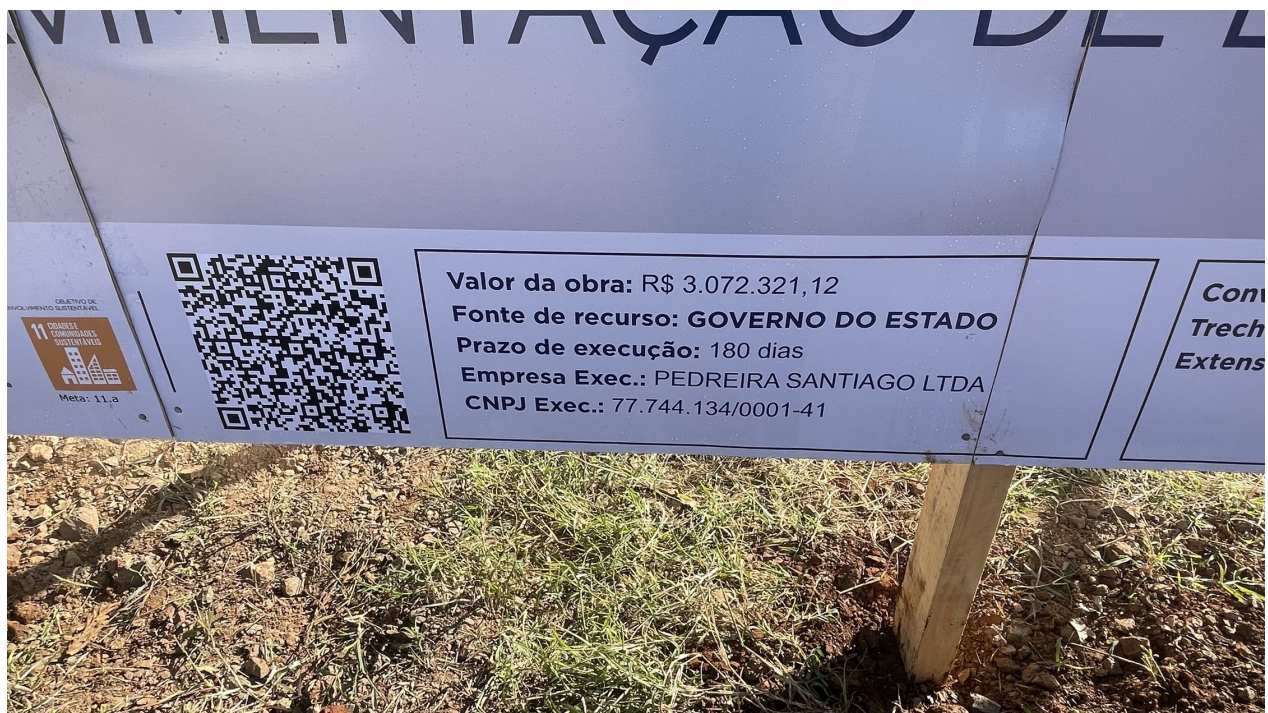





-25.666826, -52.747226
Sulina, PR






















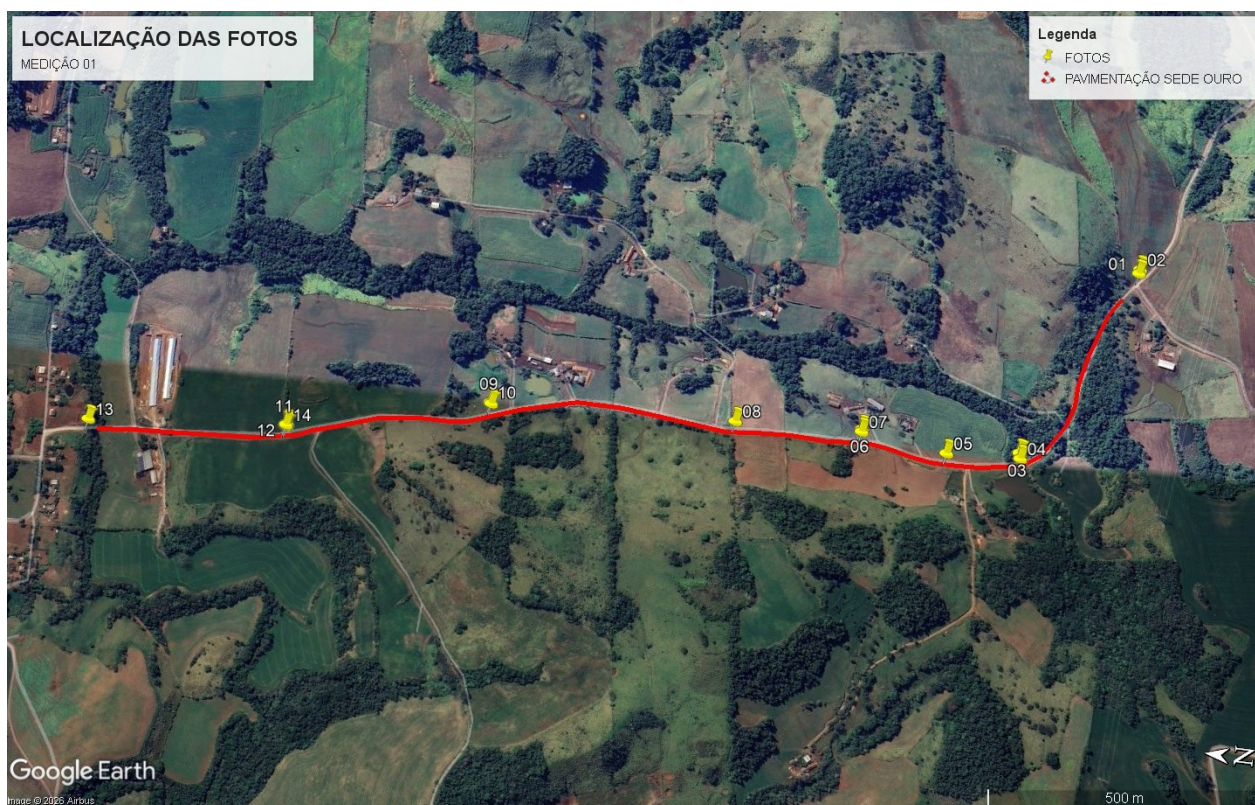



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
CONVÊNIO : Nº **909/2025** SEAB
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **29/2026** DATA ASSINATURA : **19/03/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.072.321,12**
SAM : Nº **69**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **27/05/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **15/09/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **14/03/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA**

Nº DA LICITAÇÃO: **004/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.534,86	100,00%	3.534,86	3.534,86		3.534,86	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	93.998,67	61,56%	93.998,67	57.865,76		57.865,76	61,56%
3		DRENAGEM	11,52%	5.862,50	100,00%	50.893,75	50.893,75		50.893,75	100,00%
4		BASE / SUB-BASE		-		1.625.200,24	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		1.212.601,23	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		31.500,53	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8,25%	4.506,39		54.591,84	-		-	
TOTAL CRONOGRAMA				107.902,42	TOTAL MEDIÇÃO		112.294,37	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	112.294,37	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$112.294,37

3,66 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA, nº 004/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	107.902,42	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	112.294,37	104,07%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

CAROLINA TAVARES
DE

Assinado digitalmente por CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:06346218939
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Recetta Federal do Brasil - RFB, OU=

ANA CAROLINE
DA ROSA
SOLIZA:0094190975

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE DA
ROSA SOUZA:0094190975
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=33683111000107, OU=Secretaria da
Recetta Federal do Brasil - RFB, OU=

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Recetta Federal
do Brasil - RFB, OU=ArFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=81047508000147, OU=videoconferencia, CN=

Município de Sulina

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	23,00		0,15%		195,93	-	4.506,39	4.506,39
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	23,00		0,15%		195,93	-	4.506,39	4.506,39
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	23,00		0,15%		202,02	-	4.646,46	4.646,46
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	23,00		0,15%		202,02	-	4.646,46	4.646,46
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	46,00		0,21%		143,06	-	6.580,76	6.580,76
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	23,00		0,18%		239,96	-	5.519,08	5.519,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	23,00		0,14%		183,93	-	4.230,39	4.230,39
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	23,00		0,05%		65,74	-	1.512,02	1.512,02
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	23,00		0,10%		135,32	-	3.112,36	3.112,36
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	23,00		0,10%		133,62	-	3.073,26	3.073,26
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	1,00		0,25%		7.751,88	-	7.751,88	7.751,88
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	3,51%	% EXECUTADO :		3,66%	SOMAS	112.294,37	3.072.321,12	2.960.026,75

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$3.072.321,12	
	Medição Acumulada:	112.294,37	
	Total Anterior:	-	
	Valor e % executado desta Medição :	R\$112.294,37	3,66 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

CAROLINA TAVARES
DE
ARAUJO:08348218939

Assinado digitalmente por CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939
ND: C=BR, CN=CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939, C=CP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.10 14:10:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
CREA PR 203.527/D

ANA CAROLINE
DA ROSA
SOUZA:009419009
75

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE DA ROSA
SOUZA:00941900975
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPERPRO, OU=RFB e-CPF A1, CN=ANA CAROLINE DA ROSA
SOUZA:00941900975
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 10:12:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR-193.167/D

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453
901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=81047508000147, OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 10:11:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medicação:	69 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Contrato Nº:	29/2026
Data da Vistoria:	27/05/2026

Objeto:

Pavimentação de Estrada Rural/ Vicinal em CBUQ, 13.560,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **09/04/2026** até **27/05/2026**.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DE OBRA



2 | DETALHE PLACA



15 | MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



3 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - BUEIRO COM ALA



4 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - BUEIRO COM ALA



5 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO



6 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - BUEIRO COM ALA



7 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - BUEIRO COM ALA



8 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - BUEIRO COM ALA



9 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - BUEIRO COM ALA



10 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - BUEIRO COM ALA



11 | ESTRADA PARA LINHA SEDE OURO - ESCAVAÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO CONFORME RTV



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/20166/lote/24313/medicao/19818/relatorio-fotografico/8985>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 10 de junho de 2026.

Ana Caroline da Rosa Souza
Diretora do Departamento de Engenharia
Registro no Órgão de Classe: PR 193167/D

**PARANACIDADE**

Documento assinado eletronicamente por:
Ana Caroline da Rosa Souza (10/06/2026 11:28:03)

Nome/controlado do arquivo:
2026061011280304.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026061011280304>
