

OBRA: MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DATA: 01/03/2024			 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br			MED 02		MED ACUMULADA	
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Total R\$	Med% 02	Valor R\$	%	Valor R\$
1									
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,2	R\$ 907,56			100,00%	R\$ 907,56
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	197,00	R\$ 3.599,97			100,00%	R\$ 3.599,97
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	791,58	R\$ 12.749,75			100,00%	R\$ 12.749,75
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	274,12	R\$ 2.697,04	100,00%	R\$ 2.697,04	100,00%	R\$ 2.697,04
1.5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	89,00	R\$ 8.160,41			100,00%	R\$ 8.160,41
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	12,81	R\$ 9.034,06			100,00%	R\$ 9.034,06
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,37	R\$ 8.350,41	50,00%	R\$ 4.175,21	100,00%	R\$ 8.350,41
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	328,94	R\$ 30.784,31	70,00%	R\$ 21.549,02	100,00%	R\$ 30.784,31
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	740,12	R\$ 4.438,44	70,00%	R\$ 3.106,91	100,00%	R\$ 4.438,44
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 17.589,71	70,00%	R\$ 12.312,80	100,00%	R\$ 17.589,71
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 1.417,20			100,00%	R\$ 1.417,20
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 10.622,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	398,75	R\$ 14.411,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	227,00	R\$ 4.494,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL FINAL					R\$ 129.257,31	33,92%	R\$ 43.840,97	77,16%	R\$ 99.728,86
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):									
Itens em verde, foram pagos 100% na MED 01 Valor desta medição: R\$ 43.840,97			Prefeitura Municipal Eng. Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D			Prefeito (a) Paulo Horn			
Empresa J G Derivados de Cimento LTDA									



MUNICÍPIO

CONTRATADA

CONTRATO Nº

OBJETO

MEDIÇÃO Nº

DATA DA VISTORIA

SULINA

J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

165/2023

MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL

01

01/03/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05

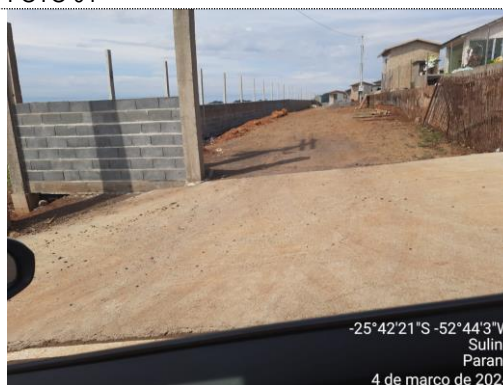


FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10

Sulina, 04 de março de 2024.

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2343-B0C8-19AB-8782

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 05/03/2024 13:22:50 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 05/03/2024 16:38:42 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2343-B0C8-19AB-8782>
