

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	Iluminação do Estádio Municipal Esta intervenção foi concluída	Contrato 6/2023	90	21/02/2023	R\$ 294.118,49	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 21/02/2023

Iluminação do Estádio Municipal

R\$ 294.118,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2286

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5189	2023	11/09/2023	12543
5188	2023	11/09/2023	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2023

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/10/2023	06	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.7*-77	ART (CREA)	17**2*1**66**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*0**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5589	R\$ 335.081,65	03/08/2022	
Contrato	6	2023	80.869.886/0001-43	5590	R\$ 294.118,49	14/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5591	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	100,00%
5496	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/10/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
9001529146	900152914674	1	29/08/2023	25/02/2024	

Nº5/2023
Data Inicial: 21/02/2023

Iluminação do Estádio Municipal

Documentos

R\$ 294.118,49

Município de Sulina

N	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50									
32	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	40	50	10								
33	3	FUNDAÇÕES	60	40									
34	4	ESTRUTURAS	20	50	30								
35	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	50	40								
36	6	COBERTURA		30	70								
37	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		40	60								
38	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	50	40								
39	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	20	30								
310	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		40	60								
311	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	20	40	40								
312	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	40	40								

N	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50									
42	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	30	40	20	10							
43	3	FUNDAÇÕES	50	40	10								
44	4	ESTRUTURAS	20	40	20	20							
45	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	30	40	20							
46	6	COBERTURA		10	70	20							
47	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		30	30	40							
48	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	30	30	30							
49	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	30	20	30							
410	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		30	40	30							
411	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	30	30	30							
412	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	40	20							

N	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	40	20								
52	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	30	10	10						
53	3	FUNDAÇÕES	40	40	20								
54	4	ESTRUTURAS	20	20	20	20	20						
55	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	15	20	30	20	30					
56	6	COBERTURA			60	40							
57	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		10	30	30	30						
58	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	20	30	20	20						
59	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	20	30	20	10						
510	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		10	30	20	20						
511	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	20	20	30	20						
512	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	20	20	20						

N	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	20	30								
62	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	20	10	10						
63	3	FUNDAÇÕES	20	40	40								
64	4	ESTRUTURAS	10	20	20	20	20	10					
65	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	30	25	10					
66	6	COBERTURA			30	10							
67	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	30	30	20					
68	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	20	20	20	20					
69	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	20	20	20	20	10					
610	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			20	30	20	20					
611	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	10	20	20	20	20					
612	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	20	20	20	20	10					

N	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30	30	10								
72	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	20	20	10	10	10	10				
73	3	FUNDAÇÕES	20	30	30	20							
74	4	ESTRUTURAS	10	10	20	20	20	10	10				
75	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	20	15	10				
76	6	COBERTURA			20	40	40						
77	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	20	20	20	20				
78	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	20	20	20	10				
79	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	20	20	20	10	10				
710	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			20	20	20	20	20				
711	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	20	20	20	20	20				
712	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	20	20	20	10	10				

N	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	30	20							
82	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10				
83	3	FUNDAÇÕES	20	20	30	20	10						
84	4	ESTRUTURAS	10	10	10	20	20	10	10	10			
85	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	15	10	10	10			
86	6	COBERTURA			30	30	10						
87	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	20	20	20	10				
88	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	20	20	10	10			
89	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	20	20	10	10	10			
810	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	20	20	20	20	20			
811	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	10	20	20	20	10	10			
812	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	20	20	10	10	10			

N	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10						
92	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10				
93	3	FUNDAÇÕES	20	20	30	20	10						
94	4	ESTRUTURAS	10	10	10	10	20	10	10	10	10		
95	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	20	15	10	10	10	10		
96	6	COBERTURA			20	20	20	20	20				
97	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	20	20	10	10			
98	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	10	20	10	10	10		
99	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	10	20	10	10	10	10		
910	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	20	20	20	10	10		
911	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	20	20	20	10	10	10	10	
912	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	

N	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10						
102	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10			
103	3	FUNDAÇÕES	20	20	20	20	20						
104	4	ESTRUTURAS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10	
105	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10	
106	6	COBERTURA			20	20	20	20					
107	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	20	20	10	10		
108	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10	
109	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10	
1010	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	10	20	20	10	10	
1011	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	20	20	10	10	10	10	
1012	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

N	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	20	20	20	10						
112	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10			
113	3	FUNDAÇÕES	20	20	20	20	20						
114	4	ESTRUTURAS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
115	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
116	6	COBERTURA			10	20	20	20	20				
117	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	10	20	10	10	10	10
118	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	15	10	10	10	10	10	5
119	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	5	10	10	20	10	10	10	10	5
1110	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	10	20	10	10	10	10
1111	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	15	20	10	10	10	10	5
1112	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5

N	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--

Município de Sulina

N	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50									
32	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	40	50	10								
33	3	FUNDAÇÕES	60	40									
34	4	ESTRUTURAS	20	50	30								
35	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	50	40								
36	6	COBERTURA		30	70								
37	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		40	60								
38	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	50	40								
39	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	20	30								
310	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		40	60								
311	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	20	40	40								
312	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	40	40								

N	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50									
42	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	30	40	20	10							
43	3	FUNDAÇÕES	50	40	10								
44	4	ESTRUTURAS	20	40	20	20							
45	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	30	40	20							
46	6	COBERTURA		10	70	20							
47	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		30	30	40							
48	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	30	30	30							
49	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	30	20	30							
410	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		30	40	30							
411	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	30	30	30							
412	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	40	20							

N	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	40	20								
52	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	30	10	10						
53	3	FUNDAÇÕES	40	40	20								
54	4	ESTRUTURAS	20	20	20	20	20						
55	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	15	20	30	20	30					
56	6	COBERTURA			60	40							
57	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		10	30	30	30						
58	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	20	30	20	20	20					
59	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	20	30	20	10	20					
510	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		10	30	20	20	20					
511	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	20	20	30	20	20					
512	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	20	20	20	20					

N	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	20	30								
62	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	20	10	10	10					
63	3	FUNDAÇÕES	20	40	40								
64	4	ESTRUTURAS	10	20	20	20	20	10					
65	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	30	25	10					
66	6	COBERTURA			30	10							
67	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	30	30	20					
68	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	20	20	20	20	20				
69	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	20	20	20	20	20	10				
610	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		10	20	20	20	20	20				
611	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	10	20	20	20	20	20				
612	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	20	20	20	20	10					

N	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30	30	10								
72	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	20	20	10	10	10	10				
73	3	FUNDAÇÕES	20	30	30	20							
74	4	ESTRUTURAS	10	10	20	20	20	10	10				
75	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	20	15	10				
76	6	COBERTURA			20	40	40						
77	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	20	20	20	20	20			
78	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	20	20	20	10				
79	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	20	20	20	10	10	10			
710	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		10	20	20	20	20	20	20			
711	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	20	20	20	20	20	20			
712	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	20	20	20	10	10	10			

N	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	30	20							
82	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10	10			
83	3	FUNDAÇÕES	20	20	30	20	10						
84	4	ESTRUTURAS	10	10	10	20	20	10	10	10			
85	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	15	10	10	10			
86	6	COBERTURA			30	30	30	10					
87	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	20	20	20	10	10			
88	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	20	20	10	10			
89	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	20	20	10	10	10			
810	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		10	10	20	20	20	20	20	10		
811	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	10	20	20	20	20	20	10	10	
812	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	20	20	10	10	10	10		

N	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10						
92	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10				
93	3	FUNDAÇÕES	20	20	30	20	10						
94	4	ESTRUTURAS	10	10	10	10	20	10	10	10	10		
95	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	20	15	10	10	10	10		
96	6	COBERTURA			20	20	20	20	20				
97	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	20	20	10	10	10		
98	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	10	20	10	10	10		
99	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	10	20	10	10	10	10		
910	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	20	20	20	10	10		
911	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	20	20	20	10	10	10	10	
912	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	

N	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10						
102	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10			
103	3	FUNDAÇÕES	20	20	20	20	20						
104	4	ESTRUTURAS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10	
105	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10	
106	6	COBERTURA			20	20	20	20					
107	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	20	20	10	10	10	
108	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10	
109	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10	
1010	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	20	20	10	10	10	
1011	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	20	20	10	10	10	10	
1012	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

N	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	20	20	20	10						
112	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10			
113	3	FUNDAÇÕES	20	20	20	20	20						
114	4	ESTRUTURAS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
115	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
116	6	COBERTURA			10	20	20	20	20				
117	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	10	20	10	10	10	10
118	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	15	10	10	10	10	10	5
119	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	5	10	10	20	10	10	10	10	5
1110	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	10	20	10	10	10	10
1111	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	15	20	10	10	10	10	5
1112	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5

||
||
||

Município de Sulina

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL												
Município:	SULINA			SAM	53	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente		310,000.00	92.51%	
Projeto:	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO			LOTE nº	01	Data	10/28/2023	Dias	70	Data	1/16/2024	nº		Contrapartida do Proponente		25,081.65	7.49%	
Quantidade:	0.00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		335,081.65	100.00%	
GRUPO	SERVIÇOS			N	PARCELAS (%)										TOTAL		% S/	
ITEM				3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início				16/1/24	16/2/24	18/3/24	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99			
	Data Fim				15/2/24	17/3/24	17/4/24	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014.86	0.90	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS				10	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	290.40	0.09	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				10	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	331,142.47	98.82	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	633.92	0.19	
TOTAIS																	335,081.65	100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																		
ITEM				PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL	% S/		
				1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ITEM	ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1,394.60	1,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2,789.19	0.83%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	225.67	0.07%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$	26.87	134.33	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	268.66	0.08%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	2.17	10.87	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	21.74	0.01%
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	30,635.57	153,177.84	122,542.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	306,355.68	91.43%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	2,478.68	12,393.40	9,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	24,786.79	7.40%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB	TESOURO	R\$	0.00	234.59	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	586.47	0.18%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	0.00	18.98	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	47.45	0.01%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	32,057.03	154,941.35	123,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	92.51%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	2,593.69	12,536.08	9,951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,081.65	7.49%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																	335,081.65	100.00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																	335,081.65	100.00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																	OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:			data:		


BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2.00
	PIS =	0.65
	COFINS =	3.00
	CRPB =	0.00
	TOTAL =	5.65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.00	3.45
RISCOS	1.27	0.85
SEGUROS E GRANTIAS	1.00	0.48
DESPESAS FINANCEIRAS	1.39	0.85
LUCRO	8.44	5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	23.84	15.28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	23.84%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15.28%	

GRANDES ITENS				
Município:	SULINA		SAM	53
Projeto:	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO		LOTE nº	01
			(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		3,014.86	0.90%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		0.00	0.00%
3	FUNDACOES		0.00	0.00%
4	ESTRUTURAS		0.00	0.00%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		290.40	0.09%
6	COBERTURA		0.00	0.00%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		0.00	0.00%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		331,142.47	98.82%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		0.00	0.00%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		633.92	0.19%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		0.00	0.00%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		0.00	0.00%
TOTAL GERAL			0.00	335,081.65
Experiência:		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
				0.00

[illegible]

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Unitario	Total
1	Composição		1	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LM/W) , PARA USO EXTERNO COM CURVA IES E CATÁLOGO TÉCNICO - DIVIDIDA EM 10 MÓDULOS DE 100W, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1		8547.48
	Composição	SINAPI	88247	ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	20.03	20.03
	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	25.67	25.67
	Cotação	SINAPI	42243	INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1	8501.78	8501.78
2	Composição			DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO SENSITIVO)		UN	1		96.19
		SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO SENSITIVO)	UN		1	81,92	81.92
		SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.2734	23.51	6.427634

		SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLH		0.2734	28.68	7.841112
--	--	--------	-------	---------------------------------	--	--------	-------	----------




LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623

CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr - CNPJ 40.829.540/0001-05

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL										
Município:	SULINA									
Projeto :	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO									
CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
X		UD	PU	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL	UNIT	(R\$) - SEDU	(R\$) - PM		
1										
1.2										
1.2.3										
COMPOSIÇÃO	ORSE	UN	2434,48	2.646,44	1,00	2.646,44	2.646,44	2.646,44		
11398										
5										
5.1										
5.1.12										
103322	SINAPI	M2	58,62	63,72	4,00	63,72	254,88	254,88		
8										
8.1										
8.1.7										
100588	SINAPI	UN	772,15	839,38	6,00	839,38	5.036,28	5.036,28		
8.2										
8.2.2										
101508	SINAPI	UN	2344,09	2.548,18	1,00	2.548,18	2.548,18	2.548,18		
8.2.3										
8.2.3.4										
97668	SINAPI	M	11,42	12,41	900,00	12,41	11.169,00	11.169,00		

2 de 7



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623

CEP 85506-410 – Pato Branco- Pr – CNPJ 40.829.540/0001-05


	CABOS	CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr - CNPJ 40.829.540/0001-05
8.2.5	SINAPI	ISOLAMENTO 0,8/1KV
8.2.5.2	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
92988	SINAPI	CAIXAS
8.2.8	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
97886	SINAPI	QUADROS DE ENERGIA
8.2.9	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101881	SINAPI	DISJUNTORES
8.2.11	SINAPI	BIPOLARES
8.2.11.2	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93682	SINAPI	TRIPOLARES
8.2.11.3	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101894	SINAPI	OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR
8.2.11.4	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101895	SINAPI	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
8.3	SINAPI	HASTE DE aterramento
8.3.2	SINAPI	HASTE DE aterramento 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
96986	SINAPI	PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO
8.3.3	SINAPI	MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
96988	SINAPI	CORDOALHA
8.3.4	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
96989	SINAPI	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO
x	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LM/W), PARA USO EXTERNO COM CURVAS IES E CATÁLOGO TÉCNICO - DIVIDIDA EM 10 MÓDULOS DE 100W, INCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00M, RESISTENCIA DE 160 DAN, TIPO D
41199	SINAPI-I	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20" KA (TIPO AC)
2	COMPOSIÇÃO	

3 de 7

ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Luminare LED – EIRELI

luciane@quessada.net

A handwritten signature consisting of stylized cursive letters, likely reading "M. H." or similar.



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623

GER 85506-14 - Pato Branco - 40.829.540/0001-05									
POSTE DE CONCRETO ARMADO, TIPO C-23									
41180	SINAPI					UN	3663,87	3.982,87	23.897,22
10									
10.1									
10.1.2									
87878	SINAPI					M2	4,67	5,08	40,64
10.4									
10.4.2									
88495	SINAPI					M2	13,85	15,06	120,48
10.4.3									
87529	SINAPI					M2	33,64	36,57	292,56
10.4.11									
95623	SINAPI					M2	11,83	12,86	102,88
x									294.118,49

40.829.540/0001-05

LUMINARE LED
EIRELITv. Palmeiras, 143
Industrial

Pato Branco 85.506-410

LUMINARE LED EIRELI - CNPJ 40.829.540/0001-05
LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
REPRESENTANTE LEGAL

RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04

ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA PR-188644/D



10 de mai. de 2023 20:30:18
Rua Dom Pedro I
Sulina PR
85565-000
Brasil





med01.xls

ITEM		CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
				% MÊS	(R\$) MÊS	MEDIDA		
01	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OB	50,00%	1.323,22	100,00%	2.646,44	2.646,44
02	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10,00%	25,48	100,00%	254,88	254,88
03	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROT	10,00%	28.865,33	100,00%	288.653,37	288.653,37
04	10		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS		-	100,00%	556,56	556,56
05					-		-	-
06					-		-	-
07					-		-	-
08					-		-	-
09					-		-	-
10					-		-	-
11					-		-	-
12					-		-	-
13					-		-	-
14					-		-	-
15					-		-	-
16					-		-	-
17					-		-	-
18					-		-	-
19					-		-	-
20					-		-	-
21					-		-	-
22					-		-	-
23					-		-	-
24					-		-	-
25					-		-	-
26					-		-	-

Importa a presente medição no valor total de		R\$	292.111,25
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº, TP 0006/2022 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471 977	Assinado de forma digital por ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977 Dados: 2023.07.13 09:00:18 -03'00'	 Luciano S. Santiago Engenheiro Civil Fiscalização Municipal	 PAULO HORN Prefeito Municipal
Ana Terez Gonçalves Vieira Engenheira Eletricista Empresa Executora			



med01.xls



PREFITURA MUNICIPAL DE SULINA

ESTADO DO PARANÁ

med01.xls

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
X		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO										
1		LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LMW) , PARA USO EXTERNO	UN	24,00	100,00%	0,6164	61,64%	7502,88	-	-	-	
41199		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150	UN	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	749,48	180.071,52	180.071,52	-	
2		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (UN	4,00	100,00%	0,0014	0,14%	104,56	749,48	749,48	-	
41180		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1	UN						418,24	418,24	-	
		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE	UN						-	-	-	
41216		1000 DAN TIPO B-1,5	UN	6,00	100,00%	0,0749	7,49%	3648,33	21.889,98	21.889,98	-	
10		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-	-	-	
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							-	-	-	
10.1.2		CHAPISCO							-	-	-	
87878		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER D	M2	8,00	100,00%	0,0001	0,01%	5,08	-	-	-	
10.4		PINTURAS							40,64	40,64	-	
10.4.2		EMASSAMENTO							-	-	-	
88495		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,00	100,00%	0,0004	0,04%	15,06	-	-	-	
10.4.3		MASSA ÚNICA							120,48	120,48	-	
87529		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂN	M2	8,00	100,00%	0,0010	0,10%	36,57	-	-	-	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							292,56	292,56	-	
95623		APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIO	M2	8,00	100,00%	0,0004	0,04%	12,86	-	-	-	
									102,88	102,88	-	
									-	-	-	
									-	-	-	
				% PREVISTO :		% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	292.111,25	292.111,25	-
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:	R\$	292.111,25	
									Medição Acumulada:	R\$	-	
									Total Anterior:	R\$	-	
									Valor Desta Medição:	R\$	292.111,25	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
Ana Terez Gonçalves Vieira Engenheira Eletricista Empresa Executora			ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:0096 5471977 <small>Assinado de forma digital por ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977 Dados: 2023.07.13 08:54:58 -03'00'</small>			 Luciano S. Santiago Engenheiro Civil Fiscalização Municipal			 PAULO HORN Prefeito Municipal			



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br


www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	SULINA
PROJETO/LOTE	Nº 53 / LOTE Nº01
PROGRAMA	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
CONTRATADA	LUMINARE LED EIRELI
CONTRATO Nº	06/2023
OBJETO	ESTÁDIO MUNICIPAL

MEDIÇÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	26/05/2023

Iluminação do estádio municipal

MAPA / CROQUI / PLANTA BAIXA COM A MARCAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO

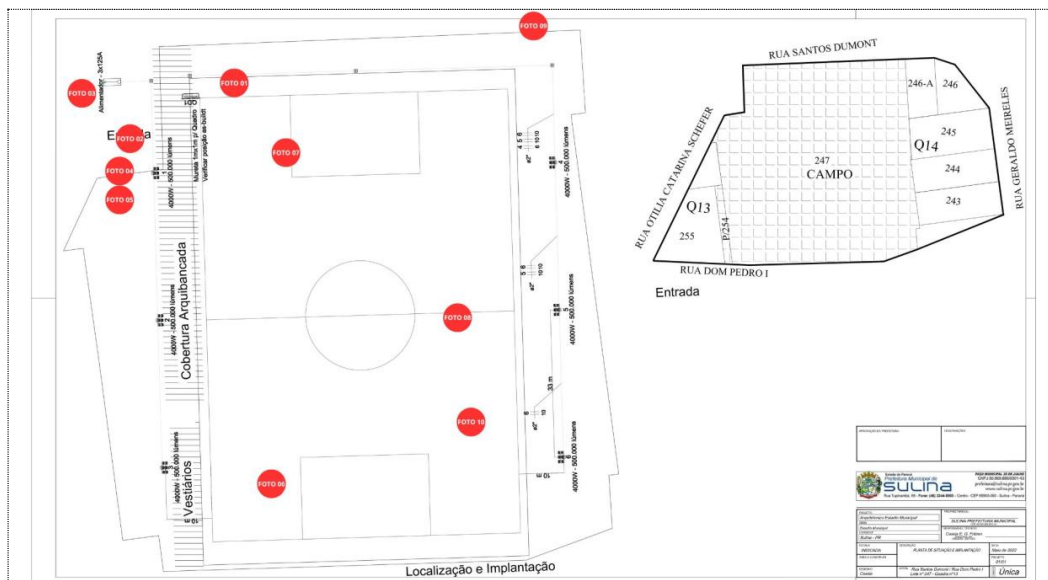



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

PLACA DA OBRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01

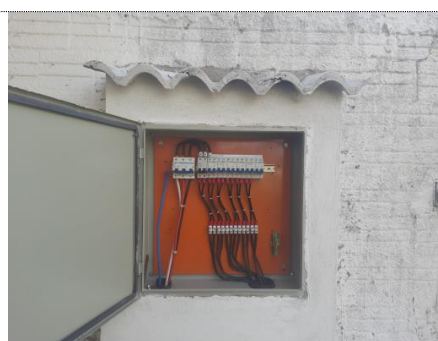


FOTO 02



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05

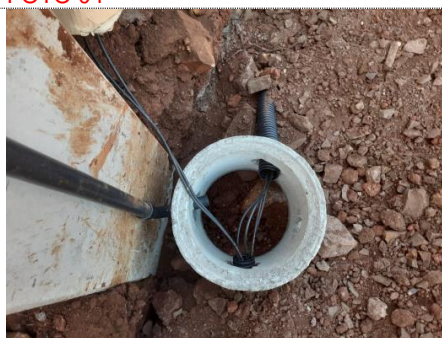


FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



10 de mai. de 2023 20:30:18
Rua Dom Pedro I
Sulina PR
85565-000
Brasil

FOTO 11



FOTO 12

Sulina, 26 de maio de 2023.

Luciano S. Santiago
CREA-PR: 31879/D
ART de fiscalização: 1720230729820



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E
A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.015.29146/74-001

Período: 27/02/2023 a 31/07/2023

Endereço: RUA OTILIA CATARINA SCHEFFER, 247, CENTRO, SULINA/PR, 85565-000

Contribuinte: LUMINARE LED LTDA

CNPJ: 40.829.540/0001-05

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil:

I - que consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou sobre o qual tenha sido proferida decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencido; e

II - que não consta débito inscrito em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, conforme disposto no art. 206 do CTN.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever outros débitos que vierem a ser apurados, referentes à obra de construção civil objeto da aferição.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>> ou <<https://www.gov.br/pgfn/pt-br>>.





Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.





Emitida às 09:12:49 do dia 29/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2024.

Código de controle da certidão: **B573.5EDA.D420.9FC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA			
PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO			
			
SUPERVISÃO: PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO			
MUNICÍPIO: SULINA			
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO LUMINARE LED EIRELI		SIT 55451	SAM 53
		LOTE 1	CONCLUSÃO: 22/05/2023
		CNPJ/ CPF 40829540000105	Nº CONTRATO: 06/2023
VALOR: R\$ 292.111,25 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****)			
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Iluminação do estádio municipal			
LOCALIZAÇÃO: RUA OTÍLIA CATARINA SCHEFER - LOTE 247 NO PERÍMETRO URBANO.			
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Construção de ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL com a execução dos serviços de: serviços preliminares e administração de obra; Alvenaria; Instalações Elétricas, Revestimentos e demais itens e especificações constantes em projetos.			
Em vinte e um de agosto do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.			
<p> Ana Tereza Gonçalves Vieira Eng. Eletricista - CREA PR nº 188.644/D RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA</p> <p> Luciano S. Santiago Eng. Civil - CREA PR nº 31.789/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA</p> <p> PAULO HORN PREFEITO MUNICIPAL</p>			
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.			
Sulina, 21 de agosto de 2023			
<p>Gildete Cristina Bonetti Vescovi Arq. Urb. - CAU nº A19081-0 Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA			
PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO			
			
SUPERVISÃO: PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO			
MUNICÍPIO: SULINA			
EMPRESA CONTRATADA/PROPRIETÁRIO LUMINARE LED EIRELI		SIT 55451	SAM 53
		LOTE 1	CONCLUSÃO: 22/05/2023
		CNPJ/CPF 40829540000105	Nº CONTRATO: 06/2023
VALOR: R\$ 292.111,25 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****)			
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Iluminação do estádio municipal			
LOCALIZAÇÃO: RUA OTÍLIA CATARINA SCHEFER - LOTE 247 NO PERÍMETRO URBANO.			
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Construção de ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL com a execução dos serviços de: serviços preliminares e administração de obra; Alvenaria; Instalações Elétricas, Revestimentos e demais itens e especificações constantes em projetos.			
<p>Em vinte e dois de maio do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório da obra acima referida, executada em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto e na documentação referente ao contrato em epígrafe.</p> <p>Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 90 (noventa) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.</p>			
<p> Ana Tereza Gonçalves Vieira Eng. Eletricista - CREA PR nº 188.644/D RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA</p> <p> Luciano S. Santiago Eng. Civil - CREA PR nº 31.789/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA</p> <p> PAULO HORN PREFEITO MUNICIPAL</p>			
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.			
Sulina, 22 de maio de 2023			
<p>_____ Gildete Cristina Bonetti Vescovi Arq. Urb. - CAU nº A19081-0 Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE</p>			
