


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	RECAPE SANTO ISIDORO - CV 532-2024 - SECID Esta intervenção foi concluída	Contrato 122/2024	180	01/02/2025	R\$ 744.000,00	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14612; 14613; 14614; 14615; 14616; 14617

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
999	2025	01/02/2025	12557
1000	2025	01/02/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/02/2025

Responsabilidades Técnica


Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*1*.4**-52	ART (CREA)	17**2*3**74**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*2*.4**-03	ART (CREA)	17**2*2**06**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**77**	Fiscalização	Sim


Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61624	R\$ 936.097,47	01/02/2025	
Contrato	122	2024	78.121.936/0001-68	61625	R\$ 744.000,00	01/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61647	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2024	100,00%
61658	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/04/2025			



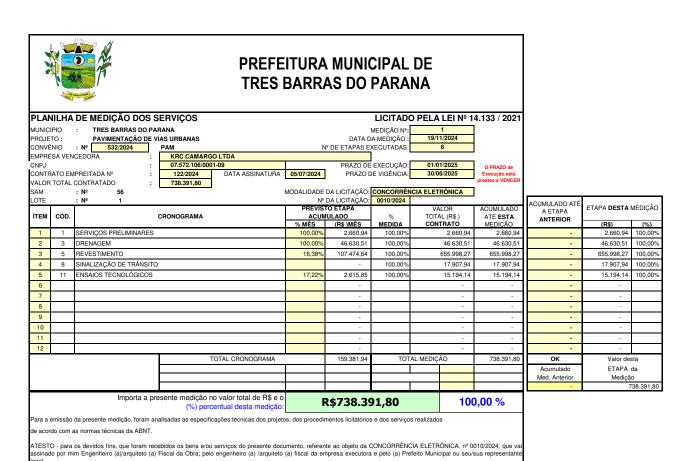

Documento assinado digitalmente

egal.

KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO Data: 10/12/2024 17:03:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941 Dados: 2024.12.05 16:00.27 -03'00'

GERSO FRANCISCO Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSSO:4098866000 GUSSO:40988660059 Dados: 2024.12.05 15:59:39-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA Jean Carlos de Lima ENGº CIVIL - CREA PR-167.397/D KRC CAMARGO LTDA Kaciano Ricardo Cruz Camargo ENGº CIVIL - CREA PR-/D

PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA GERSO FRANCISCO GUSSO



