

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	Iluminação Publica Loteamento Os Pioneiros Esta intervenção foi concluída	Contrato 2/2025	60	03/02/2025	R\$ 79.900,00	100,00%

Nº1/2025 **Data Inicial: 03/02/2025** Iluminação Publica Loteamento Os Pioneiros R\$ 79.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10002984; 10002989; 2170

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
3201	2025	29/04/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	05/05/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
27/01/2026	02	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*1*.3**-14	ART (CREA)	17**2*0**85**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.*9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*3**22**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	09*.*9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*3**22**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**20**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5803	R\$ 91.051,56	26/09/2024	
Contrato	2	2025	80.869.886/0001-43	5804	R\$ 79.900,00	06/12/2024	100,00%


Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5805	Medição	1	Jurisdicionado	07/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2025	100,00%

5814 Conclusão 2 Jurisdicionado 02/06/2025

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
90024188287	9				
0	900241882879	1	11/06/2025	08/12/2025	































o por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, GILBERTO JOAO ROSSI e DEIVERSON LUIZ TABORDA ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A966-34B1-D9E9-B8D9 e informe o código A966-34B1-D9E9-B8D9

Município de Sulina

CAIXA

BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

№ OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROPONENTE / TOMADOR Nº TransfereGOV INÍCIO DE OBRA PREFEITURA MUNICIPAL O ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTOS OS PIONEIROS 00/01/00 **EMPRESA EXECUTORA** CNPJ REGIME DE EXECUÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO Nº MEDIÇÃO TDA ENGENHARIA LTDA 36.316.345/0001-04 (SELECIONAR) 00/01/1900 a 07/05/2025

Realizado Acumulado: 100,00%

	Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R\$)			\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do	CTEF:			TOTAL:	79.900,00			-	-	79.900,00	79.900,00
1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTO OS PIONEIROS	-	-	-	79.900,00		-	-		79.900,00	79.900,00
1.1.	INSTALAÇÃO	-	-	-	79.900,00	-	-	-	-	79.900,00	79.900,00
1.1.1.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	714,72	7.147,20	-	10,00	10,00	-	7.147,20	7.147,20
1.1.2.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 400 W	UN.	4,00	450,12	1.800,48	-	4,00	4,00	-	1.800,48	1.800,48
1.1.3.	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 400 W	UN.	4,00	363,60	1.454,40	-	4,00	4,00	-	1.454,40	1.454,40
1.1.4.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	14,00	1.433,22	20.065,08	-	14,00	14,00	-	20.065,08	20.065,08
1.1.5.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENCASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	10,00	753,26	7.532,60	-	10,00	10,00	-	7.532,60	7.532,60
1.1.6.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	1.050,98	4.203,92	-	4,00	4,00	-	4.203,92	4.203,92
1.1.7.	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	181,22	2.537,08	-	14,00	14,00	-	2.537,08	2.537,08
1.1.8.	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO ISOLADO COM XLPE PARA 0,6/1.0 kV, BITOLA DE 70 mm2 - QUADRUPLEX	М	600,00	36,68	22.008,00	-	600,00	600,00	-	22.008,00	22.008,00
1.1.9.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 0MM95MM E DERIVAÇÃO 1.5-10MM	UN.	40,00	12,47	498,80	-	40,00	40,00	-	498,80	498,80
1.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	14,00	41,61	582,54	-	14,00	14,00	-	582,54	582,54
1.1.11.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	60,00	32,88	1.972,80	-	60,00	60,00	-	1.972,80	1.972,80
1.1.12.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	60,00	40,11	2.406,60	-	60,00	60,00	-	2.406,60	2.406,60
1.1.13.	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	25,00	307,62	7.690,50	-	25,00	25,00	-	7.690,50	7.690,50

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR

Local

o por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, GILBERTO JOAO ROSSI e DEIVERSON LUIZ TABORDA lificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A966-34B1-D9E9-B8D9 e informe o código A966-34B1-D9E9-B8D9

Município de Sulina

BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		№ OPERAÇÃO 0		TransfereGOV APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTOS OS PIONEIROS			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇ	ÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO	
02/2025	TDA ENGENHARIA LTDA	36.316.345/0001-04	(SELECIONAR)		00/01/1900 a 07/05/2025	1	

Realizado Acumulado: 100,00%

	Orçamento Contratado					Evol	ução Física (Qtde.)	Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do C	TEF:			TOTAL:	79.900,00	-	-	-	-	79.900,00	79.900,00
	Data	_				CREA/CAU:	31879/D				

ART/RRT: 1720250971074



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br



MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	TDA ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº	02/2025
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBTER APROVAÇÃO JUNTO A COPEL E A EXECUTAR A EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO OS PIONEIROS DO MUNICÍPIO DE SULINA PR
MEDIOÃO NO	O4 FINIAL

MEDIÇÃO № 01 - FINAL DATA DA VISTORIA 07/05/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO












PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br



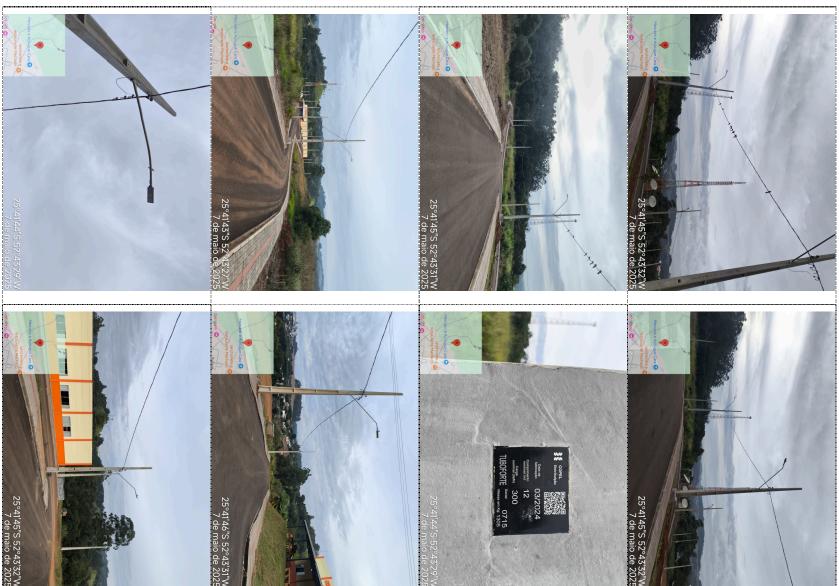



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 07 de maio de 2025.

Luciano S. Santiago Engenheiro Fiscal da Obra ART: 1720250971074 CREA-PR 31879/D



VERIFICAÇÃO DAS **ASSINATURAS**



Código para verificação: A966-34B1-D9E9-B8D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 07/05/2025 10:54:27 GMT-03:00
 - Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- GILBERTO JOAO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 08/05/2025 09:04:00 GMT-03:00 Papel: Parte Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- DEIVERSON LUIZ TABORDA (CPF 072.XXX.XXX-14) em 12/05/2025 16:59:20 GMT-03:00 Papel: Parte Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A966-34B1-D9E9-B8D9



PACO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80 869 886/0001-43 preferrura@sukna pr gov br www.sulina.pr.gov.br



TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - PROVISÓRIO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra Provisório, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo Licitatório Concorrência Eletrônica nº 19/2024, Contrato nº 02/2025, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBTER APROVAÇÃO JUNTO A COPEL E A EXECUTAR A EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO OS PIONEIROS DO MUNICÍPIO DE SULINA PR.

Empresa Executora: TDA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 36.316.345/0001-04.

Valor total do contrato: R\$ 79.900,00 (Setenta e nove mil e novecentos reais).

Vigência do contrato: vigência de 01 (um) ano, contada da data do contrato, válido entre 21 de novembro de 2024 até 21 de novembro de 2025.

Prazo de execução: O prazo de vigência de execução vigorou até a data de 27 de abril de 2025, conforme termo aditivo ao contrato de 25 de março de 2025.

ART de Execução: 1720250828573.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 07 de maio de 2025.

Gilberto J. Ross Prefeito Municipal Luciano S. Santiago

Engenheiro Civil Fiscal da Obra

Gestor do Contrato

36.316.345/0001-04

TDA ENGENHARIA LTDA

RUA 01, N° 30 PARQUE INDUSTRIAL - CEP: 85 610-000

RENASCENÇA
