

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2022	Reforma da Praça no Bairro Cristo Rei <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 271/2021	360	01/08/2022	R\$ 772.298,02	100,00%

Nº10/2022  
Data Inicial: 01/08/2022

## Reforma da Praça no Bairro Cristo Rei

R\$ 772.298,02

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41132

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1638	2022	01/08/2022	12249
1639	2022	01/08/2022	12249
4002	2024	12/07/2024	12249
4001	2024	12/07/2024	12249
4072	2024	24/07/2024	12249
4071	2024	24/07/2024	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/08/2022

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/11/2022	271/2022	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	94**4*6	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	10**1*4*	Orçamento	Sim
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	12**3*3*	Fiscalização	Sim
CPF	17*.5*.4**-72	ART (CREA)	17**2*3**66**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001063	R\$ 772.298,02	22/04/2021	
Contrato	271	2021	76.995.414/0001-60	9001064	R\$ 772.298,02	30/11/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001065	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	5,24%
9001065	Medição	2	Jurisdicionado	22/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	5,24%
9001065	Medição	3	Jurisdicionado	28/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	5,24%
9001105	Medição	4	Jurisdicionado	23/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	5,25%
9001105	Medição	5	Jurisdicionado	22/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	5,25%
9001105	Medição	6	Jurisdicionado	10/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	5,25%
9001141	Medição	7	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	6,48%
9001141	Medição	8	Jurisdicionado	14/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	6,48%
9001141	Medição	9	Jurisdicionado	10/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	6,48%
9001158	Medição	10	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	12,52%
9001168	Paralisação	11	Jurisdicionado	10/06/2023			
9001193	Medição	12	Jurisdicionado	09/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	21,07%
9001193	Medição	13	Jurisdicionado	09/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	21,07%
9001193	Medição	14	Jurisdicionado	09/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	21,07%
9001209	Medição	15	Jurisdicionado	14/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	49,07%
9001209	Medição	16	Jurisdicionado	14/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	49,07%
9001221	Medição	17	Jurisdicionado	29/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	93,98%
9001221	Medição	18	Jurisdicionado	29/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	93,98%
9001221	Medição	19	Jurisdicionado	29/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	93,98%
9001259	Paralisação	20	Jurisdicionado	06/05/2024			
9001277	Medição	21	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 271/2021	100,00%
9001278	Conclusão	22	Jurisdicionado	31/07/2024			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

900103597179

Nº10/2022  
Data Inicial: 01/08/2022

# Reforma da Praça no Bairro Cristo Rei

## Documentos

R\$ 772.298,02



























LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 28 W  
esquina Rua Paraná



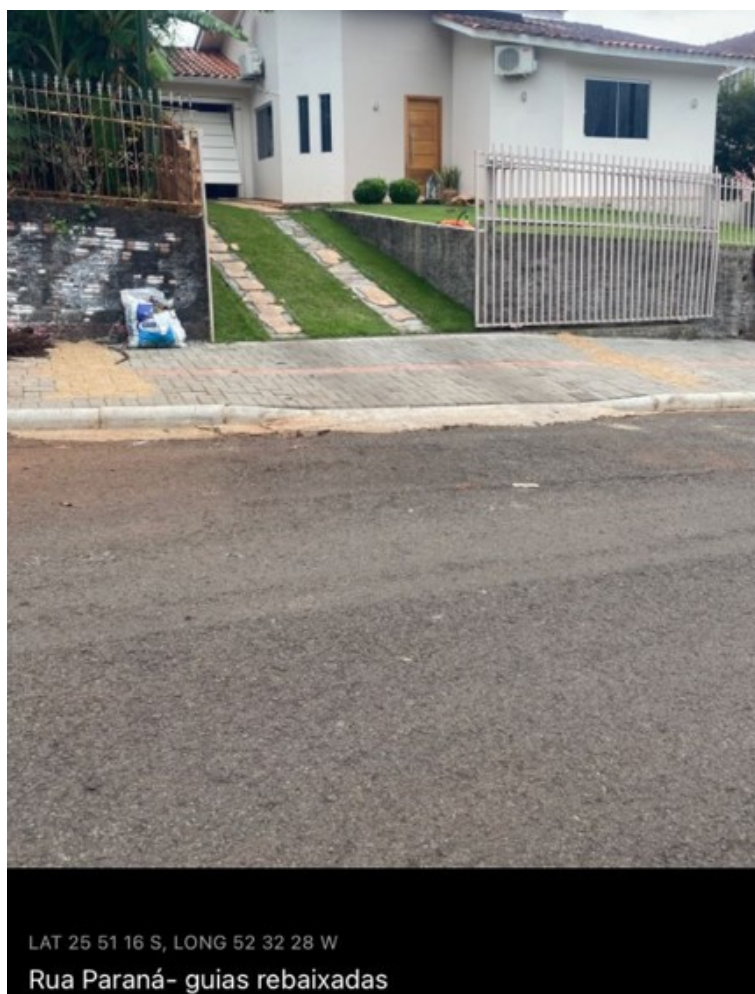

LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 28 W

Rua Paraná- guias rebaixadas

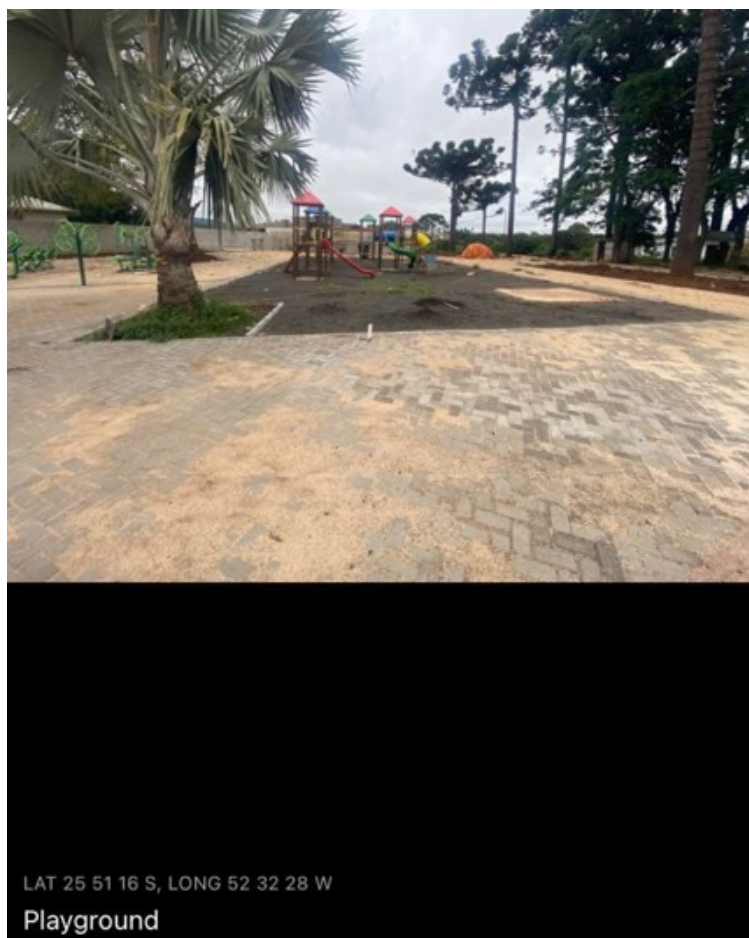

LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 28 W

Playground







LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 27 W

Esquina Rua Paraná



LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 27 W

Praça Geral



LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 27 W

Pavimentação paver



LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 27 W

Visao geral




LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 27 W

Drenagem pluvial do banheiro



LAT 25 51 16 S, LONG 52 32 27 W

Degrau de acesso ao bicicletário

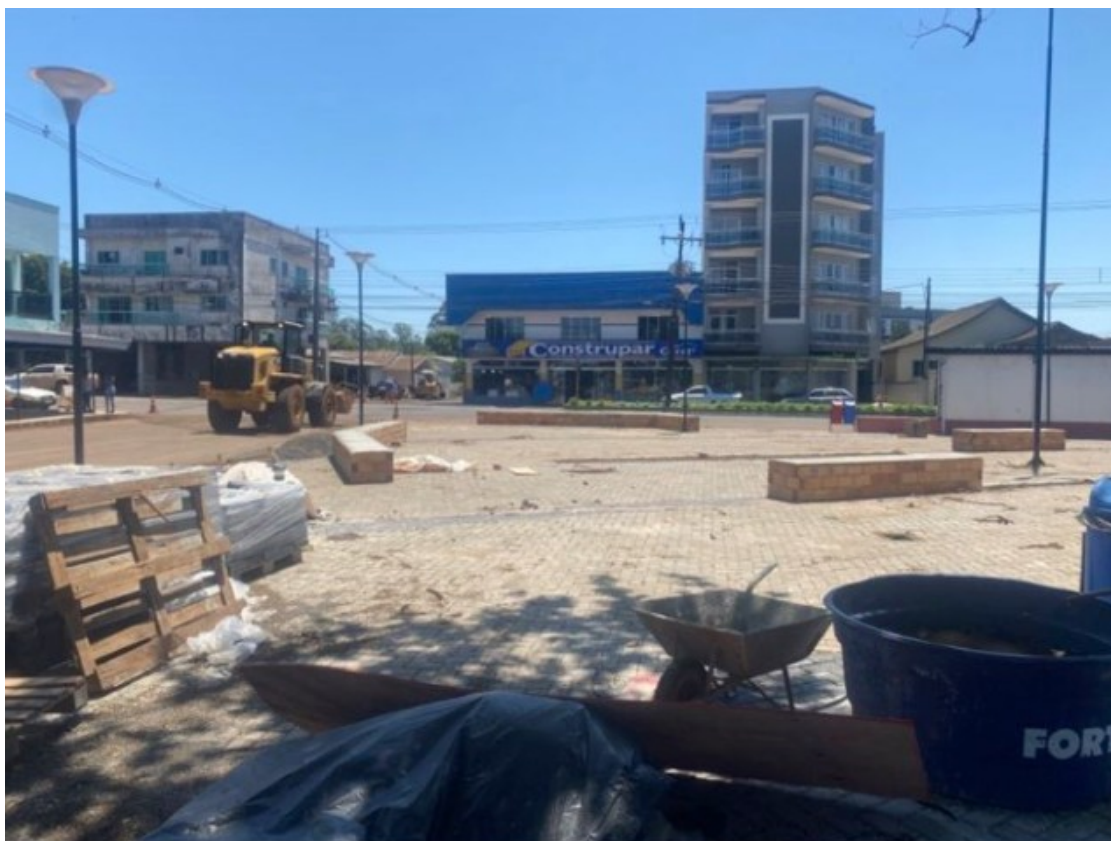

LAT 25 51 17 S, LONG 52 32 28 W  
avenida



LAT 25 51 17 S, LONG 52 32 28 W

escada paver



LAT 25 51 17 S, LONG 52 32 28 W

rua parana



LAT 25 51 17 S, LONG 52 32 28 W

alambrado



LAT 25 51 17 S, LONG 52 32 28 W

lixearas



LAT 25 51 17 S, LONG 52 32 28 W

bebedouros













## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA REFORMA PRAÇA CRISTO REI 7ª MEDIÇÃO



Placa de Obra



Avenida XV de Novembro

