

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2026	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E QUADRA DE AREIA Esta intervenção está em andamento	Contrato 356/2025	90	09/04/2026	R\$ 586.436,93	81,67%

Nº8/2026
Data Inicial: 09/04/2026

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E QUADRA DE AREIA

R\$ 586.436,93

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

27864; 45437

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1432	2026	09/03/2026	12249
1433	2026	09/03/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1020	4724	01/05/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/01/2027	356/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*6**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*6**63**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*0**86**	Fiscalização	Sim
CPF	10*.7*.4**-50	ART (CREA)	17**2*0**05**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001441	R\$ 586.436,93	21/10/2025	
Contrato	356	2025	76.995.414/0001-60	9001442	R\$ 557.114,90	11/12/2025	81,67%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001443	Medição	1	Jurisdicionado	15/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 356/2025	53,32%
9001443	Medição	2	Jurisdicionado	15/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 356/2025	53,32%
9001497	Medição	3	Jurisdicionado	16/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 356/2025	63,87%
9001526	Medição	4	Jurisdicionado	19/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 356/2025	81,67%

Matrículas de Obras


Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900281746676					

Nº8/2026
Data Inicial: 09/04/2026


REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E QUADRA DE AREIA


Documentos

R\$ 586.436,93

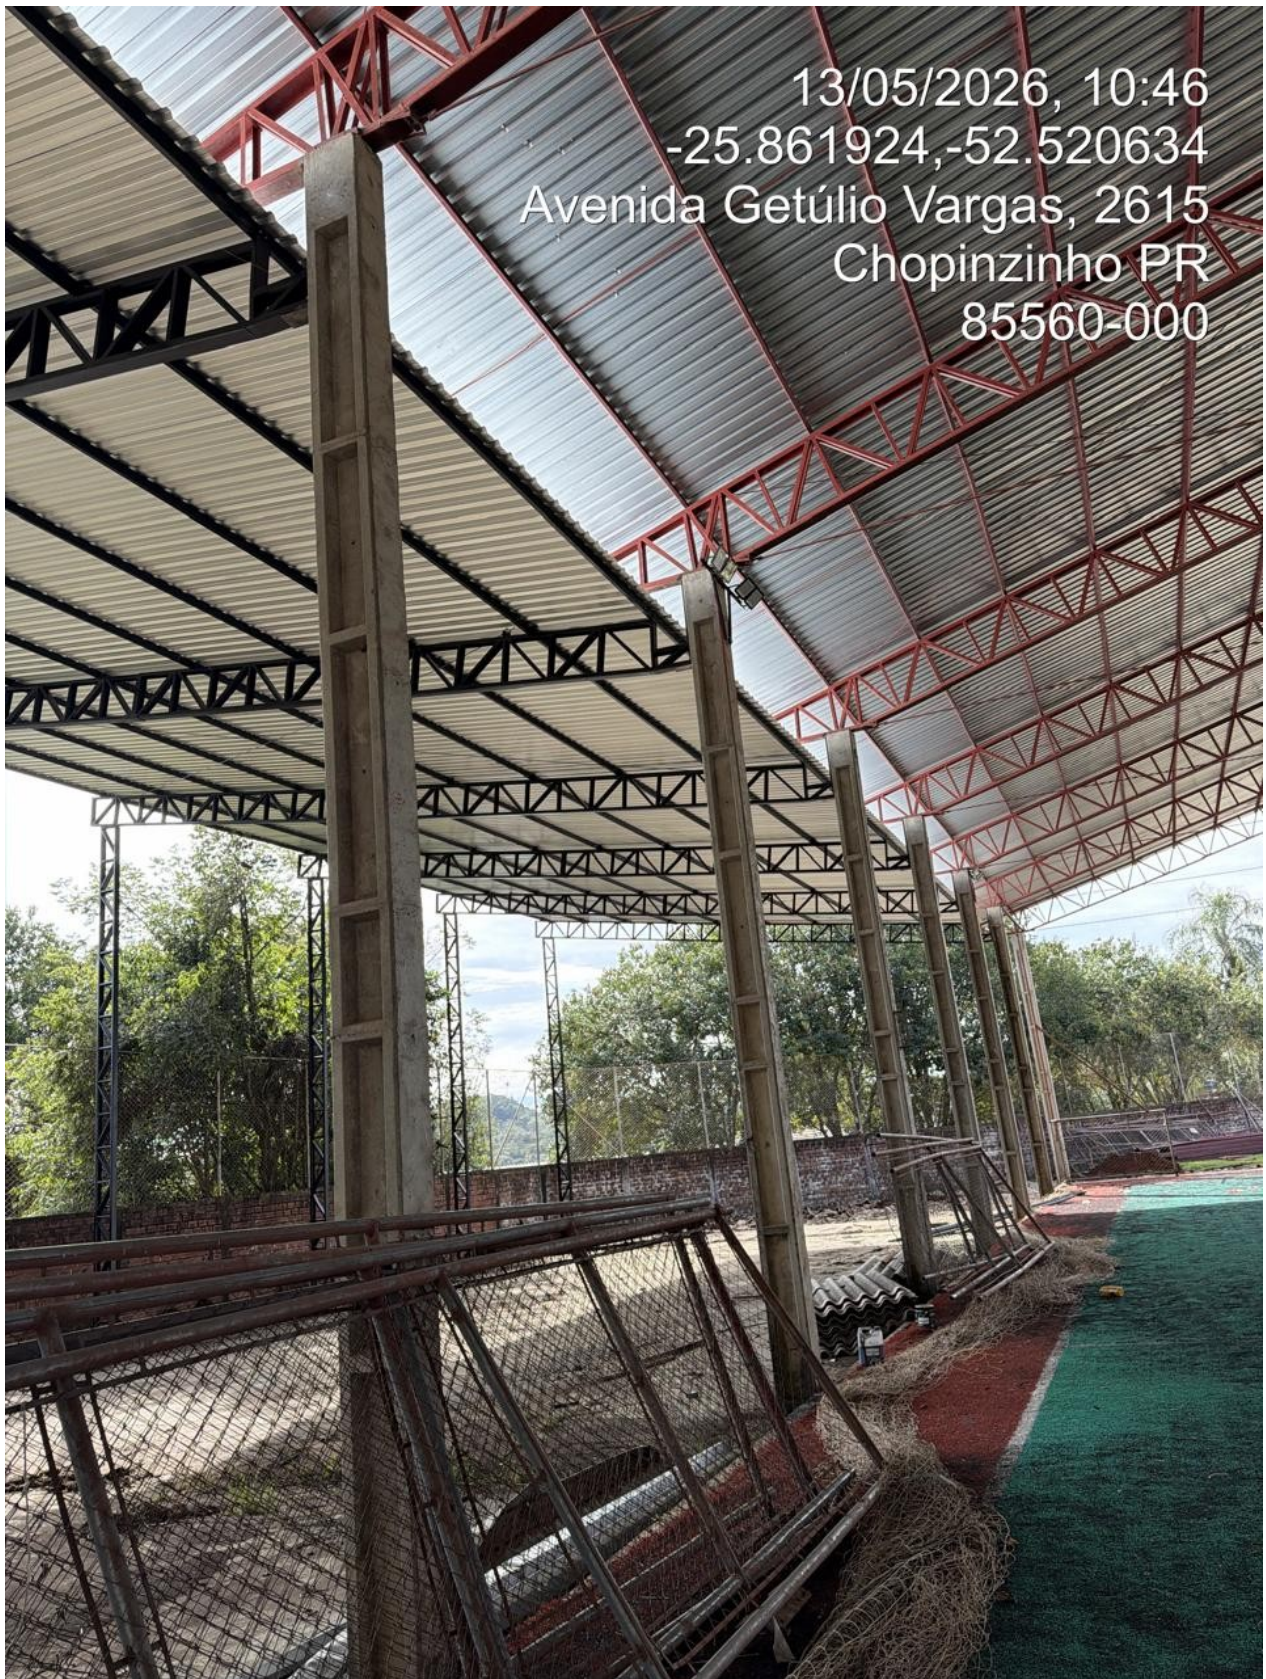



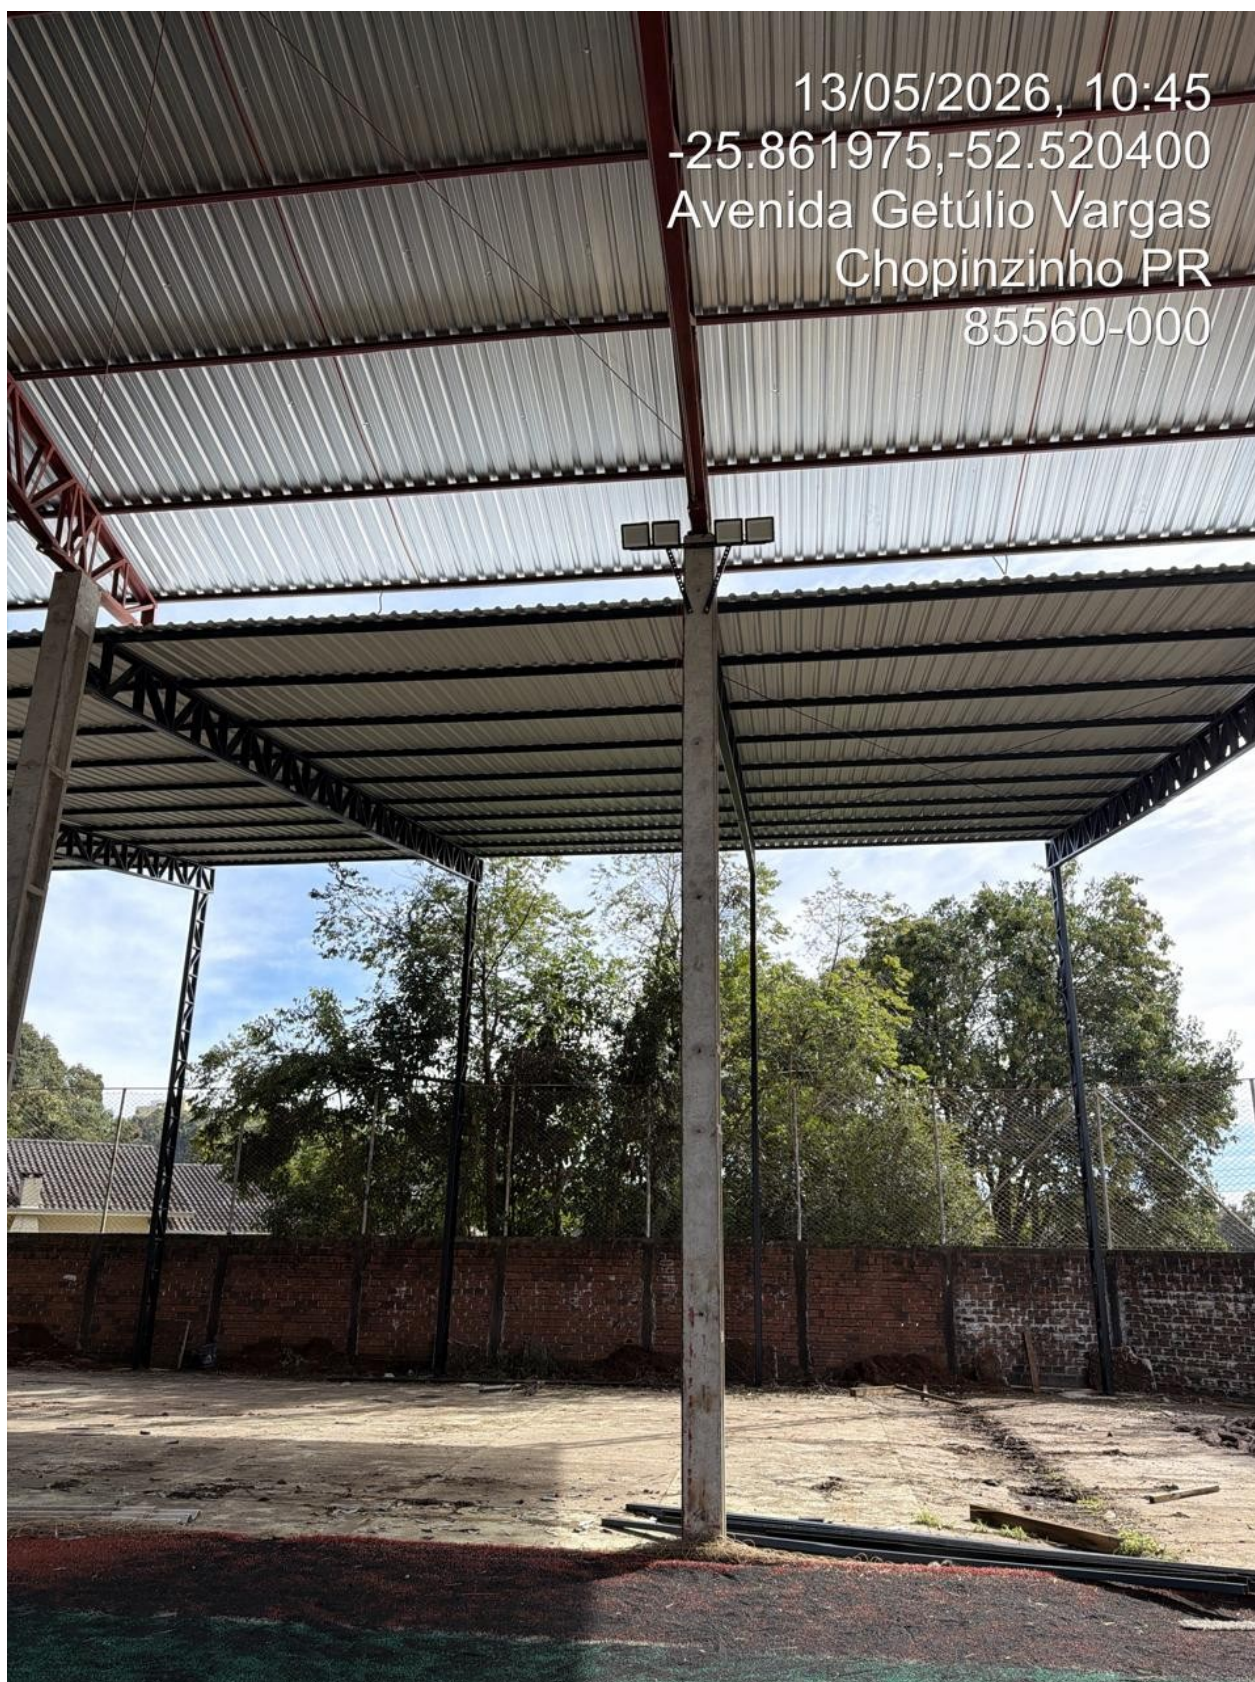

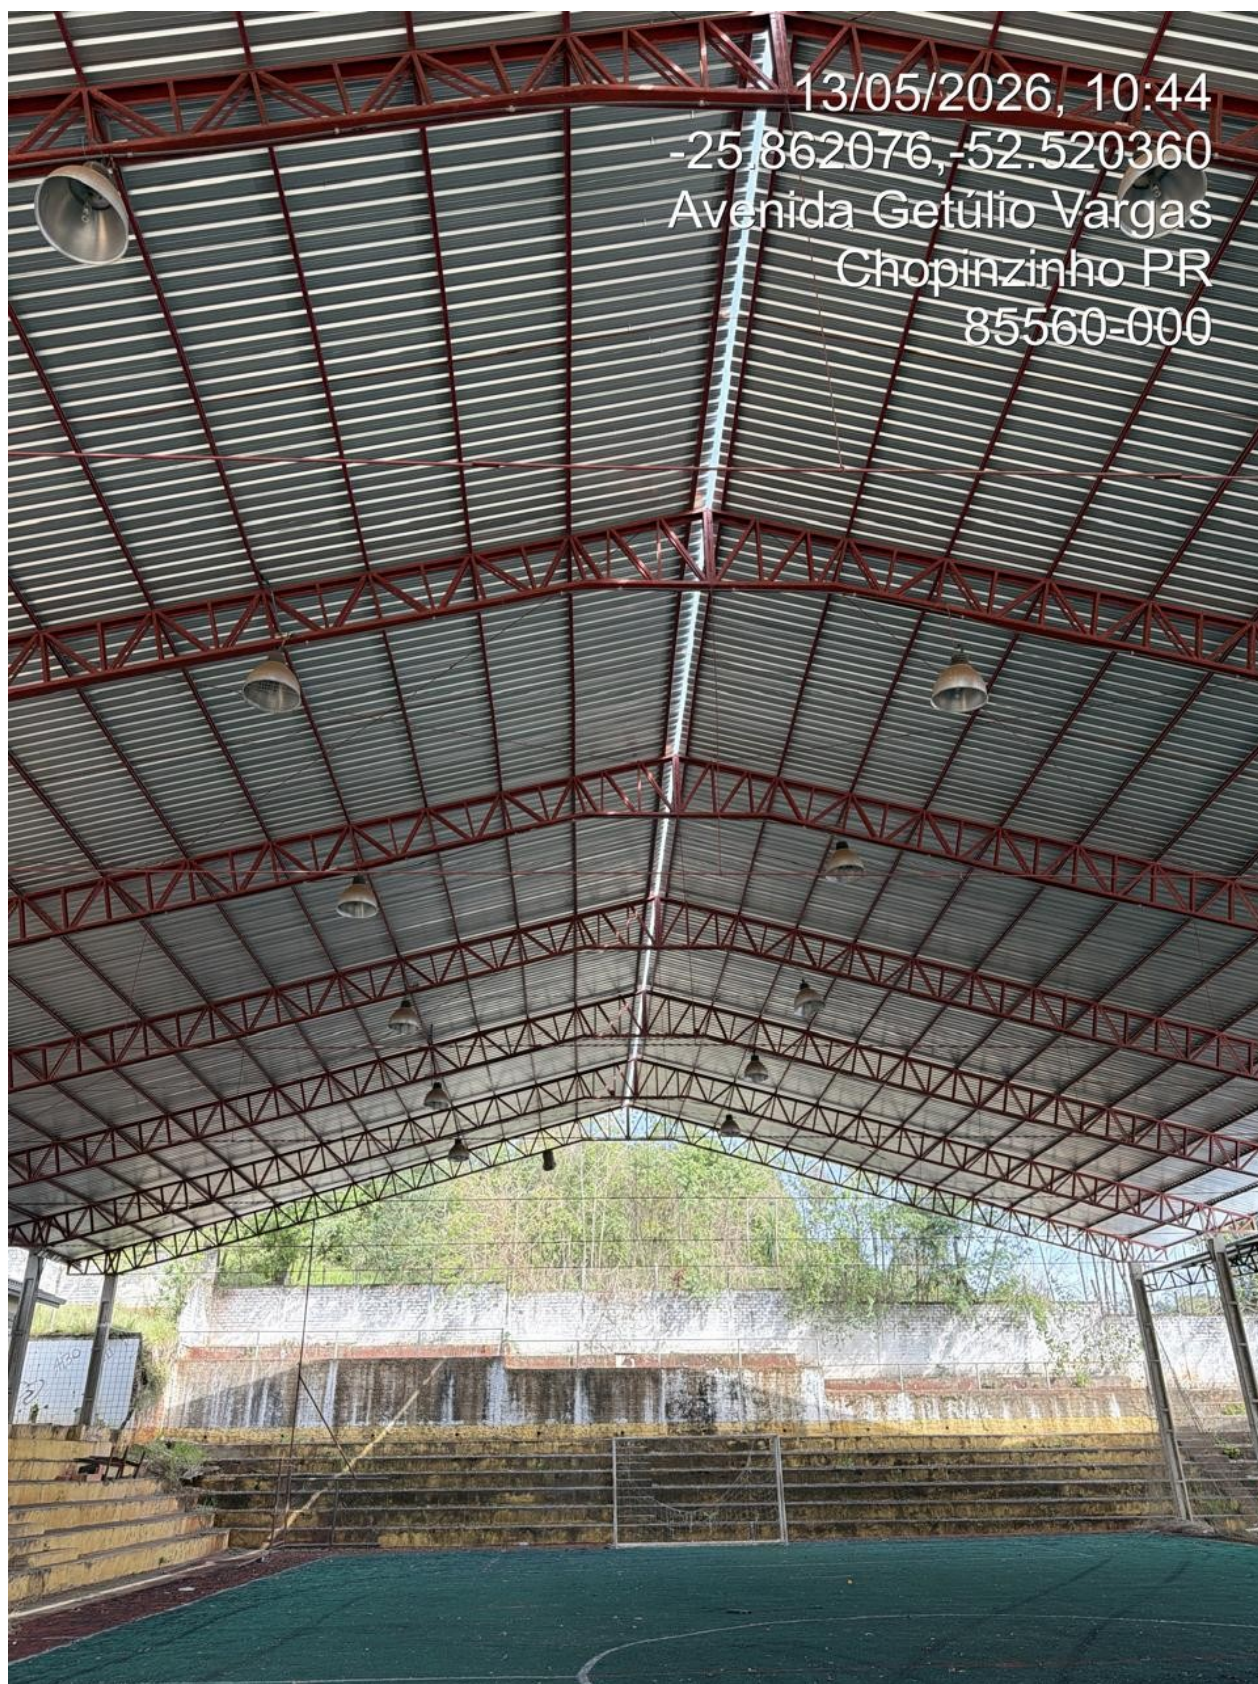





13/05/2026, 10:44
-25.862056,-52.520365
Avenida Getúlio Vargas
Chopinzinho PR
85560-000

























