


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A COMUNIDADE DO RIO QUIETO E SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE. Esta intervenção foi concluída	Contrato 125/2018	18	03/09/2018	R\$ 1.120.482,92	100,00%

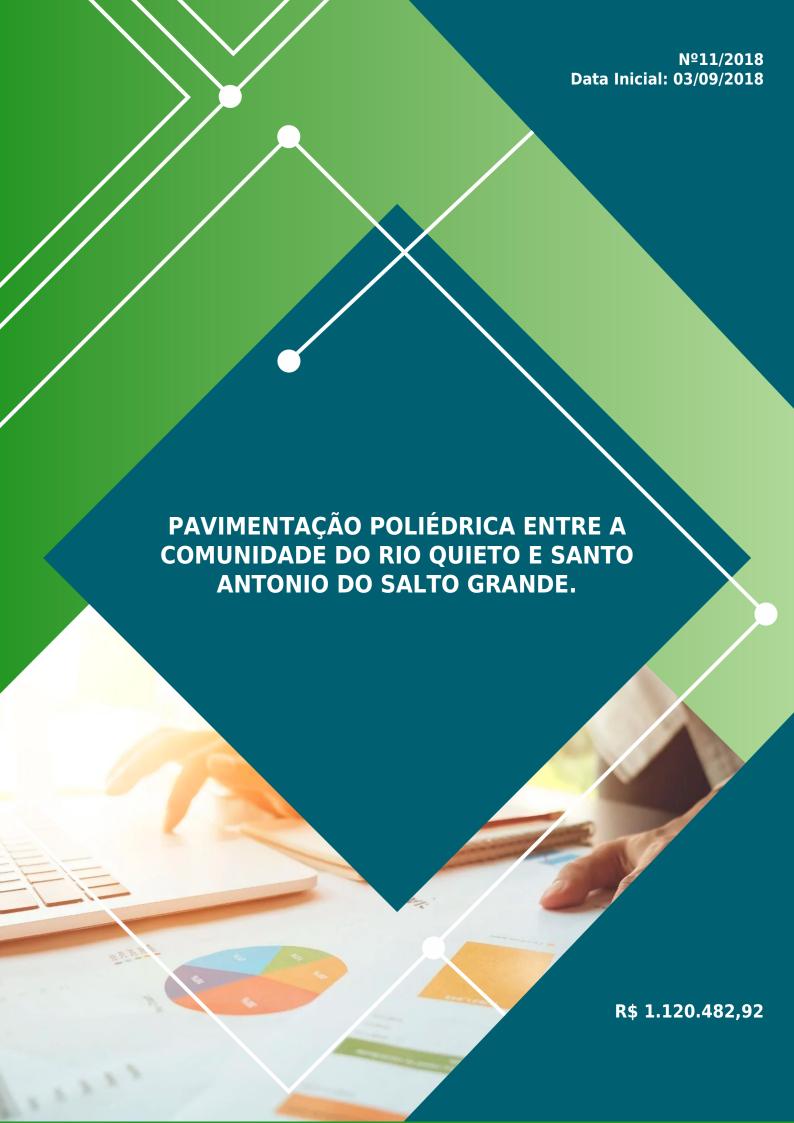

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136886

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9618	2018	03/09/2018	12261
315	2019	01/04/2019	12261
316	2019	01/05/2019	12261
171	2020	03/02/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2775	03/09/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	20**4*3**34	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**81	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**81	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6144	R\$ 1.535.493,94	07/02/2018	
Contrato	125	2018	76.995.455/0001-56	6145	R\$ 1.120.482,92	19/04/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6157	Medição	1	Jurisdicionado	08/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	9,05%
6167	Medição	2	Jurisdicionado	14/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	13,40%
6185	Medição	3	Jurisdicionado	13/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	16,45%

6202 Medição 4 Jurisdicionado 13/01/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 13/5/2018 16,45% 13/5/2018 26,52% 13/5/2018 26,52% 13/5/2018 26,52% 13/5/2018 26,52% 13/5/2018 26,52% 13/5/2018 26,52% 13/5/2018 26,52% 13/5/2							
6228 Medição 5 Jurisdicionado 27/02/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 16.45% 6243 Medição 6 Jurisdicionado 01/03/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 16.45% 6257 Medição 8 Jurisdicionado 17/05/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 25.99% 6269 Medição 9 Jurisdicionado 10/06/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 27.92% 6308 Medição 10 Jurisdicionado 11/07/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 32.67% 6316 Medição 11 Jurisdicionado 26/08/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37.41% 6336 Medição 12 Jurisdicionado 25/10/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37.41% 6350 Medição 14 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Cont	6202	Medição	4	Jurisdicionado	13/01/2019	Execução Indireta - Contrato	16,45%
6243 Medição 6 Jurisdicionado 03/2/219 Execução Indireta - Contrato 125/2018 16-4% 6257 Medição 8 Jurisdicionado 17/05/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 20,52% 6269 Medição 9 Jurisdicionado 17/05/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 27,92% 6308 Medição 10 Jurisdicionado 110/7/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 32,67% 6316 Medição 11 Jurisdicionado 26/08/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37,41% 6336 Medição 12 Jurisdicionado 25/10/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37,41% 6350 Medição 13 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46,84% 6379 Medição 15 Jurisdicionado 18/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contra	6228	Medição	5	Jurisdicionado	27/02/2019	Execução Indireta - Contrato	16,45%
6257 Medição 7 Jurisdicionado 98/04/2019 Execução indireta - Contrato 125/2018 25/88 6269 Medição 8 jurisdicionado 17/05/2019 Execução indireta - Contrato 125/2018 25,98% 6295 Medição 9 jurisdicionado 10/06/2019 Execução indireta - Contrato 125/2018 27,92% 6308 Medição 10 jurisdicionado 26/08/2019 Execução indireta - Contrato Contrato 125/2018 37,41% 6316 Medição 11 jurisdicionado 26/08/2019 Execução indireta - Contrato 125/2018 37,41% 6336 Medição 12 jurisdicionado 25/10/2019 Execução indireta - Contrato Contrato 125/2018 39,26% 6360 Medição 14 jurisdicionado 19/11/2019 Execução indireta - Contrato Contrato 125/2018 34,411% 6379 Medição 15 jurisdicionado 20/20/202 Execução indireta - Contrato Contrato 125/2018 46,84%	6243	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	16,45%
6269 Medição 8 Jurisdicionado L/I/DS/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 25/99% 6295 Medição 9 Jurisdicionado 10/06/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 27,92% 6308 Medição 10 Jurisdicionado 26/08/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 32,67% 6316 Medição 11 Jurisdicionado 26/08/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37,41% 6336 Medição 12 Jurisdicionado 25/10/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 37,41% 6360 Medição 14 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 39,26% 6379 Medição 15 Jurisdicionado 18/12/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46,84% 6397 Medição 16 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50,17% <	6257	Medição	7	Jurisdicionado	08/04/2019	Execução Indireta - Contrato	20,52%
6295 Medição 9 Jurisdicionado 10/06/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 27/9% 6308 Medição 10 Jurisdicionado 11/07/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 32,67% 6316 Medição 11 Jurisdicionado 02/09/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37,41% 6336 Medição 12 Jurisdicionado 02/09/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37,41% 6350 Medição 13 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 39,26% 6360 Medição 14 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 44,11% 6379 Medição 16 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 46,84% 6397 Medição 18 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50	6269	Medição	8	Jurisdicionado	17/05/2019	Execução Indireta - Contrato	25,98%
Medição 10 Jurisdicionado 1107/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 32-6/%	6295	Medição	9	Jurisdicionado	10/06/2019	Execução Indireta - Contrato	27,92%
6316 Medição 11 Jurisdicionado 26/08/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 37.41% 6336 Medição 12 Jurisdicionado 02/09/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 37.41% 6350 Medição 13 Jurisdicionado 25/10/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 39.26% 6360 Medição 14 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 44.11% 6379 Medição 15 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46.84% 6397 Medição 16 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50.17% 6439 Medição 17 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50.17% 6423 Medição 19 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato	6308	Medição	10	Jurisdicionado	11/07/2019	Execução Indireta - Contrato	32,67%
6330 Medição 12 jurisdicionado 02/09/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 37.41% 6350 Medição 13 Jurisdicionado 25/10/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 39.26% 6360 Medição 14 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 44,11% 6379 Medição 15 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46,84% 6399 Medição 17 Jurisdicionado 04/02/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50,17% 6405 Medição 18 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 54,27% 6423 Medição 19 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 58,82% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato	6316	Medição	11	Jurisdicionado	26/08/2019	Execução Indireta - Contrato	37,41%
6350 Medição 13 Jurisdicionado 25/10/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 39.26% 6360 Medição 14 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 44.11% 6379 Medição 15 Jurisdicionado 18/12/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46.84% 6397 Medição 16 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46.84% 6399 Medição 18 Jurisdicionado 04/02/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50.17% 6405 Medição 18 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 54,27% 6423 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato	6336	Medição	12	Jurisdicionado	02/09/2019	Execução Indireta - Contrato	37,41%
6360 Medição 14 Jurisdicionado 19/11/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 44,11% 6379 Medição 15 Jurisdicionado 18/12/2019 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46,84% 6397 Medição 16 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50,17% 6409 Medição 18 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 54,27% 6405 Medição 19 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 54,27% 6423 Medição 19 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 58,82% 6432 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato <td< td=""><td>6350</td><td>Medição</td><td>13</td><td>Jurisdicionado</td><td>25/10/2019</td><td>Execução Indireta - Contrato</td><td>39,26%</td></td<>	6350	Medição	13	Jurisdicionado	25/10/2019	Execução Indireta - Contrato	39,26%
6379 Medição 15 Jurisdicionado 18/12/2019 Execução Indireta - Contrato 125/2018 46,84% 6397 Medição 16 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 46,84% 6399 Medição 17 Jurisdicionado 04/02/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50,17% 6405 Medição 18 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 54,27% 6423 Medição 19 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 58,82% 6432 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/07/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 71,19% 6474 Medição 23 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 25<	6360	Medição	14	Jurisdicionado	19/11/2019	Execução Indireta - Contrato	44,11%
6397 Medição 16 Jurisdicionado 02/01/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 46,84% 6399 Medição 17 Jurisdicionado 04/02/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 50,17% 6405 Medição 18 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 54,27% 6423 Medição 19 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 58,82% 6432 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 66,38% 6461 Medição 22 Jurisdicionado 18/08/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6474 Medição 24 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 25<	6379	Medição	15	Jurisdicionado	18/12/2019	Execução Indireta - Contrato	46,84%
6399 Medição 17 Jurisdicionado 04/02/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 50,17% 6405 Medição 18 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 54,27% 6423 Medição 19 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 58,82% 6432 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 66,38% 6461 Medição 22 Jurisdicionado 16/07/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 71,19% 6474 Medição 23 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 24 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato	6397	Medição	16	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	46,84%
6405 Medição 18 Jurisdicionado 03/03/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 54,27% 6423 Medição 19 Jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 58,82% 6432 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 66,38% 6461 Medição 22 Jurisdicionado 18/08/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 71,19% 6474 Medição 23 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6492 Medição 24 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 79,29% 6519 Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato	6399	Medição	17	Jurisdicionado	04/02/2020	Execução Indireta - Contrato	50,17%
6423 Medição 19 jurisdicionado 06/04/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 58,82% 6432 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 66,38% 6461 Medição 22 Jurisdicionado 16/07/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 71,19% 6474 Medição 23 Jurisdicionado 18/08/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6492 Medição 24 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 81,91% 6542 Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9013 Me	6405	Medição	18	Jurisdicionado	03/03/2020	Execução Indireta - Contrato	54,27%
6432 Medição 20 Jurisdicionado 08/05/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 63,38% 6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 66,38% 6461 Medição 22 Jurisdicionado 16/07/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 71,19% 6474 Medição 23 Jurisdicionado 18/08/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6492 Medição 24 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 79,29% 6542 Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9013 Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00%	6423	Medição	19	Jurisdicionado	06/04/2020	Execução Indireta - Contrato	58,82%
6442 Medição 21 Jurisdicionado 16/06/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 60,38% 6461 Medição 22 Jurisdicionado 16/07/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 71,19% 6474 Medição 23 Jurisdicionado 18/08/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6492 Medição 24 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 79,29% 6542 Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 81,91% 6561 Medição 27 Jurisdicionado 09/12/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9013 Medição 28 Jurisdicionado 01/02/2021 Execução Indireta - Contrato 125/2018 Contrato 125/2018 84,00%	6432	Medição	20	Jurisdicionado	08/05/2020	Execução Indireta - Contrato	63,38%
6461 Medição 22 Jurisdicionado 16/07/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 71,19% 6474 Medição 23 Jurisdicionado 18/08/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6492 Medição 24 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 79,29% 6542 Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 81,91% 6561 Medição 27 Jurisdicionado 09/12/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9013 Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00%	6442	Medição	21	Jurisdicionado	16/06/2020	Execução Indireta - Contrato	66,38%
6474 Medição 23 Jurisdicionado 18/08/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 75,84% 6492 Medição 24 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 75,84% 6519 Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 79,29% 6542 Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 81,91% 6561 Medição 27 Jurisdicionado 09/12/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9013 Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9020 Medição 29 Jurisdicionado 01/02/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 26 A1%	6461	Medição	22	Jurisdicionado	16/07/2020	Execução Indireta - Contrato	71,19%
Medição 24 Jurisdicionado 01/09/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 75,84% Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 79,29% Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 81,91% Medição 27 Jurisdicionado 09/12/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00%	6474	Medição	23	Jurisdicionado	18/08/2020	Execução Indireta - Contrato	75,84%
6519 Medição 25 Jurisdicionado 08/10/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 79,29% 6542 Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 81,91% 6561 Medição 27 Jurisdicionado 09/12/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9013 Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9020 Medição 29 Jurisdicionado 01/02/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 86 41%	6492	Medição	24	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	75,84%
6542 Medição 26 Jurisdicionado 04/11/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 81,91% 6561 Medição 27 Jurisdicionado 09/12/2020 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9013 Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 125/2018 84,00% 9020 Medição 29 Jurisdicionado 01/02/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 86 41%	6519	Medição	25	Jurisdicionado	08/10/2020	Execução Indireta - Contrato	79,29%
9013 Medição 28 Jurisdicionado 09/12/2020 Execução Indireta - Contrato 125/2018 84,00% 9013 Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato 125/2018 84,00% 9020 Medição 29 Jurisdicionado 01/02/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 86,41%	6542	Medição	26	Jurisdicionado	04/11/2020	Execução Indireta - Contrato	81,91%
9013 Medição 28 Jurisdicionado 04/01/2021 Execução Indireta - Contrato 125/2018 84,00% 9020 Medição 29 Jurisdicionado 01/02/2021 Execução Indireta - Contrato Contrato 86.41%	6561	Medição	27	Jurisdicionado	09/12/2020	Execução Indireta - Contrato	84,00%
	9013	Medição	28	Jurisdicionado	04/01/2021	Execução Indireta - Contrato	84,00%
	9020	Medição	29	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	86,41%

9032	Medição	30	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	88,87%
9040	Medição	31	Jurisdicionado	02/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	91,57%
9053	Medição	32	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	94,09%
9062	Medição	33	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	96,04%
9069	Medição	34	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	96,04%
9079	Medição	35	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	96,04%
9095	Medição	36	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	100,00%
9103	Medição	37	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	100,00%
9117	Medição	38	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2018	100,00%
9125	Conclusão	39	Jurisdicionado	01/12/2021			
