


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS	Contrato 99/2024	240	03/06/2024	R\$ 2.023.884,86	45,00%

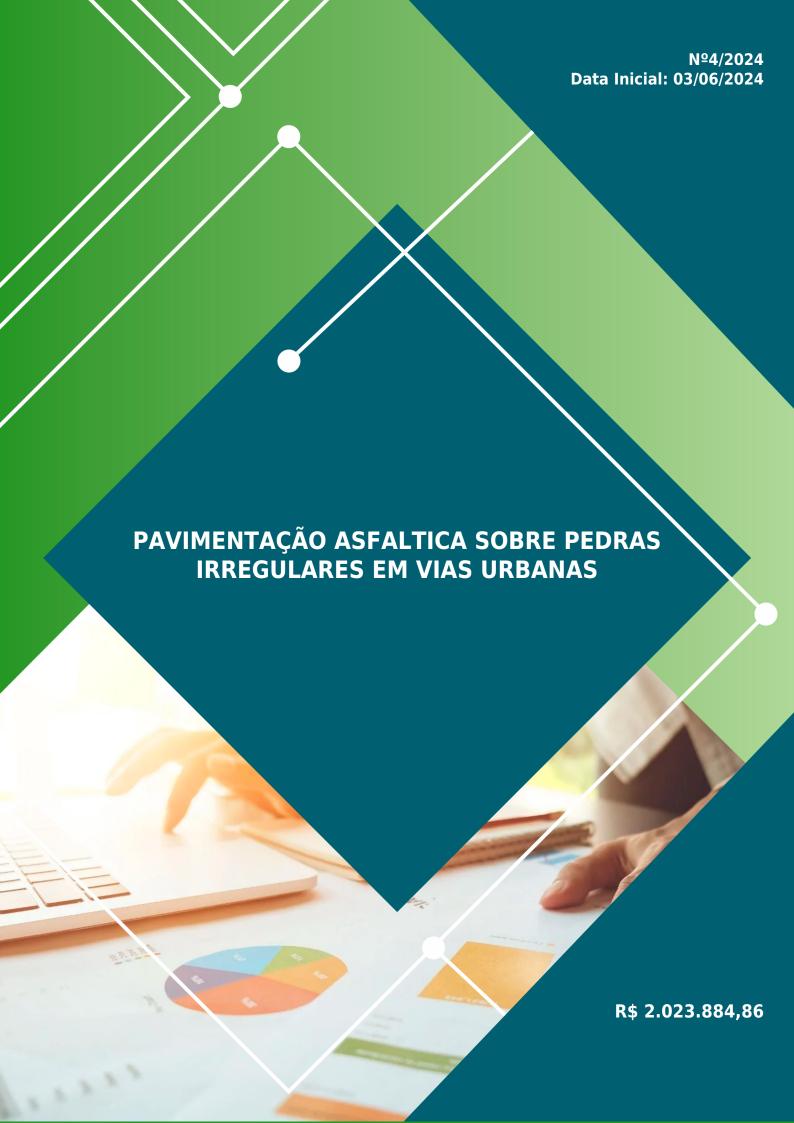

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9246

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**35**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**35**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**35**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*3**76	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2907	R\$ 2.366.572,93	03/06/2024	
Contrato	99	2024	95.589.289/0001-32	2908	R\$ 2.023.884,86	03/06/2024	45,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2909	Medição	1	Jurisdicionado	27/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	16,83%
2945	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	16,85%
2961	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	17,00%
2978	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	17,50%
3006	Medição	5	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	18,00%
3056	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	18,10%
3093	Paralisação	7	Jurisdicionado	31/01/2025			
3148	Medição	8	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	20,00%
3201	Medição	9	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	21,00%
3225	Medição	10	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	38,00%
3268	Medição	11	Jurisdicionado	04/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2024	40,00%

3301 Medição 12 Jurisdicionado 22/09/2025 Execução Indireta - Contrato Contrato 99/2024 45,00%

