Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:28:16

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2024	EXECUÇÃO REVITALIZAÇÃO URBANA, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS PÚBLICOS - PORTAIS CR 937505/22 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 242/2023	240	25/10/2023	R$ 4.480.049,75	100,00%

Nº2/2024
Data Inicial: 25/10/2023

EXECUÇÃO REVITALIZAÇÃO URBANA, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS PÚBLICOS - PORTAIS CR 937505/22



R$ 4.480.049,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30043; 30119; 30134; 30145; 30150; 30181; 30185; 30205; 30238; 33147; 42096

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
738	2024	09/02/2024	12249
739	2024	09/02/2024	12249
606	2026	30/01/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4061	01/03/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/08/2026	242/2023	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*5**42**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*2**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*2**28**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*5**16**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001227	R$ 4.840.049,75	28/07/2023	
Contrato	242	2023	76.995.414/0001-60	9001228	R$ 4.840.049,75	11/10/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001240	Medição	1	Jurisdicionado	29/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	0,75%
9001240	Medição	2	Jurisdicionado	29/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	0,75%
9001240	Medição	3	Jurisdicionado	29/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	0,75%
9001269	Paralisação	4	Jurisdicionado	26/06/2024			
9001303	Medição	5	Jurisdicionado	30/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	1,14%
9001303	Medição	6	Jurisdicionado	30/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	1,14%
9001303	Medição	7	Jurisdicionado	30/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	1,14%
9001321	Medição	8	Jurisdicionado	28/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	19,91%
9001321	Medição	9	Jurisdicionado	28/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	19,91%
9001321	Medição	10	Jurisdicionado	28/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	19,91%
9001346	Paralisação	11	Jurisdicionado	30/04/2025			
9001387	Paralisação	12	Jurisdicionado	03/11/2025			
9001404	Medição	13	Jurisdicionado	19/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	100,00%
9001404	Medição	14	Jurisdicionado	20/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	100,00%
9001404	Medição	15	Jurisdicionado	20/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2023	100,00%
9001440	Conclusão	16	Jurisdicionado	27/04/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900168132677					

Nº2/2024
Data Inicial: 25/10/2023

EXECUÇÃO REVITALIZAÇÃO URBANA, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS PÚBLICOS - PORTAIS CR 937505/22

Documentos



R$ 4.480.049,75

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ


MUNICÍPIO	**CHOPINZINHO**
REFERÊNCIA	**Contrato de Repasse - Operação nº: 1085482-84 - SICONV nº: 937505/2022**
PROGRAMA	**2219 - Acao 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento**
CONTRATADA	**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CONTRATO Nº	**242/2023**
OBJETO	**Pavimentação asfáltica em vias urbanas no Município de Chopinzinho**
MEDIÇÃO Nº	**01**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Chopinzinho, 01 de abril de 2024.

_____
Taiany Blachka Botelho Karl
CREA-SP 5.063.736.630/D
ART 1720235714228
(assinatura digital)

1. INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA

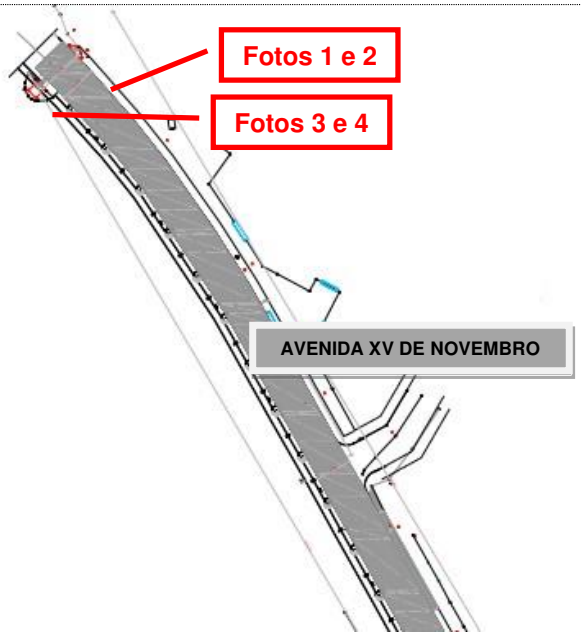

Croqui de localização das fotos.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C695-1735-DAD6-C987 e informe o código C695-1735-DAD6-C987

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 01 – Placa da obra instalada na Av. XV de Novembro próxima ao Portal saída para Cascavel.



Foto 02 – Placa da obra instalada na Av. XV de Novembro próxima ao Portal saída para Cascavel.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C695-1735-DAD6-C987 e informe o código C695-1735-DAD6-C987

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 03 – Placa da obra instalada na Av. XV de Novembro próxima ao Portal saída para Cascavel.



Foto 04 – Placa da obra instalada na Av. XV de Novembro próxima ao Portal saída para Cascavel.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C695-1735-DAD6-C987 e informe o código C695-1735-DAD6-C987

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C695-1735-DAD6-C987

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL (CPF 037.XXX.XXX-33) em 01/04/2024 14:38:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C695-1735-DAD6-C987


40
25/10/2024, 16:16
S 25° 50' 51", W 52° 33' 3"
Chopinzinho


25/10/2024, 16:17
S 25° 50' 51", W 52° 33' 3"
Boa Vereda


07/17/2024
S 25° 51' 47", W 52° 31' 51"
Chopinzinho


07/17/2024
S 25° 51' 46", W 52° 31' 51"
Chopinzinho


07/17/2024
S 25° 51' 46", W 52° 31' 51"
Chopinzinho

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CR 937505/22 (3ª Medição)



Foto 01 – Placa da Obra instalada – Vista 01



Foto 01 – Placa da Obra instalada – Vista 02

Engª Civil Ana Kelle Malaguti – CREA/PR 134.259/D
Divisão de Planejamento e Projetos

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CR 937505/22 (3ª Medição)
R. Alcindo A. de Oliveira



Foto 01 – Rua Alcindo A. Oliveira vista da Av. XV de Novembro

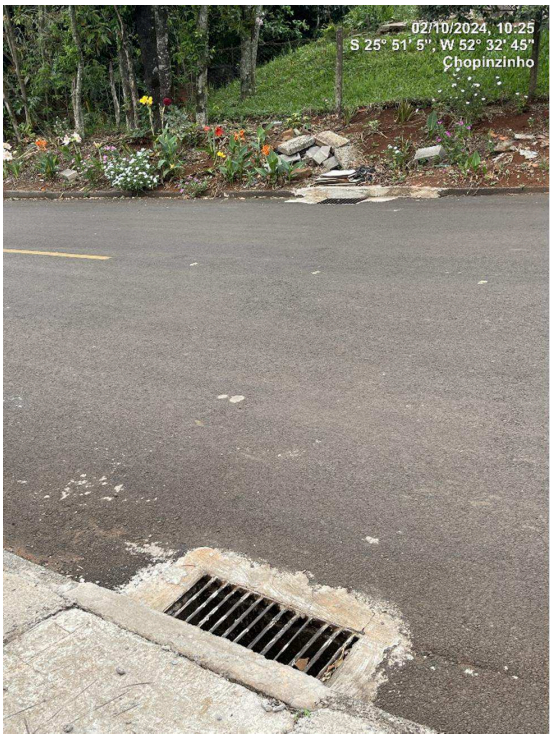




Foto 02 – Bocas de Lobo executadas;

Engª Civil **Ana Kelle Malaguti** – CREA/PR 134.259/D
Divisão de Planejamento e Projetos

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54



Foto 03 – Calçada e pavimento da Rua Alcindo A. Oliveira



Foto 04 – Rua Alcindo A. Oliveira vista do final da via

Engª Civil **Ana Kelle Malaguti** – CREA/PR 134.259/D
Divisão de Planejamento e Projetos

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CR 937505/22 (3ª Medição)
RUAS: Presidente Dutra, Sete de Setembro e Pedro Ivo



Foto 01 - Rua Presidente Dutra, entre as ruas Santos Dumont e Pedro Ivo



Foto 02 - Rua Presidente Dutra, entre as ruas Santos Dumont e Pedro Ivo

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 03 - Rua Presidente Dutra, entre as ruas Santos Dumont e Frei Everaldo



Foto 04 - Rua Presidente Dutra, entre as ruas Santos Dumont e Frei Everaldo

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Engª Civil Ana Kelle Malaguti– CREA/PR 134.259/D
Divisão de Planejamento e Projetos

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Rua Foto 05 - Presidente Dutra, entre as ruas Frei Everaldo e esquina com Pedro Ivo.



Foto 06 - Rua Presidente Dutra, da rua Pedro Ivo sentido rua Frei Everaldo.

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Rua Foto 07 - Presidente Dutra, entre as ruas Frei Everaldo e esquina com Pedro Ivo.



Foto 08 - Rua Sete de Setembro, entre a rua Pedro Ivo e Guilherme Bocalon

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 09 - Rua Sete de Setembro, entre a rua Pedro Ivo e Guilherme Bocalon



Foto 10 - Rua Sete de Setembro, entre a rua Pedro Ivo e Guilherme Bocalon

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 11 - Rua Sete de Setembro, entre as ruas Guilherme Bocalon e Tiradentes



Foto 12 - Rua Sete de Setembro, entre as ruas Guilherme Bocalon e Tiradentes

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 13 - Rua Sete de Setembro, entre as ruas Guilherme Bocalon e Tiradentes



Foto 14 - Rua Sete de Setembro, entre as ruas Guilherme Bocalon e Tiradentes

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 15 - Rua Pedro Ivo, entre as ruas Sete de Setembro e Presidente Dutra



Foto 16 - Rua Pedro Ivo, entre as ruas Sete de Setembro e Presidente Dutra (2)

Assinado por 2 pessoas: ANA KELLE MALAGUTI e LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54 e informe o código 51A5-053A-FF5F-AC54



Foto 17 - Rua Pedro Ivo, esquina com R. Presidente Dutra



Foto 18 - Rua Pedro Ivo, esquina com R. Sete de Setembro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CR 937505/22 (3ª Medição)
PARQUE DO LAGO

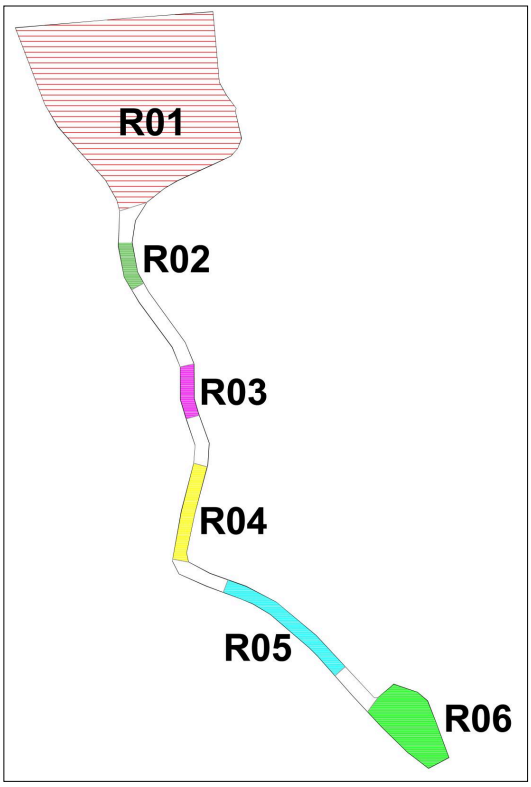




Foto 01 – Área de Estacionamento Parque do Lago – R01 (Vista rua Sete de Setembro)



Foto 02 - Área de Estacionamento Parque do Lago – R01 (Vista da via interna do parque



Foto 03 – Material de sub-base/base aparente na borda da pista de estacionamento – R0



Rua Foto 04 – Via interna ao Parque do Lago 4,0m. – R04



Foto 05 – Via interna ao Parque do Lago 4,0m. – R03



Foto 06 - Via interna ao Parque do Lago – R05



Foto 07 - Via interna ao Parque do Lago – R05



Foto 08 – Estacionamento interno ao Parque do Lago – R06

Ana Kelle Malaguti
Engª Civil – CREA/PR 134.259/D
Divisão de Planejamento e Projetos

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 51A5-053A-FF5F-AC54

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA KELLE MALAGUTI (CPF 074.XXX.XXX-48) em 12/03/2025 16:27:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI (CPF 034.XXX.XXX-09) em 12/03/2025 16:42:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/51A5-053A-FF5F-AC54
