Prefeitura Municipal
de Sulina

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 28/08/2025 - 17:37:25

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2024	RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 24/2024	120	05/06/2024	R$ 2.298.500,00	100,00%

Nº7/2024
Data Inicial: 05/06/2024

RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS

R$ 2.298.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10000514; 10000515; 10000584; 10000607; 10001130; 10001849; 10003070; 10003071

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4080	2024	10/06/2024	12543
4081	2024	10/06/2024	12543
4082	2024	10/06/2024	12543
349	2025	28/01/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/05/2025	24	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*2**71**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**28**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**03**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5664	R$ 2.467.079,95	07/03/2024	
Contrato	24	2024	80.869.886/0001-43	5665	R$ 2.298.500,00	30/04/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5666	Medição	1	Jurisdicionado	29/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	75,88%
5688	Medição	2	Jurisdicionado	05/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	75,88%
5699	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	75,88%
5713	Medição	4	Jurisdicionado	29/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5724	Medição	5	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5747	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5758	Medição	7	Jurisdicionado	30/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5770	Medição	8	Jurisdicionado	27/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	78,82%
5790	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2024	100,00%
5797	Conclusão	10	Jurisdicionado	05/05/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900193975871					
0	900193975871	1	18/02/2025	17/08/2025	

Nº7/2024
Data Inicial: 05/06/2024

RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS

Documentos

R$ 2.298.500,00

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas, Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO DE SULINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA Nº 03/2024.

OBJETO: *RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS.*

A Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ/MF 77.744.134/0001-41, com sede na cidade de Chopinzinho, estado do Paraná sito à Rua 13 de Maio, s/n.º, CEP 85.560-000, Telefone (46) 3242-1002, E-mail compraspedreirasantiago@gmail.com, propõe ao MUNICÍPIO DE SULINA-PR, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R$ 2.298.500,00 (Dois milhões duzentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), sendo 60% (sessenta por cento) referente aos materiais e 40% (quarenta por cento) referente à mão de obra.

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MOISES DE GASPERIN, portador do CPF 518.634.809-00, e será responsável técnico pelos serviços a Sra. CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO, Título Eng. Civil, CREA/n.º PR 203.527/D.

Chopinzinho, 30 de Abril de 2024.

MOISES DE GASPERIN:51863480900

Assinado de forma digital por MOISES DE GASPERIN:51863480900
Dados: 2024.04.30 10:21:55 -03'00'

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas, Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS

Município:	**SULINA - PR**				**BDI 1**	**24,03 %**
Projeto :	**RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS**				**BDI 2**	**16,70%**
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO (R$)**		
				unitário COM BDI	**parcial**	**subtotal**
1	**RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO**					**2.298.500,00**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**27.424,08**
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	320,00	1.440,00	
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,00	290,00	2.320,00	
1.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,00	12,00	96,00	
1.1.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID	40,00	360,00	14.400,00	
1.1.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	19,20	148,00	2.841,60	
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	576,00	3,20	1.843,20	
1.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	380,74	1,40	533,04	
1.1.8	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	48,00	0,50	24,00	
1.1.9	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,01	4.360,00	43,60	
1.1.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,40	1.494,00	3.585,60	
1.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	72,00	3,20	230,40	
1.1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,60	1,40	66,64	
1.2	**CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE**					**37.272,35**
1.2.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	410,00	8,50	3.485,00	
1.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	410,00	0,50	205,00	
1.2.3	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,21	4.360,00	915,60	
1.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,50	1.494,00	30.627,00	
1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	615,00	3,20	1.968,00	
1.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	51,25	1,40	71,75	
1.3	**ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS**					**8.260,75**
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,40	290,00	406,00	
1.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,18	12,00	206,16	
1.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,78	124,00	1.956,72	
1.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,58	148,00	973,84	
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	197,25	3,20	631,20	
1.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	130,39	1,40	182,55	
1.3.7	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	26,30	0,50	13,15	
1.3.8	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,02	4.360,00	87,20	
1.3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,32	1.494,00	1.972,08	
1.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39,45	3,20	126,24	
1.3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	415,09	1,40	581,13	
1.3.12	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	13,00	76,00	988,00	
1.3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,32	3,20	125,82	
1.3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11,84	0,90	10,66	

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.
Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas, Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

1.4	**MEIO FIO E DRENAGEM**					**27.511,26**
1.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	274,00	70,00	19.180,00	
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10,00	76,00	760,00	
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	858,82	3,20	2.748,22	
1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100,20	0,90	90,18	
1.4.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,91	124,00	1.848,84	
1.4.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,26	27,00	115,02	
1.4.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,26	650,00	2.769,00	
1.5	**REVESTIMENTO ASFÁLTICO**					**1.926.374,95**
1.5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	19.721,39	1,50	29.582,09	
1.5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	M2	35.595,24	0,50	17.797,62	
1.5.3	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	17,78	4.360,00	77.520,80	
1.5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.113,56	1.494,00	1.663.658,64	
1.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.406,65	3,20	106.901,28	
1.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.081,80	1,40	30.914,52	
1.6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**55.756,58**
1.6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.352,48	29,00	39.221,92	
1.6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.710,60	6,10	16.534,66	
1.7	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**					**26.329,07**
1.7.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	61,00	135,00	8.235,00	
1.7.2	ENSAIO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	34,00	89,00	3.026,00	
1.7.3	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	34,00	72,00	2.448,00	
1.7.4	ENSAIO DE TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	34,00	127,00	4.318,00	
1.7.5	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	34,00	104,00	3.536,00	
1.7.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAMADA ASFÁLTICA	UNID	1,00	4.766,07	4.766,07	
2	**ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS**					
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.440,00**
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	320,00	1.440,00	
2.2	**RAMPAS DE ACESSIBILIDADE**					**33.810,00**
2.2.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 1, EM CALÇADA EXISTENTE. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	14,00	820,00	11.480,00	
2.2.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 2, EM CALÇADA EXISTENTE. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	23,00	310,00	7.130,00	
2.2.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 1, EM CALÇADA A SER EXECUTADA. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	24,00	590,00	14.160,00	
2.2.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MODELO 2, EM CALÇADA A SER EXECUTADA. Rampa executada em concreto simples, sem armação, com espessura de 7cm sobre lastro de brita e=5cm e solo devidamente compactado. Uso de piso tátil alerta em concreto, e=6cm, colorido (vermelho)	UNID	4,00	260,00	1.040,00	

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.
Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas, Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

2.3	**PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS CENTRAIS**					**6.904,57**
2.3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,82	290,00	237,80	
2.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,78	12,00	165,36	
2.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,96	124,00	1.607,04	
2.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,90	890,00	1.691,00	
2.3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	27,00	3,50	94,50	
2.3.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,36	148,00	201,28	
2.3.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	36,00	70,00	2.520,00	
2.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	113,40	3,20	362,88	
2.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27,46	0,90	24,71	
2.4	**CALÇADAS EM CONCRETO**					**147.416,39**
2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	125,64	890,00	111.819,60	
2.4.2	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	419,80	22,30	9.361,54	
2.4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.794,98	3,50	6.282,43	
2.4.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	89,74	148,00	13.281,52	
2.4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	179,50	16,00	2.872,00	
2.4.6	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	179,50	15,40	2.764,30	
2.4.7	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	9,00	115,00	1.035,00	
	PREÇO GLOBAL					**2.298.500,00**

Chopinzinho, 30 de Abril de 2024.

MOISES DE GASPERIN:51863480900

Assinado de forma digital por MOISES DE GASPERIN:51863480900
Dados: 2024.04.30 10:20:47 -03'00'

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin - Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 30/04/2024 10:14:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Carolina Tavares de Araújo - Resp. Técnica
CREA PR 203.527/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REF: CONCORRÊNCIA 03/2024 - PMS

Item	Descrição Serviços	Valor Serviço R$		Prazo de execução (dias) 30	60	90	120	150	Peso (%)	TOTAL OBRA
1	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBA	2.108.929,04								R$ 2.298.500,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.424,08	R$	27.424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	
			%	100,00%						
1.2	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE	37.272,35	R$	37.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	
			%	100,00%						
1.3	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS	8.260,75	R$	8.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	
			%	100,00%						
1.4	MEIO FIO E DRENAGEM	27.511,26	R$	0,00	27.511,26	0,00	0,00	0,00	1,20%	
			%		100,00%					
1.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1.926.374,95	R$	0,00	850.301,90	1.076.073,05	0,00	0,00	83,81%	
			%		44,14%	55,86%				
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	55.756,58	R$	0,00	0,00	0,00	55.756,58	0,00	2,43%	
			%				100,00%			
1.7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	26.329,07	R$	0,00	0,00	0,00	26.329,07	0,00	1,15%	
			%				100,00%			
2	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OUTR	189.570,96								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.440,00	R$	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
			%	100,00%						
2.2	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	33.810,00	R$	15.775,75	2.606,75	6.079,04	1.227,30	8.121,16	1,47%	
			%	46,66%	7,71%	17,98%	3,63%	24,02%		
2.3	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS CENT	6.904,57	R$	5.751,51	0,00	1.153,06	0,00	0,00	0,30%	
			%	83,30%		16,70%				
2.4	CALÇADAS EM CONCRETO	147.416,39	R$	14.417,32	19.105,16	26.446,50	35.158,81	52.288,59	6,41%	
			%	9,78%	12,96%	17,94%	23,85%	35,47%		
	DESEMBOLSO MENSAL		R$	110.341,76	899.525,08	1.109.751,65	118.471,76	60.409,76		
			%	4,80%	39,14%	48,28%	5,15%	2,63%		
	DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	110.341,76	1.009.866,83	2.119.618,48	2.238.090,24	2.298.500,00		
			%	4,80%	43,94%	92,22%	97,37%	100,00%		

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.
Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas, Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

MOISES DE GASPERIN:51863480900

Assinado de forma digital por MOISES DE GASPERIN:51863480900
Dados: 2024.04.30 10:21:25

Chopinzinho, 30 de Abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 30/04/2024 10:14:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.
Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas, Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

COMPOSIÇÃO DO BDI

RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS / RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

MOISES DE GASPERIN:51863480900
Assinado de forma digital por MOISES DE GASPERIN:51863480900
Dados: 2024.04.26 10:19:30 -03'00'

Chopinzinho,30 de Abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Data: 26/04/2024 10:12:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin - Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Carolina Tavares de Araújo - Resp. Técnica
CREA PR203.527/D

Grau de Sigilo
 # PÚBLICO

Ofício nº:

MUNICÍPIO DE SULINA, 29 de julho de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 1.912.356,00**	**R$ 1.451.055,62**	**R$ 1.451.055,62**
Contrapartida Financeira:	**R$ 386.144,00**	**R$ 292.997,97**	**R$ 292.997,97**
Outros:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Investimento:	**R$ 2.298.500,00**	**R$ 1.744.053,59**	**R$ 1.744.053,59**
Execução Física:	**-**	**75,88%**	**75,88%**

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO HORN
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, PAULO HORN, SELVINO LIRA e MOISES DE GASPERIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652 e informe o código E5E9-77C9-66A7-E652

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1091571-60	953295 / 2023	MUNICÍPIO DE SULINA	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	24/2024

Medição: 1 **Período:** 05/06/2024 a 24/02/2024 **% Realizado Período.:** 75,88% **% Realizado Acum.:** 75,88%

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA TAPAJÓS 1	RUA TAPAJÓS 2	RUA REGENILDO ROSSI	RUA TUPINAMBÁ	RUA ANTÔNIO CEOLIN	RUA XV DE NOVEMBRO	RUA MACHADO DE ASSIS	RUA SÃO JOSÉ TRECHO 1	RUA SÃO JOSÉ TRECHO 2	RUA SANTOS DUMONT	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1		1	1	1	1		1	1															
3	CORREÇOES NO PAVIMENTO EXISTENTE							1	1																	
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS																									
5	MEIO FIO E DRENAGEM										1															
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1		1	1	1															
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS																									
9	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE																									
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEI																									
12	CALÇADAS EM CONCRETO																									

Medições		Data das Medições											
		24/02/2024											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	75,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	1.744.053,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%
	R$	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59	1.744.053,59

MUNICÍPIO DE SULINA
Local

sábado, 24 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720243210365

o por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, PAULO HORN, SELVINO LIRA e MOISES DE GASPERIN
ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652 e informe o código E5E9-77C9-66A7-E652

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
SULINA - PARANÁ
vale a pena crescer e viver aqui

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PLACA DA OBRA

OBRA: Recape asfáltico e adequação de acessibilidade

CONTRATO COM A EMRPESA: 24/2024

CONTRATO DE REPASSE: 953295/2023

Assinado por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, PAULO HORN, SELVINO LIRA e MOISES DE GASPERIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652 e informe o código E5E9-77C9-66A7-E652

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

SULINA - PARANÁ
vale a pena crescer e viver aqui

Sulina, 24 de junho de 2024.

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2024.06.24 11:05:41 -03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
ART DE FISCALIZAÇÃO: 1720243210365

Assinado por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, PAULO HORN, SELVINO LIRA e MOISES DE GASPERIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652 e informe o código E5E9-77C9-66A7-E652

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE SULINA	1091571-60	953295 / 2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	MUNICÍPIO DE SULINA		1.912.356,00	554.742,02	2.467.098,02	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	jul-24	100,00%		-	168.598,02

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Em Análise	19721,39	m²	24/2024	1	2.108.929,01	-	1.744.053,59	1.744.053,59	82,70%
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OUT	Em Análise	1794,98	m²	24/2024	1	189.570,99	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(75,88%)	(75,88%)	
					Repasse		1.912.356,00	-	1.451.055,62	1.451.055,62	
					Contrapartida		386.144,00	-	292.997,97	292.997,97	75,88%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**2.298.500,00**	**-**	**1.744.053,59**	**1.744.053,59**	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

MUNICÍPIO DE SULINA
Local

segunda-feira, 29 de julho de 2024
Data

Representante Tomador
Nome: PAULO HORN
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720243210365

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

o por 4 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, PAULO HORN, SELVINO LIRA e MOISES DE GASPERIN
ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652 e informe o código E5E9-77C9-66A7-E652

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E5E9-77C9-66A7-E652

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 29/07/2024 10:30:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 29/07/2024 13:02:20 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SELVINO LIRA (CPF 858.XXX.XXX-63) em 30/07/2024 07:46:04 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISES DE GASPERIN (CPF 518.XXX.XXX-00) em 23/08/2024 11:06:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E5E9-77C9-66A7-E652

Câmara Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - **Fone: (46) 3244-8000** - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA		
MUNICÍPIO: **SULINA – PR.**		
SUBPROJETO: **RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**		
EMPRESA CONTRATADA: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**		
VALOR REAL: **R$ 2.298.500,00**	CONTRATO Nº: **24/2024**	
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.		
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: **Obra em andamento sem medição no período**		
Aos 05 (Cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento. **PAULO HORN** Prefeito Municipal		

Sulina – PR, 05 de agosto de 2024.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:
SULINA – PR.

SUBPROJETO:
RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS

EMPRESA CONTRATADA:
PEDREIRA SANTIAGO LTDA

VALOR REAL:	CONTRATO Nº:
R$ 2.298.500,00	**24/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra em andamento sem medição no período

Aos 04 (Quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

PAULO HORN
Prefeito Municiapal

Sulina – PR, 04 de setembro de 2024.

Grau de Sigilo
 # PÚBLICO

Ofício n°:

MUNICÍPIO DE SULINA, 29 de outubro de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 1.912.356,00**	**R$ 56.262,36**	**R$ 1.507.317,98**
Contrapartida Financeira:	**R$ 386.144,00**	**R$ 11.360,52**	**R$ 304.358,49**
Outros:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Investimento:	**R$ 2.298.500,00**	**R$ 67.622,88**	**R$ 1.811.676,47**
Execução Física:	**-**	**2,94%**	**78,82%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO HORN:55407552949

Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949
Dados: 2024.10.29 15:48:37 -03'00'

PAULO HORN
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE SULINA	1091571-60	953295 / 2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	MUNICÍPIO DE SULINA		1.912.356,00	554.742,02	2.467.098,02	**2**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**out-24**	**100,00%**	-	-	168.598,02

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Em Análise	19721,39	m²	24/2024	2	2.108.929,01	1.744.053,59	67.622,88	1.811.676,47	85,91%
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OU	Em Análise	1794,98	m²	24/2024	2	189.570,99	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(75,88%)	(2,94%)	(78,82%)	**78,82%**
					Repasse		1.912.356,00	1.451.055,62	56.262,36	1.507.317,98	
					Contrapartida		386.144,00	292.997,97	11.360,52	304.358,49	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**2.298.500,00**	**1.744.053,59**	**67.622,88**	**1.811.676,47**	

Acumulado Anterior: 75,88%

Observações:

MUNICÍPIO DE SULINA
Local

PAULO HORN:55407552949 Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949 Dados: 2024.10.29 15:48:08 -03'00'

terça-feira, 29 de outubro de 2024
Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2024.10.29 15:08:29 -03'00'

Representante Tomador
Nome: PAULO HORN
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720243210365

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1091571-60	953295 / 2023	MUNICÍPIO DE SULINA	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	24/2024

Medição: 2 **Período:** 25/02/2024 a 29/10/2024 **% Realizado Período.:** 2,94% **% Realizado Acum.:** 78,82%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 RUA TAPAJÓS 1	2 RUA TAPAJÓS 2	3 RUA REGENILDO ROSSI	4 RUA TUPINAMBÁ	5 RUA ANTÔNIO CEOLIN	6 RUA XV DE NOVEMBRO	7 RUA MACHADO DE ASSIS	8 RUA SÃO JOSÉ TRECHO 1	9 RUA SÃO JOSÉ TRECHO 2	10 RUA SANTOS DUMONT	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1		1	1	1	1		1	1															
3	CORREÇOES NO PAVIMENTO EXISTENTE							1	1																	
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS																									
5	MEIO FIO E DRENAGEM										1															
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1		1	1	1															
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2	2	2	2	2	2		2	2	2															
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2	2	2	2	2	2		2	2	2															
9	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE																									
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEI																									
12	CALÇADAS EM CONCRETO																									

Medições		Data das Medições											
		24/02/2024	29/10/2024										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	75,88%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	1.744.053,59	67.622,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	75,88%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%	78,82%
	R$	1.744.053,59	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47	1.811.676,47

MUNICÍPIO DE SULINA
Local

sábado, 24 de fevereiro de 2024
Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2024.10.29 15:08:50 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720243210365

ATENDIMENTO
É
GÚ PELO
WHATSAPP

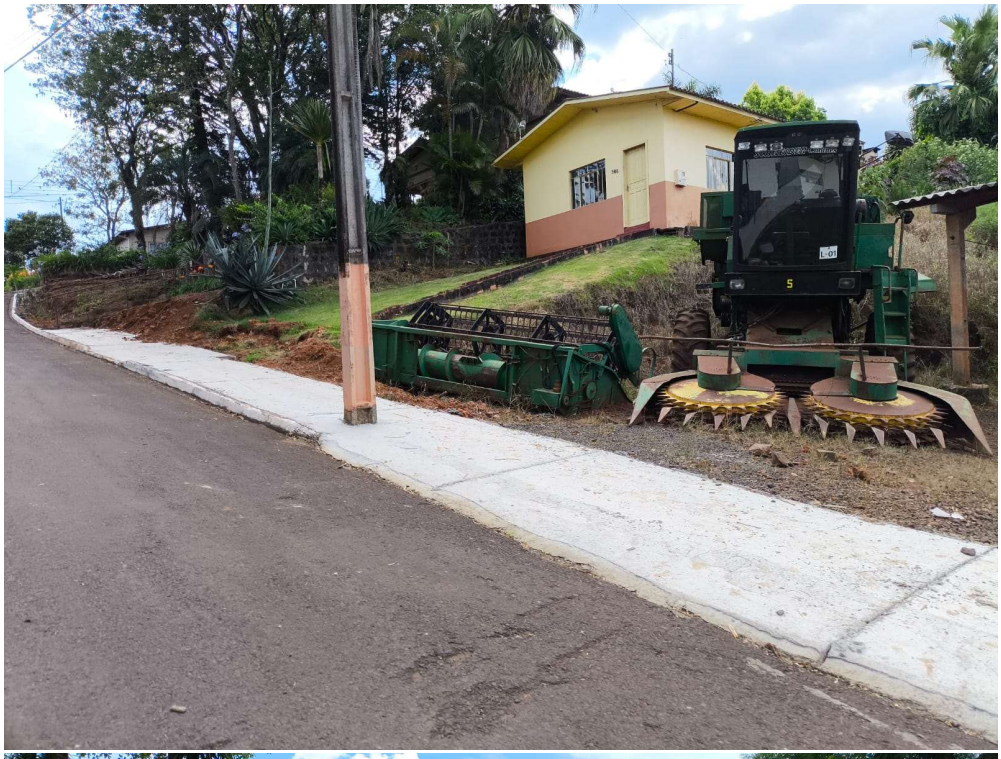

RECAPE ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS
Valor Total da Obra: R$ 2.298.500,00
Comunidade: Municipes de cidade de Sulina
Município: Sulina/PR
Objeto: Recape asfáltico em CBUQ e adequação de acessibilidade - contrato de repasse nº 953295/2023
Agentes Participantes: Municipio de Sulina, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal
Início da Obra: 05/06/2024
Término da Obra: 03/10/2024
Denúncias, reclamações e elogios: ouvidoria.gov.br
CREA-PR
FISCALIZAÇÃO FEDERAL
CAIXA
Ministério das Cidades
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ATENDIMENTO
OU PELO
WHATSAPP
46 99940-5056

Câmara Municipal

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULI

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - **Fone: (46) 3244-8000** - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA		
MUNICÍPIO: **SULINA – PR.**		
SUBPROJETO: **RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**		
EMPRESA CONTRATADA: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**		
VALOR REAL: **R$ 2.298.500,00**	CONTRATO Nº: **24/2024**	
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.		
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: **Obra em andamento sem medição no período**		
Aos 04 (Quatro) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento. **PAULO HORN** Prefeito Municipal		

Sulina – PR, 04 de novembro de 2024.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:
SULINA – PR.

SUBPROJETO:
RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS

EMPRESA CONTRATADA:
PEDREIRA SANTIAGO LTDA

VALOR REAL:	CONTRATO Nº:
R$ 2.298.500,00	**24/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:
Obra finalizada aguardando documentação

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está finalizada aguardando documentação.

GILBERTO JOÃO ROSSI
Prefeito Municipal

Sulina – PR, 30 de janeiro de 2025.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: **SULINA – PR.**	
SUBPROJETO: **RECAPE ASFÁLTICO - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS, ENTRE OUTRAS**	
EMPRESA CONTRATADA: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**	
VALOR REAL: **R$ 2.298.500,00**	CONTRATO Nº: **24/2024**
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 03/2024.	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: **Obra finalizada aguardando documentação**	

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está finalizada aguardando documentação.

GILBERTO JOÃO ROSSI
Prefeito Municipal

Sulina – PR, 27 de fevereiro de 2025.

Grau de Sigilo
 # PÚBLICO

Ofício n°: 01/2025 - Dep. Eng.

MUNICÍPIO DE SULINA, 04 de fevereiro de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 1.743.757,98**	**R$ 417.604,53**	**R$ 1.740.731,51**
Contrapartida Financeira:	**R$ 554.742,02**	**R$ 132.852,60**	**R$ 553.779,21**
Outros:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Investimento:	**R$ 2.298.500,00**	**R$ 550.457,13**	**R$ 2.294.510,72**
Execução Física:	**-**	**23,95%**	**99,83%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2025.02.06 08:35:42 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1091571-60	953295 / 2023	MUNICÍPIO DE SULINA	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	24/2024

Medição: 2 **Período:** 25/06/2024 a 19/12/2024 **% Realizado Período.:** 23,95% **% Realizado Acum.:** 99,83%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 RUA TAPAJÓS 1	2 RUA TAPAJÓS 2	3 RUA REGENILDO ROSSI	4 RUA TUPINAMBÁ	5 RUA ANTÔNIO CEOLIN	6 RUA XV DE NOVEMBRO	7 RUA MACHADO DE ASSIS	8 RUA SÃO JOSÉ TRECHO 1	9 RUA SÃO JOSÉ TRECHO 2	10 RUA SANTOS DUMONT	11 GLOSA DEFINITIVA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1		1	1	1	1		1	1															
3	CORREÇOES NO PAVIMENTO EXISTENTE							1	1																	
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS	2					2																			
5	MEIO FIO E DRENAGEM										1															
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1															
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
9	SERVIÇOS PRELIMINARES						2																			
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2		2															
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEI	2	2					2																		
12	CALÇADAS EM CONCRETO			2	2	2	2	2	2		2															

Medições		Data das Medições											
		24/06/2024	19/12/2024										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	75,88%	23,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	1.744.053,59	550.457,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	75,88%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%
	R$	1.744.053,59	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72

MUNICÍPIO DE SULINA
Local

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025
Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2025.02.05 07:26:56 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720243210365

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE SULINA	1091571-60	953295 / 2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	MUNICÍPIO DE SULINA		1.912.356,00	554.742,02	2.467.098,02	2

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	fev-25	99,83%		168.598,02	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Licitado / Em Execução	19721,39	m²	24/2024	2	2.108.929,01	1.744.053,59	364.875,42	2.108.929,01	100,00%
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OU	Licitado / Em Execução	1794,98	m²	24/2024	2	189.570,99	-	185.581,71	185.581,71	97,90%
					(%)		(100,00%)	(75,88%)	(23,95%)	(99,83%)	99,83%
					Repasse		1.743.757,98	1.323.126,98	417.604,53	1.740.731,51	
					Contrapartida		554.742,02	420.926,61	132.852,60	553.779,21	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**2.298.500,00**	**1.744.053,59**	**550.457,13**	**2.294.510,72**	

RRE n° 02 corrigido - considerado glosa definitivas efetuadas.

MUNICÍPIO DE SULINA
Local

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Dados: 2025.02.06 08:34:35 -03'00'

Representante Tomador
Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025
Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2025.02.05 07:26:02 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720243210365

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: xxx
Cargo: .

RUA
COMENDADOR ARAUJO
ADMINISTRAÇÃO
1997 A 2000
RECAPE ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS
Valor Total da Obra: R$ 2.298.500,00
Comunidade: Municípes da cidade de Sulina
Município: Sulina/PR
Objeto: Recape asfáltico em CBUQ e adequação de acessibilidade - contrato de repasse nº 983295/2023
Agentes Participantes: Município de Sulina, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal
Início da Obra: 05/06/2024
Término da Obra: 03/10/2024
Denúncias, reclamações e elogios: ouvidoria.gov.br
CAIXA
Ministério das Cidades
GOVERNO FEDERAL
BRASIL

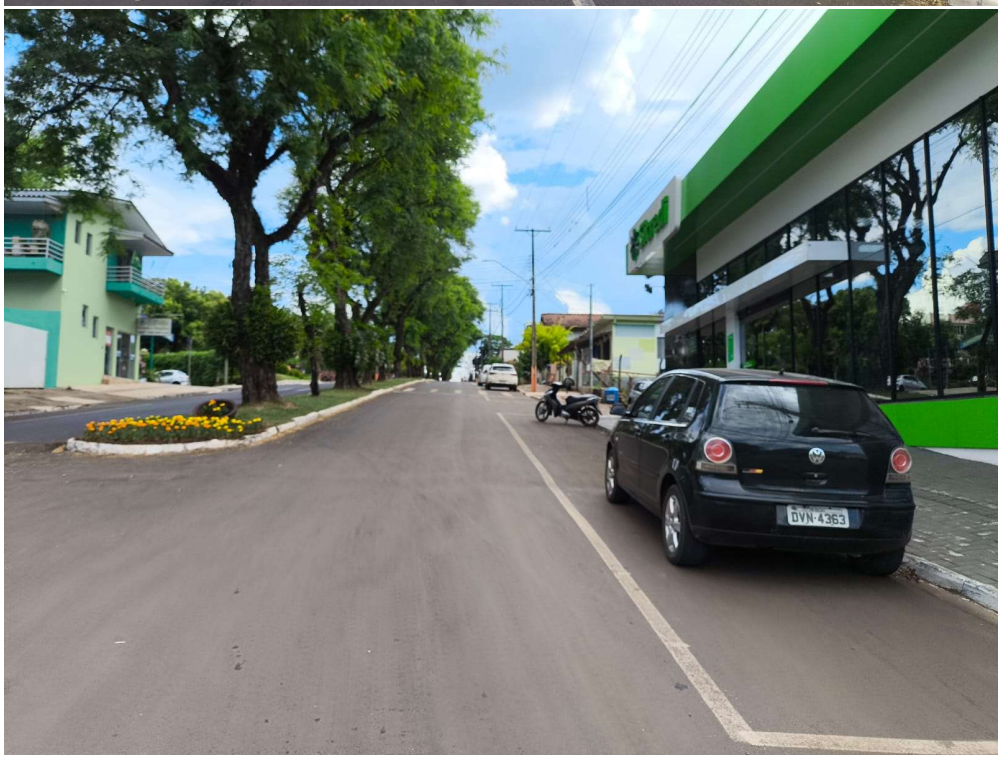
DVN-4363

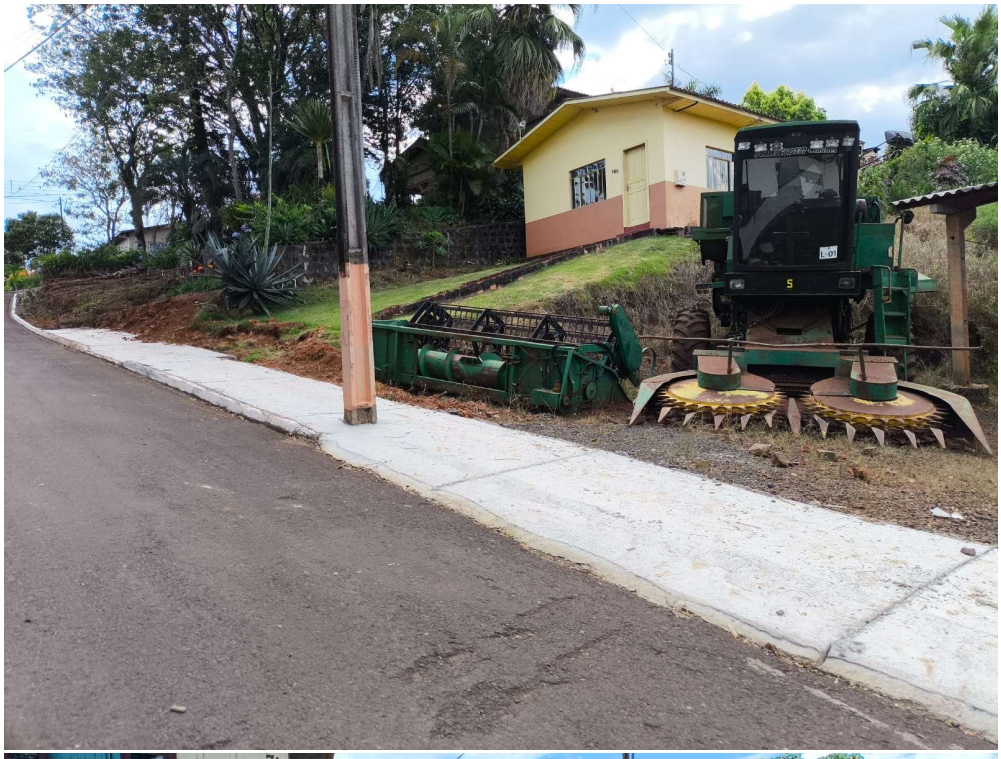

Câmara Municipal

RUA
COMENDADOR ARAUJO
GESTÃO ADMINISTRAÇÃO
1997 A 2000
RECAPE ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS
Valor Total da Obra: R$ 2.298.500,00
Comunidade: Munícipes de cidade de Sulina
Município: Sulina/PR
Objeto: Recape asfáltico em CBUQ e adequação de acessibilidade - contrato de repasse nº 953295/2023
Agentes Participantes: Município de Sulina, Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal
Início da Obra: 05/06/2024
Término da Obra: 03/10/2024
Denúncias, reclamações e elogios: ouvidoria.gov.br
CREA-PR
FISCALIZAÇÃO FEDERAL
CAIXA
Ministério das Cidades
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DVN-4363

711

Câmara Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
SULINA - PARANÁ
vale a pena crescer e viver aqui

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento definitivo nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório Concorrência Eletrônica n° 03/2024, Contrato n° 24/2022, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Obra: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – RUA TAPAJÓS, MACHADO DE ASSIS ENTRE OUTRAS, conforme contrato de repasse 953295/2023.**

Empresa Executora: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ Nº 77.744.134/0001-41.**

ART Execução: **1720242527152**

Valor inicial do contrato: **R$ 2.298.500,00 (dois milhões duzentos e noventa e oito mil e quinhentos reais).**

Valor da glosa: **R$ 3.989,28 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).**

Valor final do contrato: **R$ 2.294.510,72 (dois milhões duzentos e noventa e quatro mil quinhentos e dez reais e setenta e dois centavos).**

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

Sulina, 06 de fevereiro de 2025.

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2025.02.06 08:54:47 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2025.02.06 08:55:58 -03'00'

LUCIANO S. SANTIAGO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DA OBRA

Assinado digitalmente por MOACIR DA ROSA
Papel: Parte
(CPF 866.126.469-34)
Data: 28/02/2025 10:23:38 -03:00

Assinado digitalmente por GILBERTO JOÃO ROSSI
Papel: Parte
(CPF 031.604.539-01)
Data: 28/02/2025 13:07:57 -03:00

Assinado digitalmente por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Papel: Parte
(CPF 815.961.899-91)
Data: 05/03/2025 16:29:42 -03:00
