Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:30:33

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	RECAPE EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 146/2022	180	01/03/2023	R$ 962.803,22	100,00%
2	2023	RECAPE EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2023	180	01/03/2023	R$ 962.803,22	100,00%

Nº2/2023
Data Inicial: 01/03/2023

RECAPE EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO



R$ 962.803,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8703

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**06**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**06**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**06**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	17**2*1**40**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2474	R$ 967.763,77	01/03/2023	
Contrato	146	2022	95.589.289/0001-32	2475	R$ 962.803,22	01/03/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	95.589.289/0001-32	2713	R$ 174.735,56	01/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2478	Medição	1	Jurisdicionado	14/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	23,72%
2518	Medição	2	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	24,00%
2549	Medição	3	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	25,00%
2572	Medição	4	Jurisdicionado	23/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	50,96%
2573	Medição	5	Jurisdicionado	26/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	68,90%
2593	Medição	6	Jurisdicionado	06/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	90,00%
2641	Medição	7	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	91,00%
2664	Medição	8	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	95,00%
2690	Medição	9	Jurisdicionado	26/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	96,00%
2730	Medição	10	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	100,00%

2714	Medição	11	Jurisdicionado	08/11/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	47,72%
2721	Medição	12	Jurisdicionado	17/11/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
2768	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/12/2023			

Nº2/2023
Data Inicial: 01/03/2023

RECAPE EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO


Documentos



R$ 962.803,22





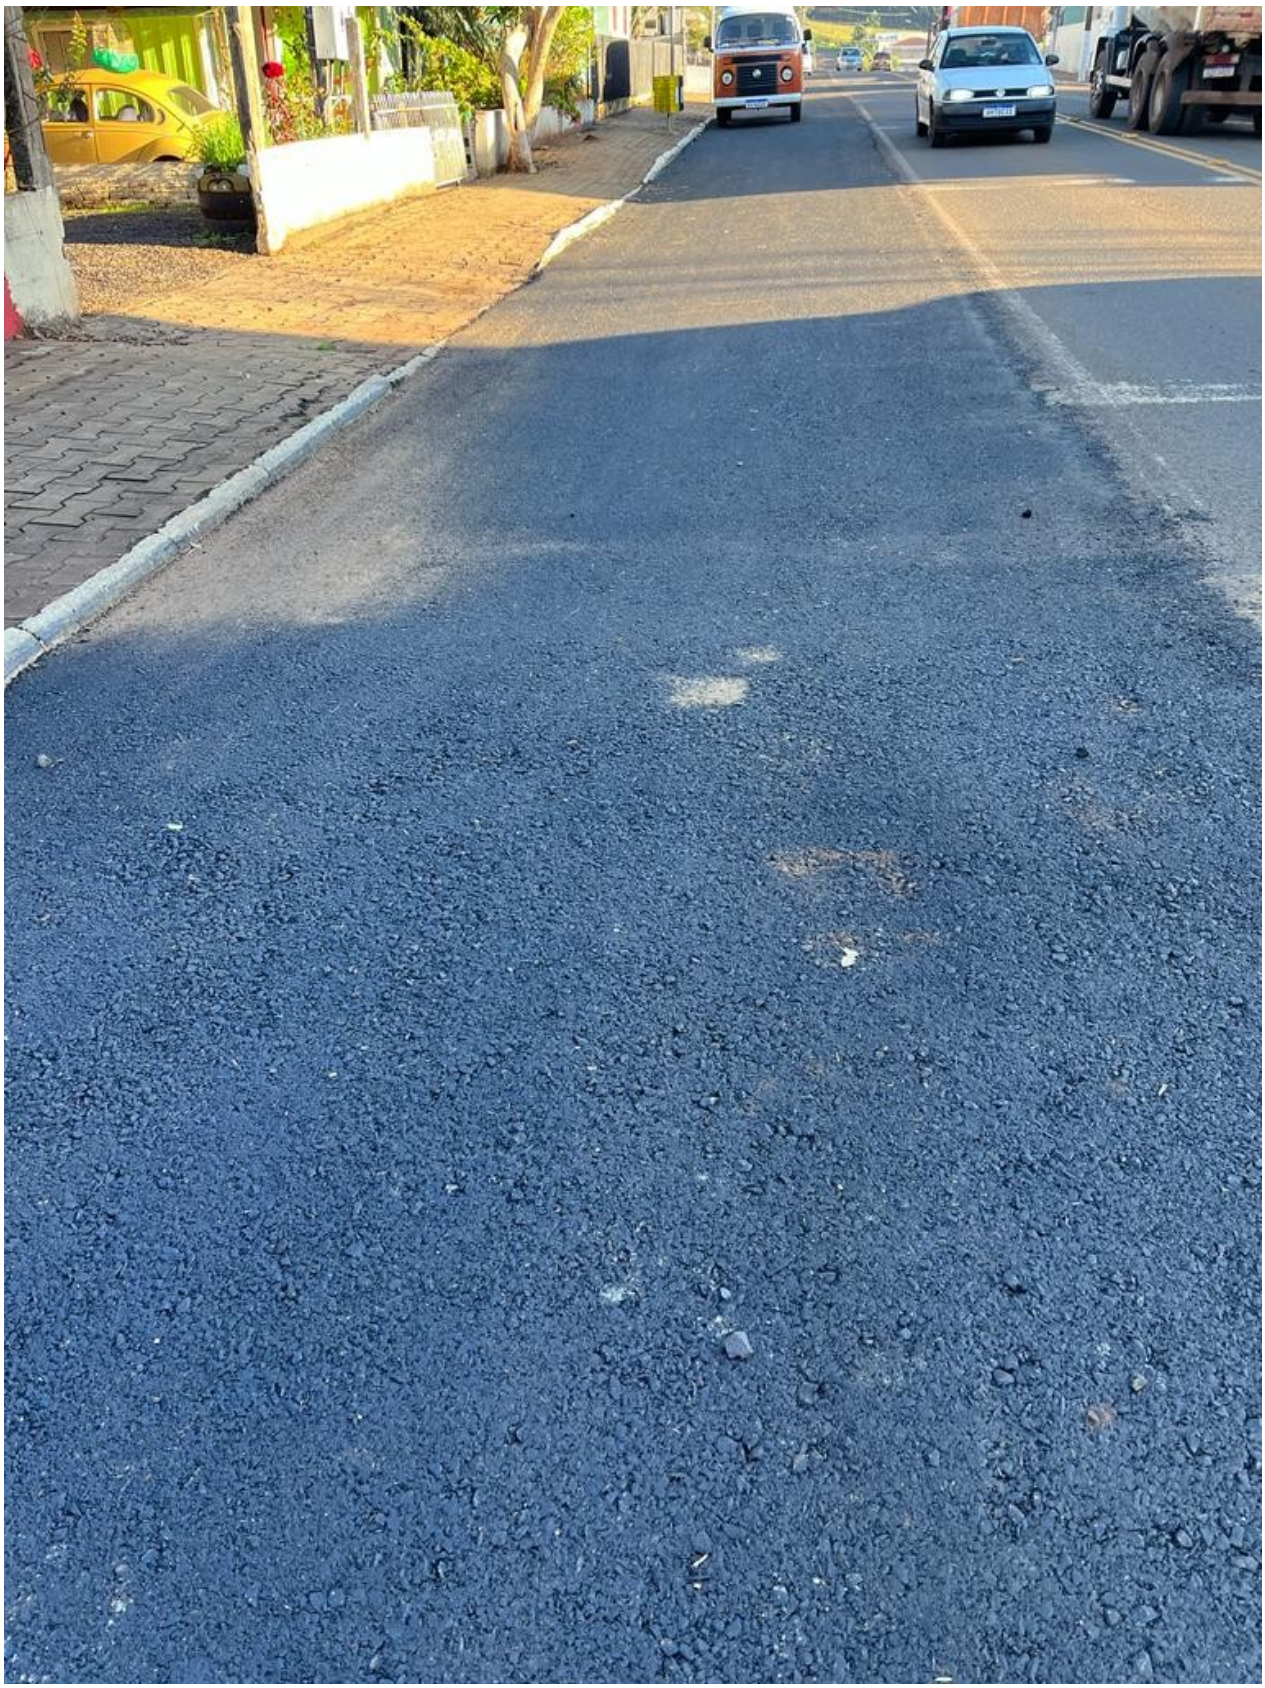




EXECUÇÃO DE
RECAPEAMENTO EM CBUQ
Valor Total da Obra: 962.803,22
Município: Nova Esperança do Sudoeste - PR
Objeto: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em CBUQ em vias pertencentes ao município de Nova Esperança do Sudoeste
Empresa executora: SM Resende Construções e Incorporações Ltda
Início da Obra: 09/02/2023
Término da Obra: 09/06/2023
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Av.
Iguaçú
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA



