Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:17:34

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL ESCOLA ANGELICA BATTISTUZ LOTE 03 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 21/2025	60	24/03/2025	R$ 58.899,00	100,00%

Nº1/2025
Data Inicial: 24/03/2025

CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL ESCOLA ANGELICA BATTISTUZ LOTE 03



R$ 58.899,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
34111

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2385	2025	30/04/2025	12249
2982	2025	01/06/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1008	4061	01/05/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/08/2025	21/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**4*4*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**4*4*	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**50**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.2**-16	ART (CREA)	17**2*2**39**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001347	R$ 68.495,35	25/09/2024	
Contrato	21	2025	76.995.414/0001-60	9001348	R$ 58.899,00	04/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001349	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2025	97,88%
9001360	Medição	2	Jurisdicionado	18/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2025	100,00%
9001369	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/07/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900232563271					

Nº1/2025
Data Inicial: 24/03/2025

CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL ESCOLA ANGELICA BATTISTUZ LOTE 03

Documentos



R$ 58.899,00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO

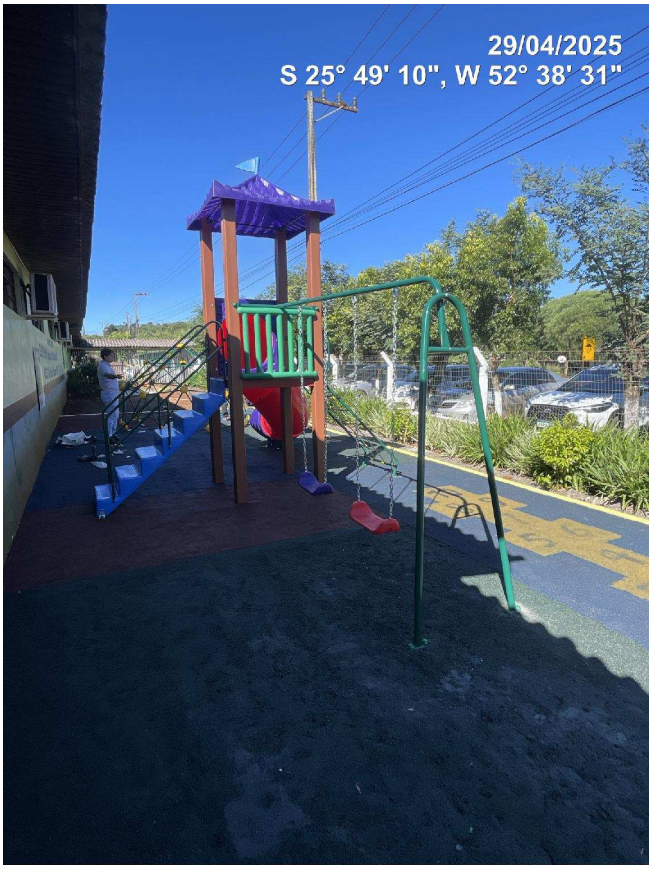
PARQUE INFANTIL COM PISO EMBORRACHADO – ESCOLA ANGÉLICA BATTISTUZ

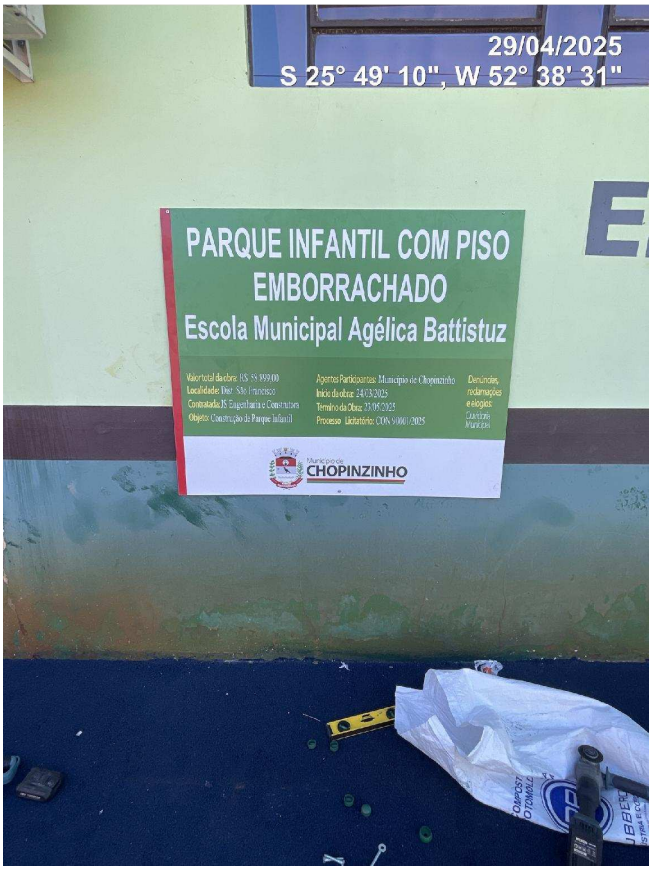





29/04/2025
S 25° 49' 10", W 52° 38' 30"


29/04/2025
S 25° 49' 10", W 52° 38' 30"


29/04/2025
S 25° 49' 10", W 52° 38' 31"


29/04/2025
S 25° 49' 10", W 52° 38' 31"
PARQUE INFANTIL COM PISO EMBORRACHADO
Escola Municipal Agélica Battistuz
CHOPINZINHO

MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PARQUE INFANTIL COM PISO EMBORRACHADO NA ESCOLA ANGÉLICA BATTISTTUZ

CONTRATO 021/2025





MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO







MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



Parte de piso que carece ser corrigida:



Em uma parte do piso emborrachado, muito possivelmente problemas com a umidade e/ou material provocou um aspecto ruim e com textura diferente do esperado. A contratada já se prontificou a executar a correção. Será feito um recorte em toda área, o material será totalmente removido e novo será aplicado. Observo que a contratada apenas não executou o referido serviço ainda pois muitos foram os períodos de chuva e umidade na região, mas estima-se que até o dia 26 deste mês, havendo colaboração do clima, o reparo será feito.

Chopinzinho, 18 de Junho de 2025
