Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:10:15

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2022 | Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Cristo Rei<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 260/2021 | 540 | 01/06/2022 | R$ 817.269,30 | 100,00% |

Nº5/2022
Data Inicial: 01/06/2022

# Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Cristo Rei



R$ 817.269,30

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 39836 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2651 | 2022 | 01/06/2022 | 12249 |
| 2747 | 2022 | 01/06/2022 | 12249 |
| 2685 | 2022 | 01/06/2022 | 12249 |
| 3401 | 2022 | 01/06/2022 | 12249 |
| 3402 | 2022 | 01/06/2022 | 12249 |
| 3403 | 2022 | 01/06/2022 | 12249 |
| 5819 | 2024 | 24/09/2024 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1006 | 3114 | 01/06/2022 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 19/10/2023 | 260/2021 | Contrato |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 05*.*4*.9**-76 | ART (CREA) | 17**2*2**39** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*1**11** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*1**11** | Orçamento | Sim |
| CPF | 11*.*8*.1**-47 | ART (CREA) | 17**2*2**94** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9001037 | R$ 825.734,82 | 16/06/2021 | |
| Contrato | 260 | 2021 | 76.995.414/0001-60 | 9001038 | R$ 817.269,30 | 19/11/2021 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001039 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/06/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 3,55% |
| 9001049 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 05/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 6,96% |
| 9001060 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 03/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 13,00% |
| 9001073 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 05/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 20,22% |
| 9001086 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 05/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 24,34% |
| 9001102 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 08/11/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 27,73% |
| 9001121 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 15/12/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 33,74% |
| 9001133 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 17/01/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 38,54% |
| 9001140 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 28/02/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 42,93% |
| 9001148 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 31/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 48,02% |
| 9001154 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 28/04/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 50,38% |
| 9001159 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 31/05/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 55,22% |
| 9001159 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 15/06/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 55,22% |
| 9001159 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 15/07/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 55,22% |
| 9001188 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 01/08/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 55,23% |
| 9001188 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 01/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 55,23% |
| 9001188 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 01/10/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 55,23% |
| 9001208 | Paralisação | 18 | Jurisdicionado | 01/11/2023 | | | |
| 9001217 | Medição | 19 | Jurisdicionado | 13/12/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 63,17% |
| 9001217 | Medição | 20 | Jurisdicionado | 13/01/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 63,17% |
| 9001222 | Medição | 21 | Jurisdicionado | 05/02/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 67,27% |
| 9001237 | Medição | 22 | Jurisdicionado | 05/03/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 72,17% |
| 9001244 | Medição | 23 | Jurisdicionado | 05/04/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 77,85% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001255 | Medição | 24 | Jurisdicionado | 17/05/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 82,01% |
| 9001265 | Medição | 25 | Jurisdicionado | 27/06/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 87,58% |
| 9001270 | Medição | 26 | Jurisdicionado | 30/07/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 91,38% |
| 9001270 | Medição | 27 | Jurisdicionado | 30/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 91,38% |
| 9001270 | Medição | 28 | Jurisdicionado | 30/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 91,38% |
| 9001298 | Medição | 29 | Jurisdicionado | 09/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 100,00% |
| 9001298 | Medição | 30 | Jurisdicionado | 09/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 260/2021 | 100,00% |
| 9001312 | Conclusão | 31 | Jurisdicionado | 09/12/2024 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900105539772 | | | | | |

Nº5/2022
Data Inicial: 01/06/2022

# Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Cristo Rei

## Documentos



R$ 817.269,30


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL
21/05/2022


27/05/2022


27/05/2022


27/05/2022


27/05/2022


05/07/2022


05/07/2022


05/07/2022


05/07/2022


05/07/2022


05/09/2022


05/09/2022


05/09/2022


05/09/2022


05/09/2022


05/09/2022


05/10/2022


m dm
BOSCH
05/10/2022


05/10/2022


05/10/2022


05/10/2022


05/10/2022


08/11/2022


08/11/2022


08/11/2022


08/11/2022


08/11/2022

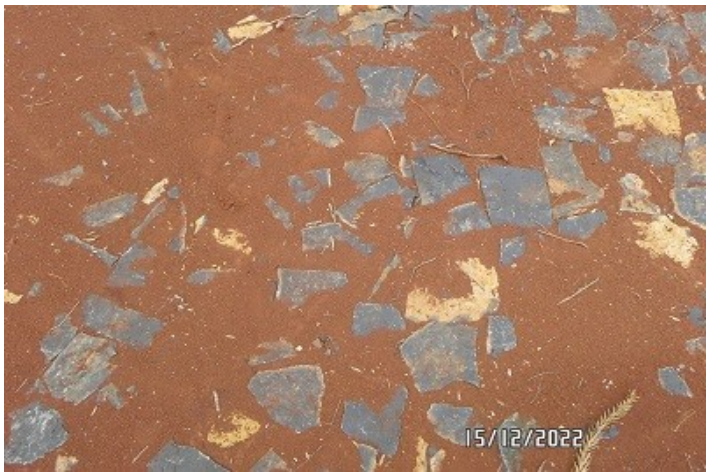

08/11/2022


15/12/2022


15/12/2022


15/12/2022


15/12/2022


15/12/2022


17/01/2023


17/01/2023


17/01/2023


17/01/2023


17/01/2023


17/01/2023


28/02/2023


28/02/2023


28/02/2023


28/02/2023


28/02/2023


28/02/2023


31/03/2023


31/03/2023


31/03/2023


31/03/2023


31/03/2023


31/03/2023


28/04/2023


28/04/2023


28/04/2023


28/04/2023


28/04/2023


28/04/2023


31/05/2023


31/05/2023


31/05/2023


31/05/2023


31/05/2023

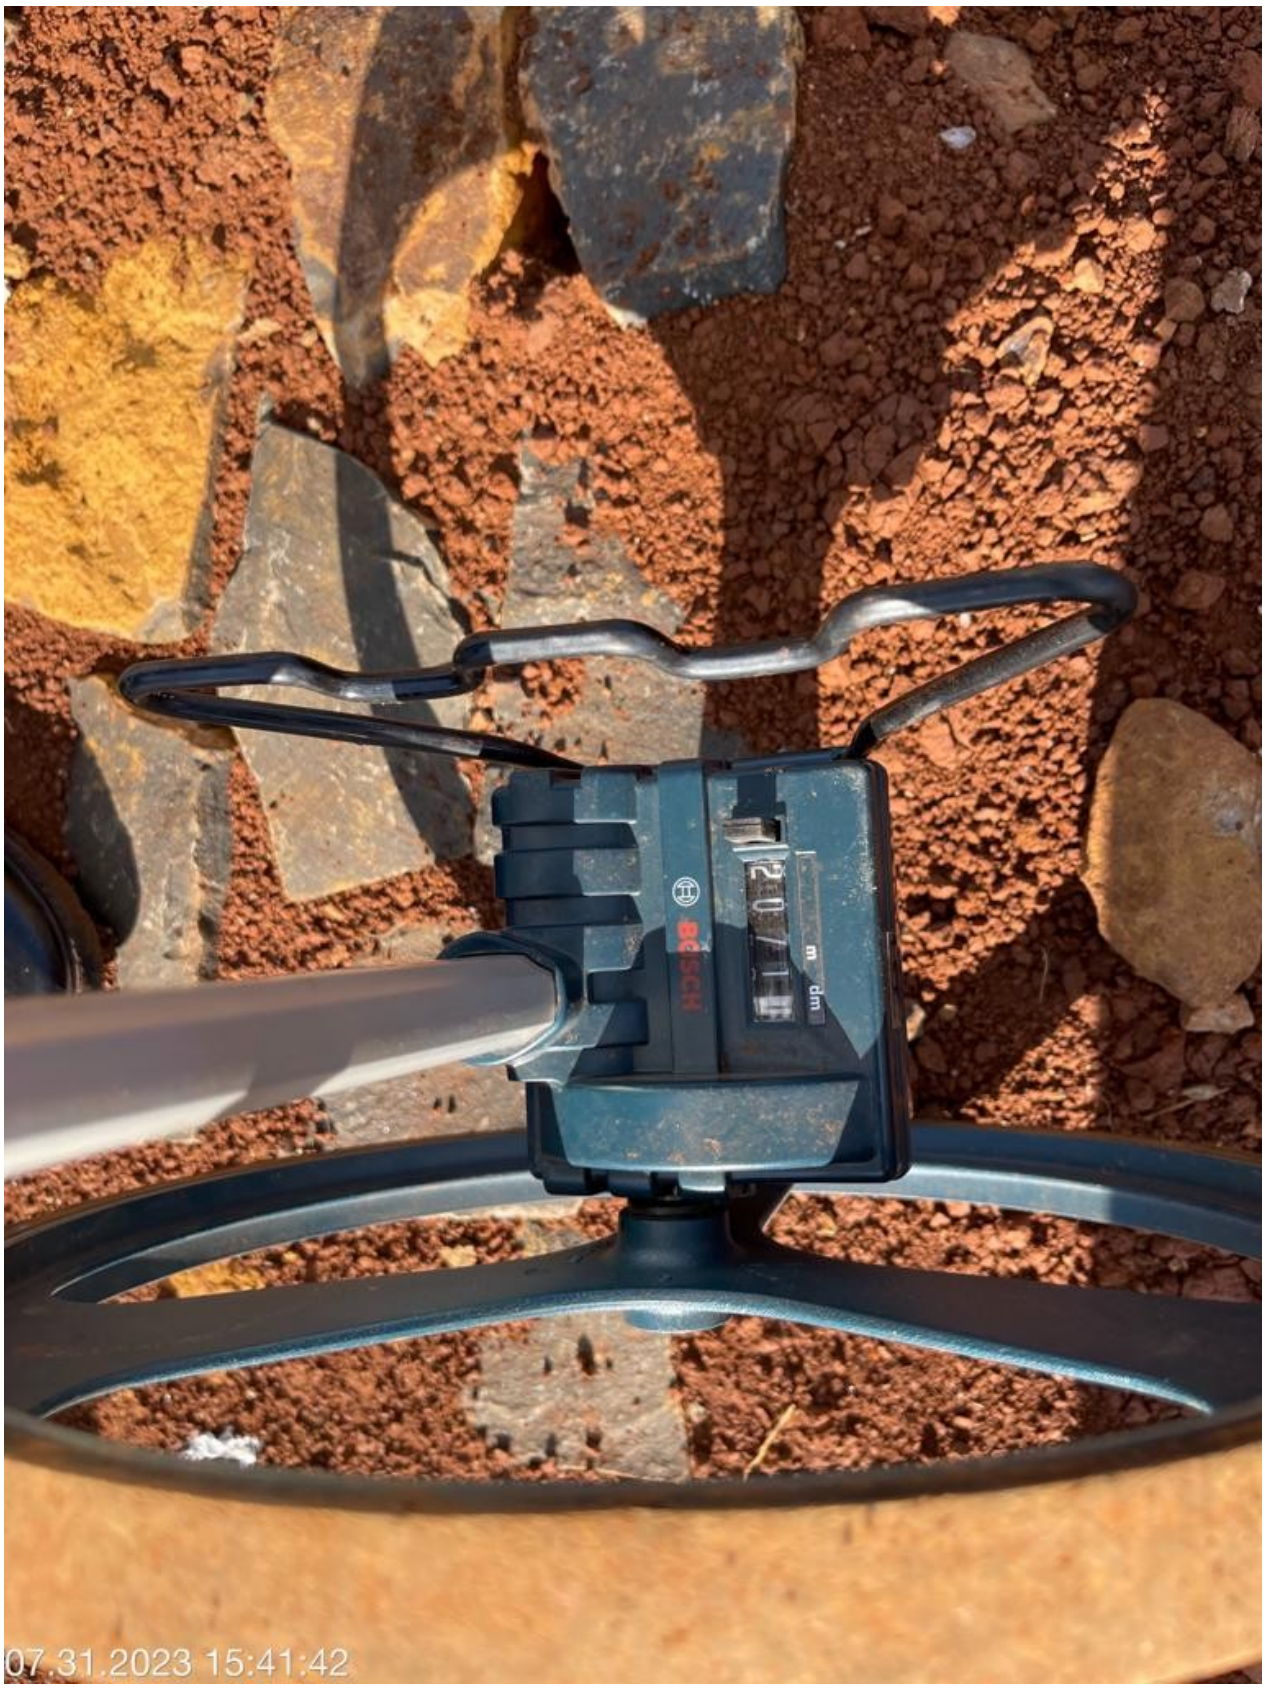

31/05/2023


22/06/2023
S 25° 51' 23", W 52° 31' 15"
PR,Chopinzinho


22/06/2023
S 25° 51' 23", W 52° 31' 15"
PR,Chopinzinho


06.22.2023 15:47:31


07.31.2023 15:43:39

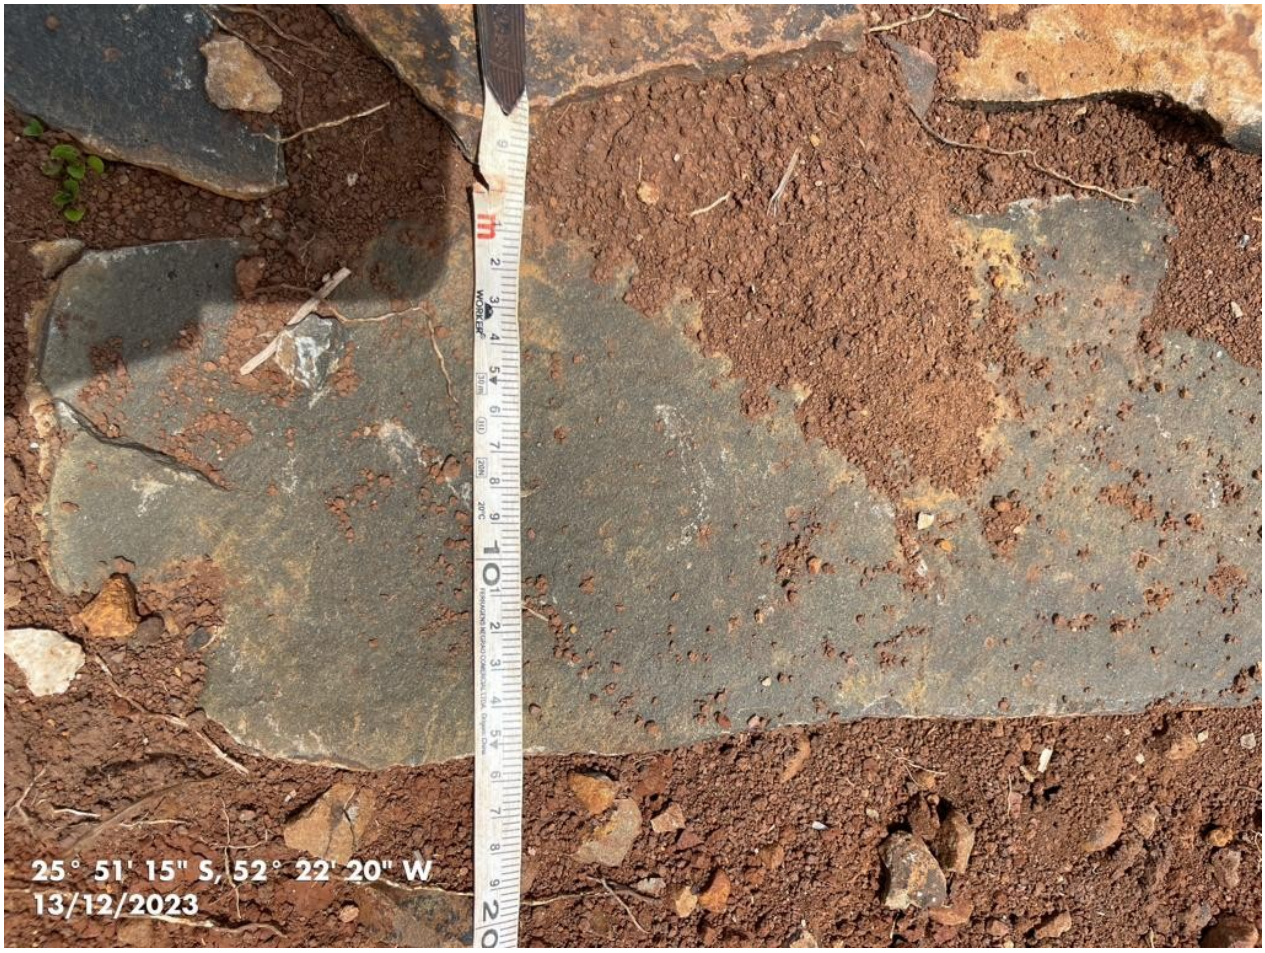

BOSCH
m
dm
07.31.2023 15:41:42


13/12/2023

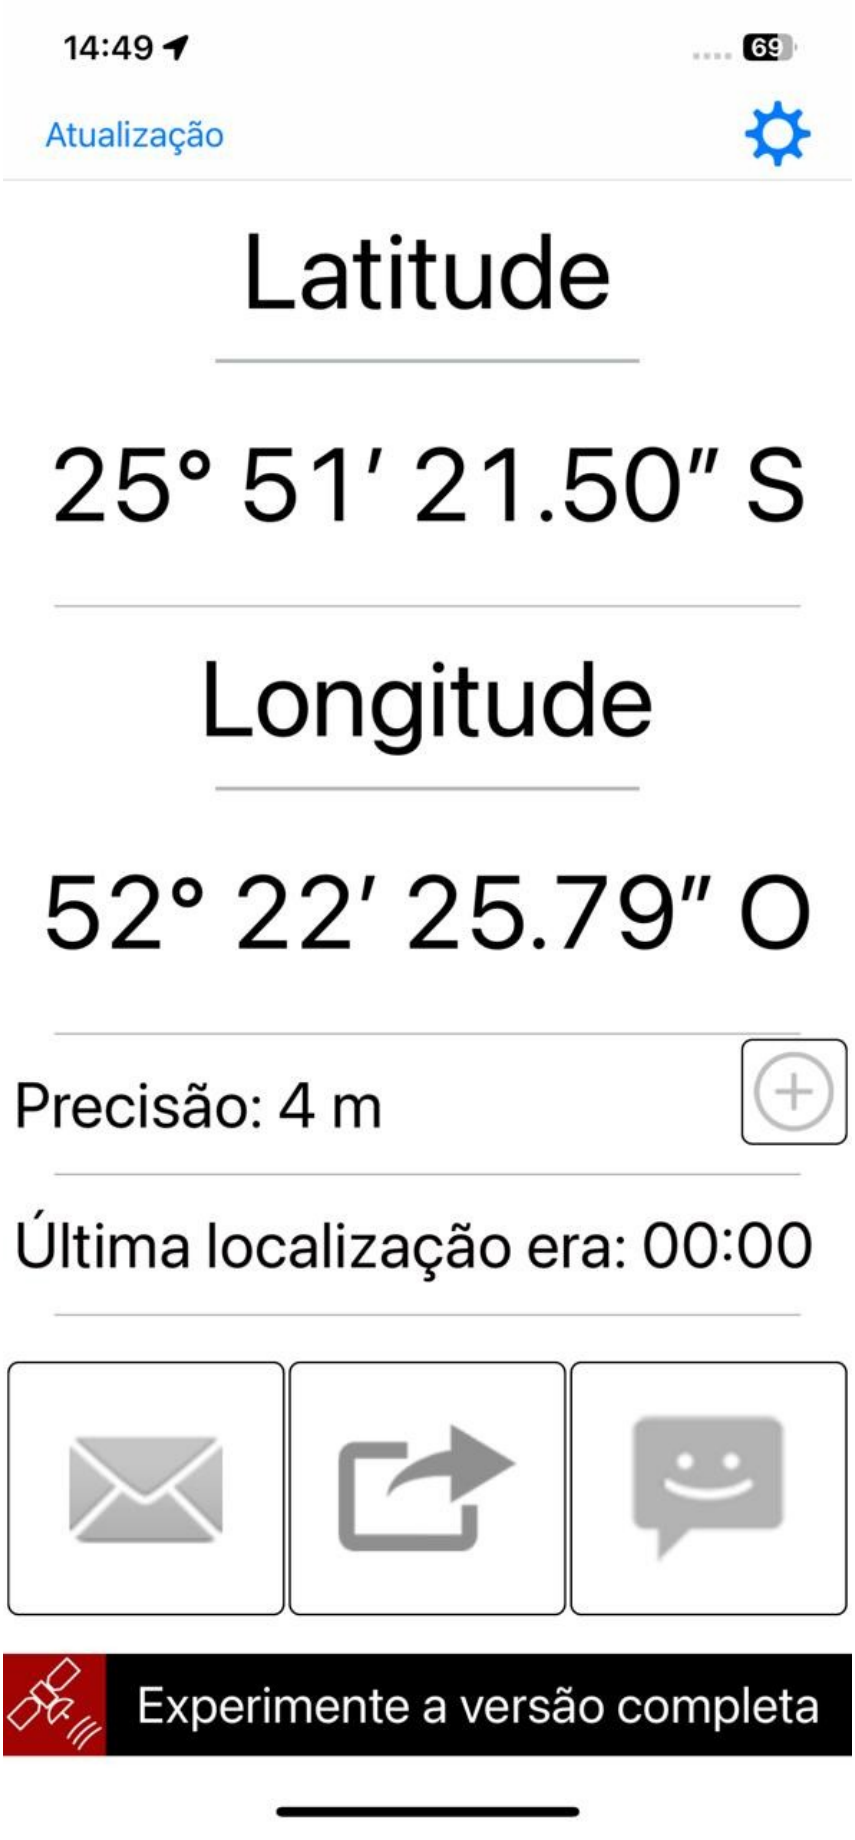

25° 51' 9" S, 52° 22' 16" W
13/12/2023

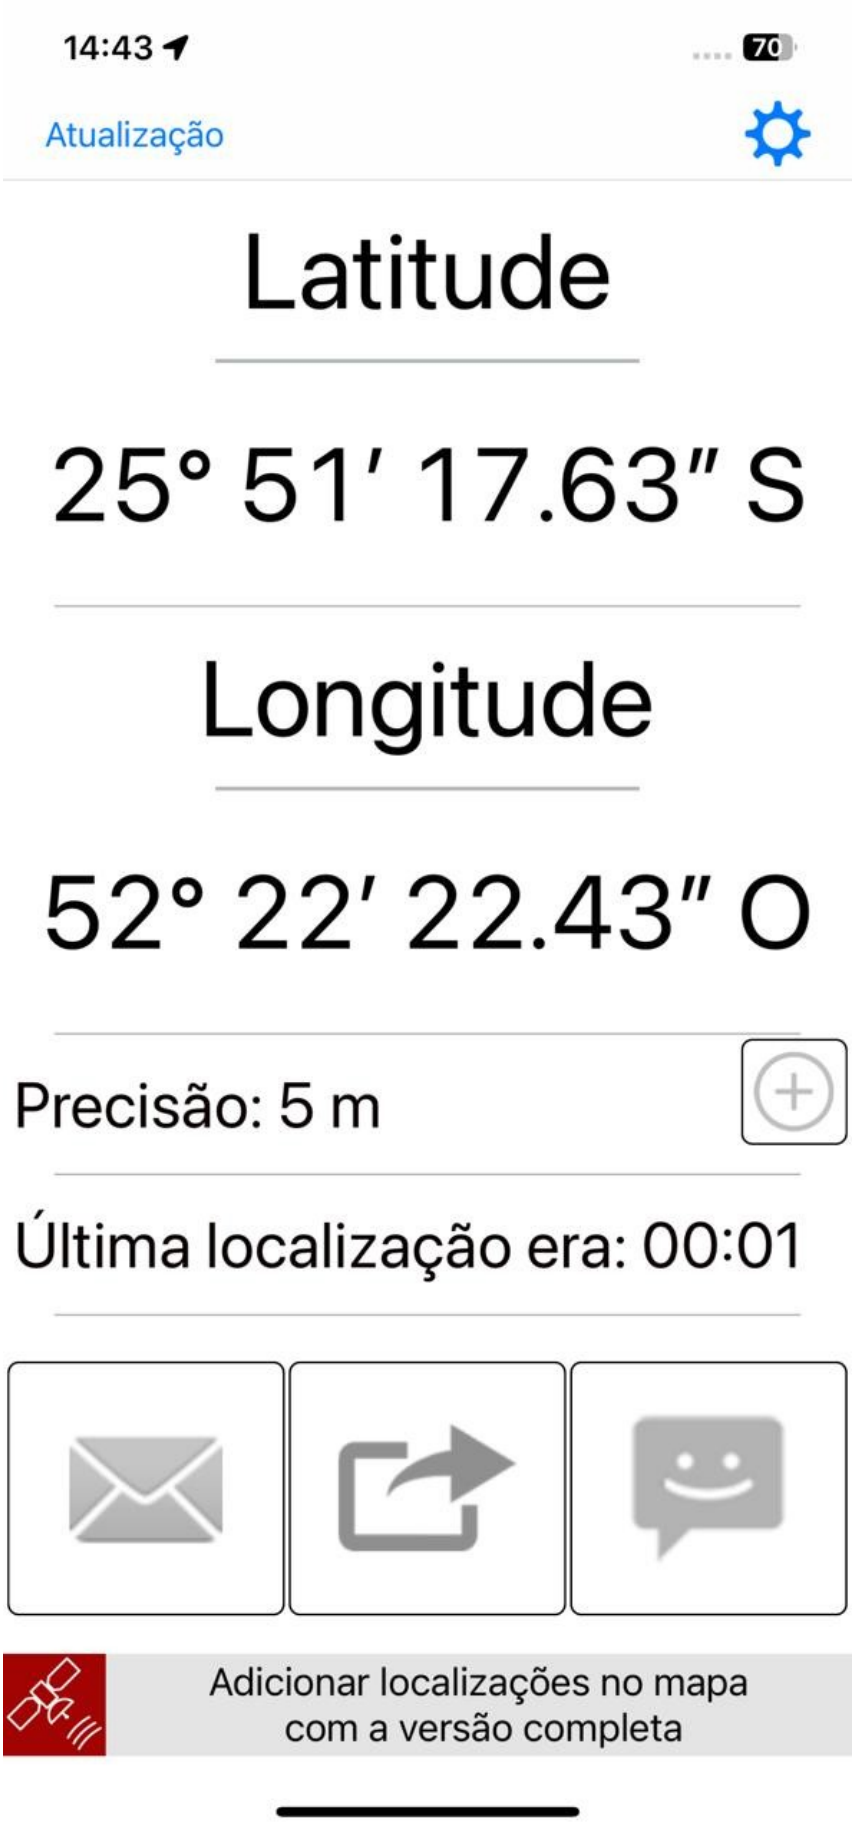

25° 51' 15" S, 52° 22' 20" W
13/12/2023


25° 51' 15" S, 52° 22' 20" W
13/12/2023


25° 51' 15" S, 52° 22' 20" W
13/12/2023


25° 51' 15" S, 52° 22' 20" W
13/12/2023


14:49
69
Atualização
Latitude
25° 51′ 21.50″ S
Longitude
52° 22′ 25.79″ O
Precisão: 4 m
Última localização era: 00:00
Experimente a versão completa


14:43
70
Atualização
Latitude
25° 51′ 17.63″ S
Longitude
52° 22′ 22.43″ O
Precisão: 5 m
Última localização era: 00:01
Adicionar localizações no mapa
com a versão completa


BOSCH
dm m
25° 51' 18" S, 52° 22' 23" W
02/02/2024


02/02/2024


25° 51' 22" S, 52° 22' 26" W
02/02/2024


25° 51' 22" S, 52° 22' 26" W
02/02/2024


Chopinzinho
25° 51' 26" S, 52° 22' 29" W
04/03/2024


Chopinzinho
25° 51' 26" S, 52° 22' 29" W
04/03/2024


25° 52' 30" S, 52° 23' 15" W
04/03/2024


25° 51' 28" S, 52° 22' 31" W
04/03/2024


25° 51' 25" S, 52° 22' 28" W
04/03/2024


Chopinzinho
25° 51' 24" S, 52° 22' 28" W
04/03/2024


04/04/2024


04/04/2024


04/04/2024


04/04/2024


16 de maio de 2024


16 de maio de 2024


TRÂN
IMPED
Propriedade NICO
16 de maio de 2024


16 de maio de 2024


16 de maio de 2024


16 de maio de 2024


27 de junho de 2024


27 de junho de 2024


27 de junho de 2024


27 de junho de 2024


27 de junho de 2024


27 de junho de 2024


30 de julho de 2024
Estrada sem nome
Chopinzinho
Paraná


30 de julho de 2024


30 de julho de 2024


30 de julho de 2024


30 de julho de 2024


30 de julho de 2024
Chopinzinho
Paraná


9 de outubro de 2024


9 de outubro de 2024


9 de outubro de 2024


9 de outubro de 2024


9 de outubro de 2024


9 de outubro de 2024
