Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:35:45

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2022	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Bairro São José, São Miguel e Centro **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 417/2022	270	01/12/2022	R$ 3.056.742,79	100,00%

Nº18/2022
Data Inicial: 01/12/2022

Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Bairro São José, São Miguel e Centro



R$ 3.056.742,79

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30098; 30101; 30154; 30224; 30232; 30234; 30238; 32545; 41110; 41374

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6599	2022	01/12/2022	12249
6600	2022	01/12/2022	12249
2396	2024	26/04/2024	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/12/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
22/03/2024	417/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*5**78**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*6**39**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**32**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**32**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001117	R$ 3.056.923,51	22/02/2022	
Contrato	417	2022	76.995.414/0001-60	9001118	R$ 3.056.742,79	22/09/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001119	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 417/2022	28,89%
9001119	Medição	2	Jurisdicionado	10/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 417/2022	28,89%
9001119	Medição	3	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 417/2022	28,89%
9001153	Paralisação	4	Jurisdicionado	10/03/2023			
9001171	Medição	5	Jurisdicionado	07/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 417/2022	88,06%
9001171	Medição	6	Jurisdicionado	15/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 417/2022	88,06%
9001171	Medição	7	Jurisdicionado	15/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 417/2022	88,06%
9001201	Paralisação	8	Jurisdicionado	04/09/2023			
9001233	Medição	9	Jurisdicionado	26/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 417/2022	100,00%
9001257	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/05/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900123645678					

Nº18/2022
Data Inicial: 01/12/2022

Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Bairro São José, São Miguel e Centro

Documentos



R$ 3.056.742,79

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

MUNICÍPIO	**CHOPINZINHO**
PROJETO/LOTE	**SAM 72**
PROGRAMA	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**
CONTRATADA	**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CONTRATO Nº	**417/2022**
OBJETO	**RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ DIVERSOS E ASFALTO NOVO NA RUA JOAQUIM FÁVERO**

MEDIÇÃO Nº	**03 - FINAL**
DATA DA VISTORIA	**28/03/2023 A 06/03/2024**

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 28/03/2023 até 06/03/2024.

Local: Bairros São José e São Miguel;
Objeto: Pavimentação e Recape de vias urbanas em CBUQ de 34.098,67 m², sendo 26.821,00 m² de recape e 7.277,67 m² de pavimentação nova. Incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento em CBUQ, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

Trecho:

- Rua 7 de Setembro (trecho entre a Rua 14 de Dezembro e a Rua Frei Everaldo) – extensão 260,20 m
- Rua Mário Ceni (trecho entre a Rua Frei Everaldo até a Rua Projetada 6 + 400 m) – extensão 900,00 m
- Rua Diogo Antônio Feijó (trecho entre a Rua 14 de dezembro e a Av. XV de novembro) – extensão 110,40 m
- Rua Castelo Branco (trecho entre a Av. XV de novembro e a Rua Frei Everaldo) – extensão 145,00 m
- Rua Moisés Vendrusculo (trecho entre a Av. XV de novembro e o Fim da Rua) – extensão 110,00 m
- Rua Afonso Pena (trecho entre a Rua 13 de Maio e a Rua Floriano Peixoto) – extensão 143,00 m
- Rua Floriano Peixoto (trecho entre a Rua Afonso Pena e a Av. Getúlio Vargas) – extensão 316,00 m
- Rua Presidente Dutra (trecho entre a Rua Coronel San Thiago Dantas e a Rua 14 de Dezembro) – extensão 135,30 m
- Rua João Bordinhão (trecho entre a Rua Coronel San Thiago Dantas e a Rua 14 de Dezembro) – extensão 135,30 m
- Rua Joaquim Fávero (trecho entre a Rua Mário Ceni e a Rua Nébito Simões de Oliveira) – extensão 700,00 m.

Área Pavimentada: 7.277,67 m²
Área de Recape: 26.821,00 m²
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 270 (duzentos e setenta) dias;
Patrimônio líquido mínimo: R$ 305.600,00 (trezentos e cinco mil e seiscentos reais);
Preço máximo: R$ 3.056.923,51 (três milhões, cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos).

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

   Placas de obra.

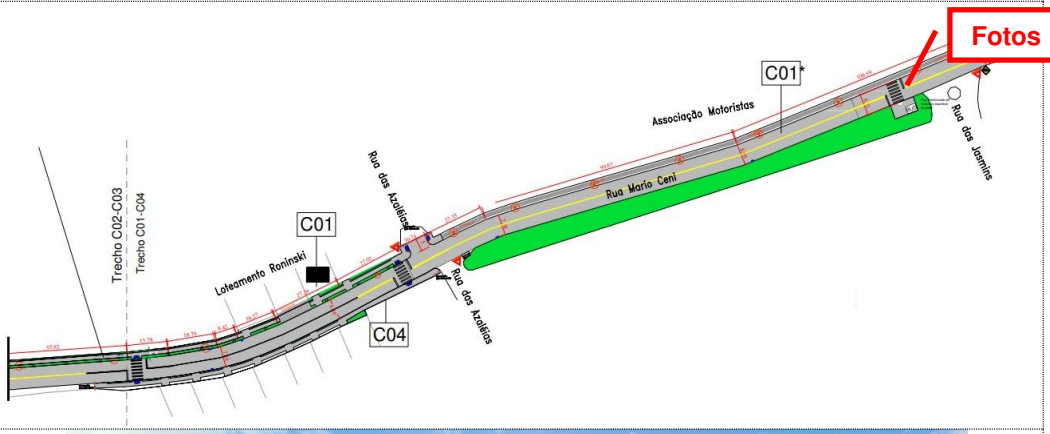




Foto 01 – Placa da obra instalada na Rua Mário Ceni.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212



Foto 02 – Placa da obra instalada na Rua Mário Ceni.



(QRCODE em detalhe)

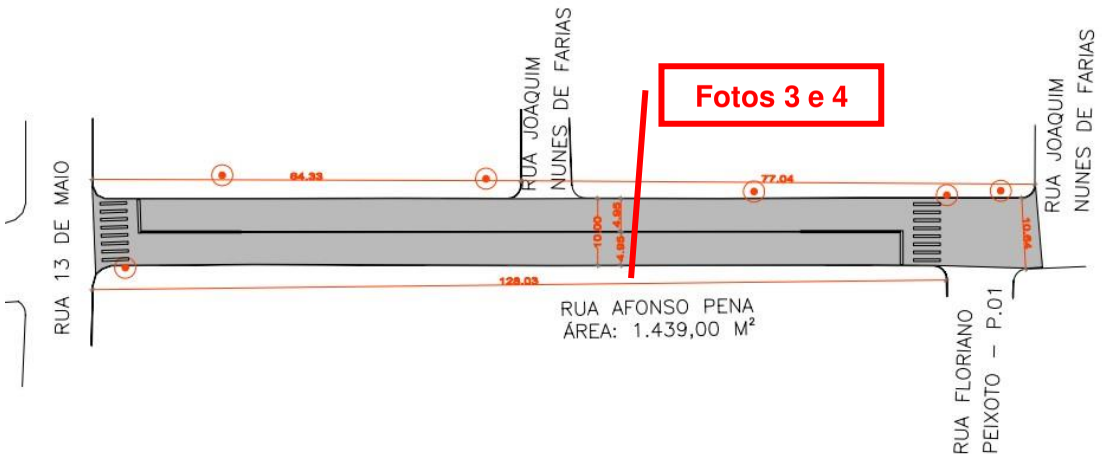




Foto 03 – Placa da obra instalada na Rua Afonso Pena.



Foto 04 – Placa da obra instalada na Rua Afonso Pena.



(QRCODE em detalhe)

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

2. TERRAPLANAGEM

Execução de Terrapanagem na Rua Joaquim Fávero, pequena intervenção para ajuste de perfil.

Foto 05

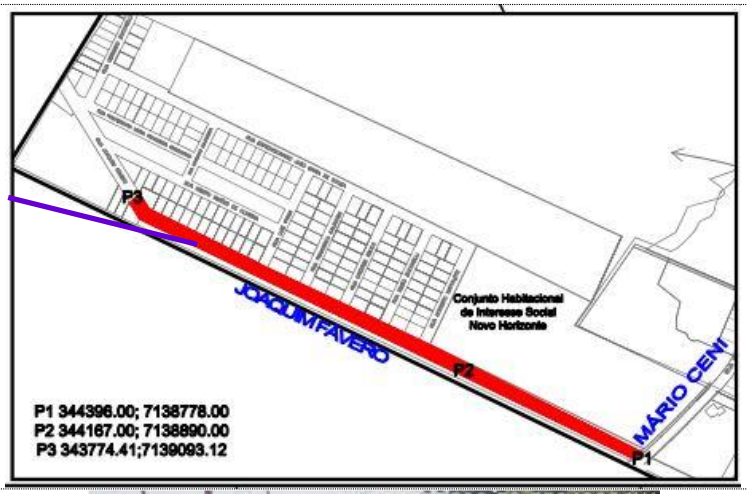




Foto 05 – Regularização e Compactação do Subleito da Rua Joaquim Fávero.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

3. BASE/SUB-BASE

Execução de Base e Sub-base na Rua Joaquim Fávero.

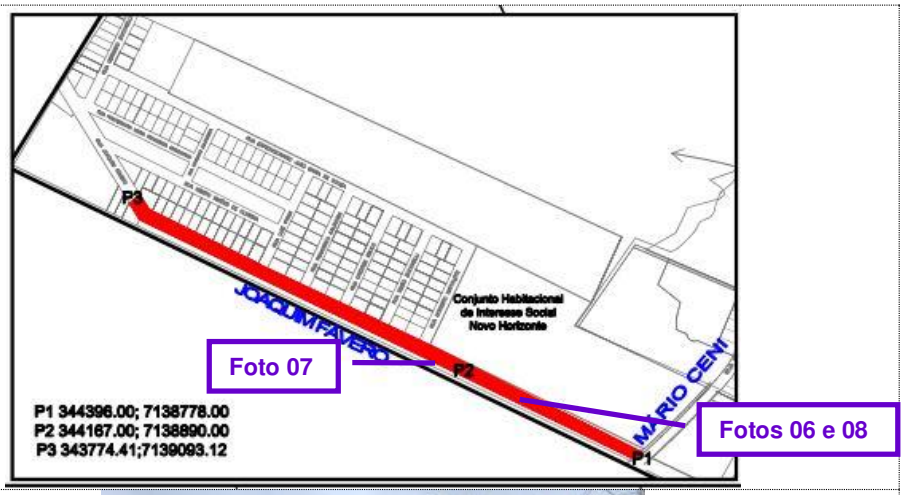




Foto 06 – Execução da Sub-base da Rua Joaquim Fávero.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 07 – Compactação da Base de brita graduada da Rua Joaquim Fávero.



Foto 08 – Base de brita graduada compactada da Rua Joaquim Fávero.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

4. REVESTIMENTO

4.1) Execução de Asfalto novo na Rua Joaquim Fávero.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão; Fornecimento de emulsão EAI – imprimação; Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão; Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação; CBUQ - CAPA Traço 2; Fornecimento de CAP – CBUQ.

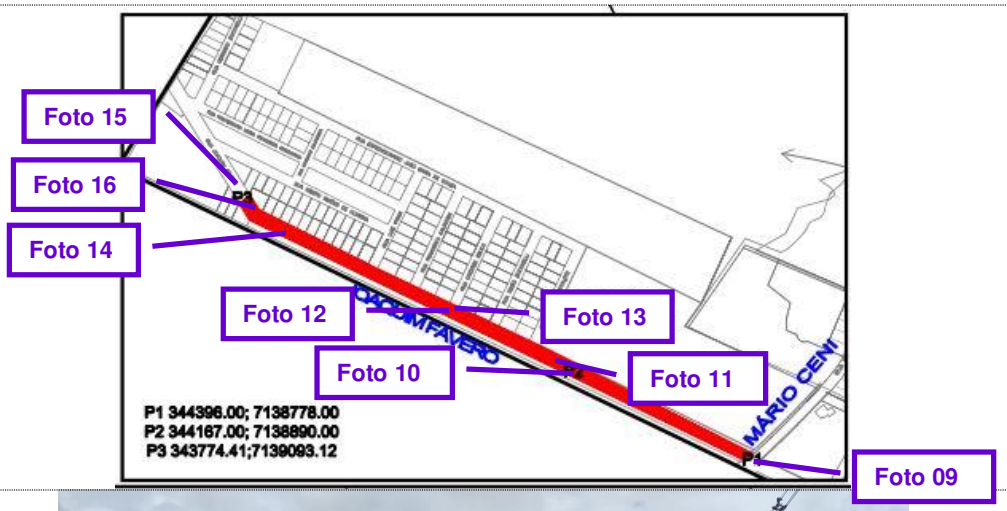




Foto 09

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

4.2) Execução de Recape na Rua Castelo Branco, Rua Moisés Vendrusculo, Rua Presidente Dutra, Rua João Bordinhão, Rua Diogo Antônio Feijó, Rua 7 de Setembro, Rua Afonso Pena, Rua Floriano Peixoto e Rua Mário Ceni.

SERCIÇOS EXECUTADOS: Limpeza e Lavagem da pista; Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão; Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação; CBUQ - CAPA Traço 2; Fornecimento de CAP - CBUQ.

Foto 17

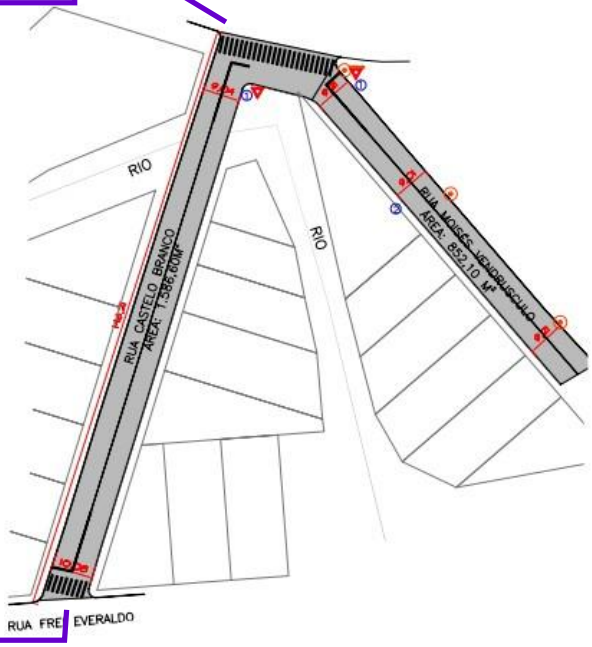


Foto 18

FOTOS DA RUA CASTELO BRANCO


Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212



Foto 17



Foto 18

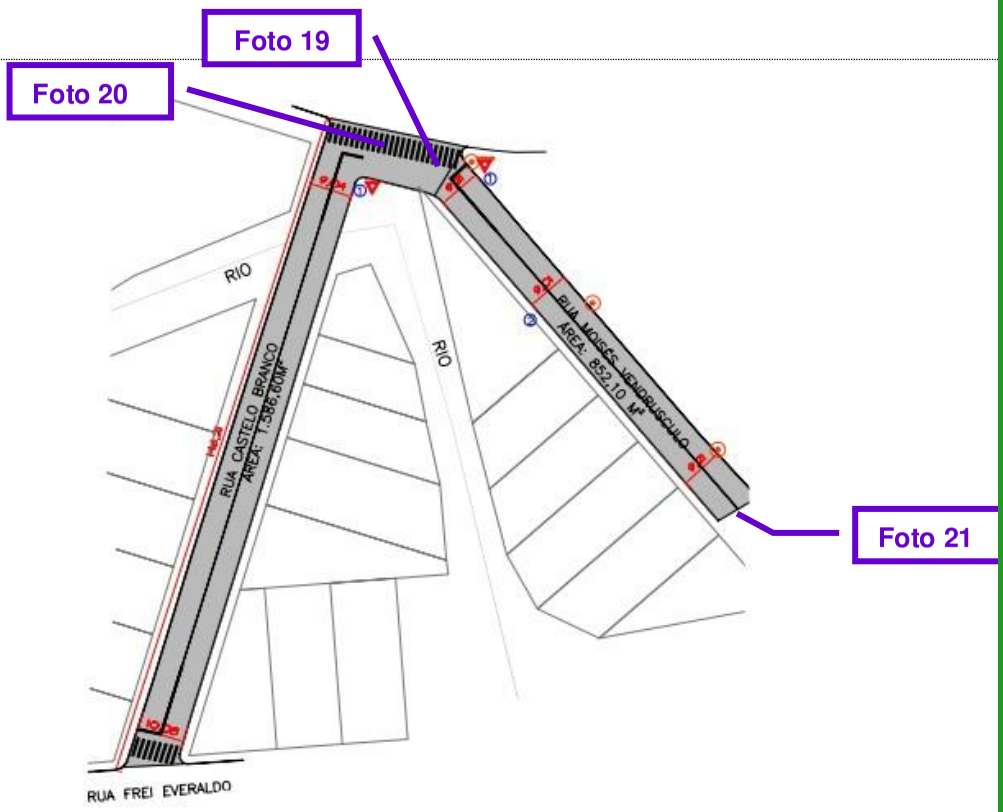

FOTOS DA RUA MOISÉS VENDRUSCULO




Foto 19



Foto 20



Foto 21

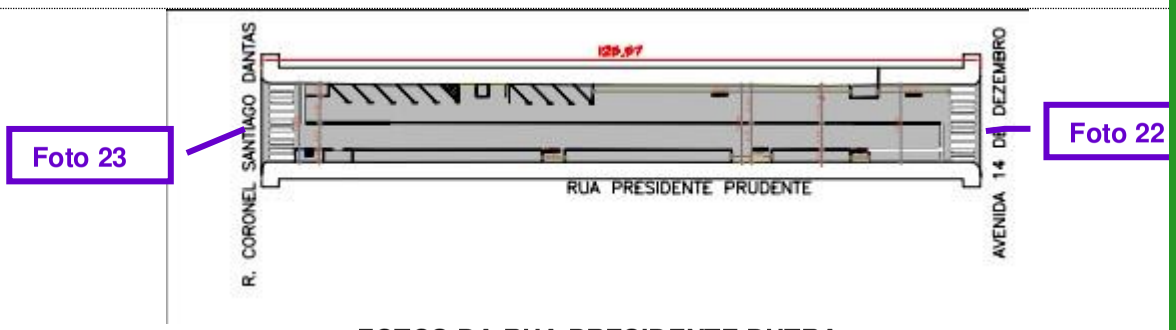

FOTOS DA RUA PRESIDENTE DUTRA



Foto 22



Foto 23




FOTOS DA RUA JOÃO BORDINHÃO



Foto 24



Foto 25

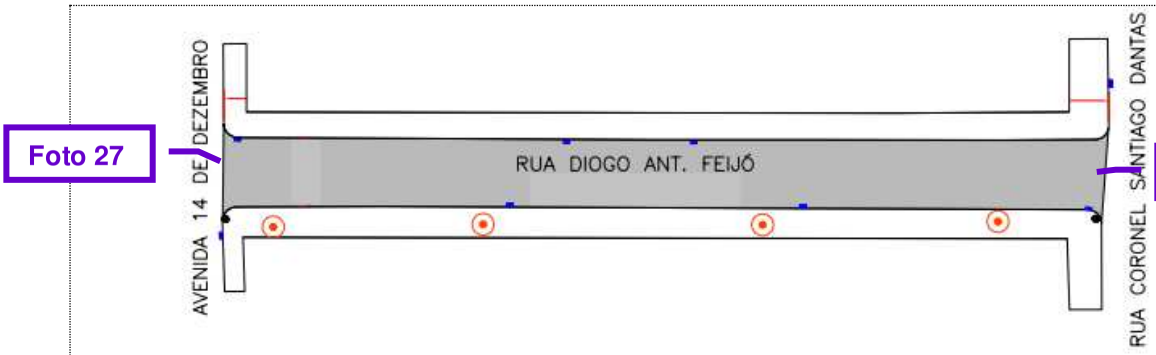

FOTOS DA RUA DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ – Parte 1



Foto 26



Foto 27




FOTOS DA RUA DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ – Parte 2



Foto 28



Foto 29

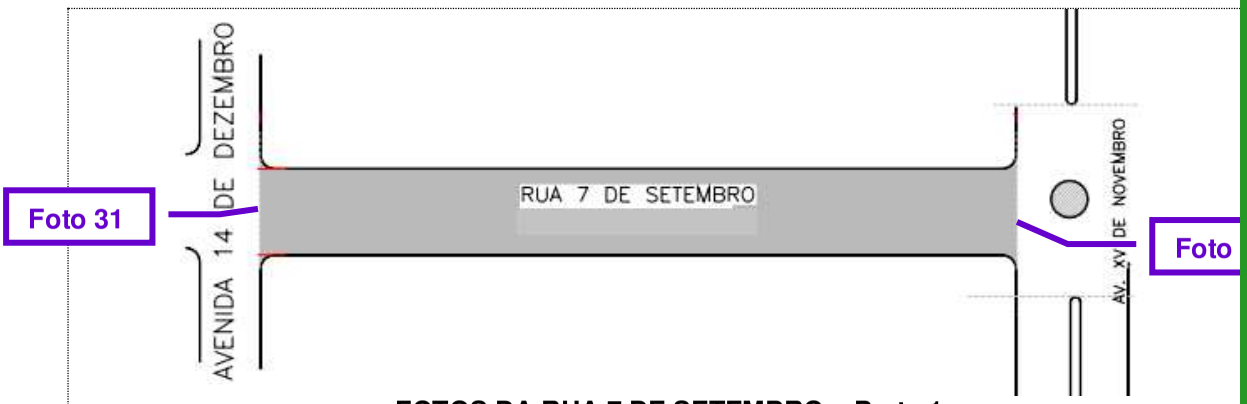

FOTOS DA RUA 7 DE SETEMBRO – Parte 1



Foto 30



Foto 31




FOTOS DA RUA 7 DE SETEMBRO – Parte 2



Foto 32



Foto 33

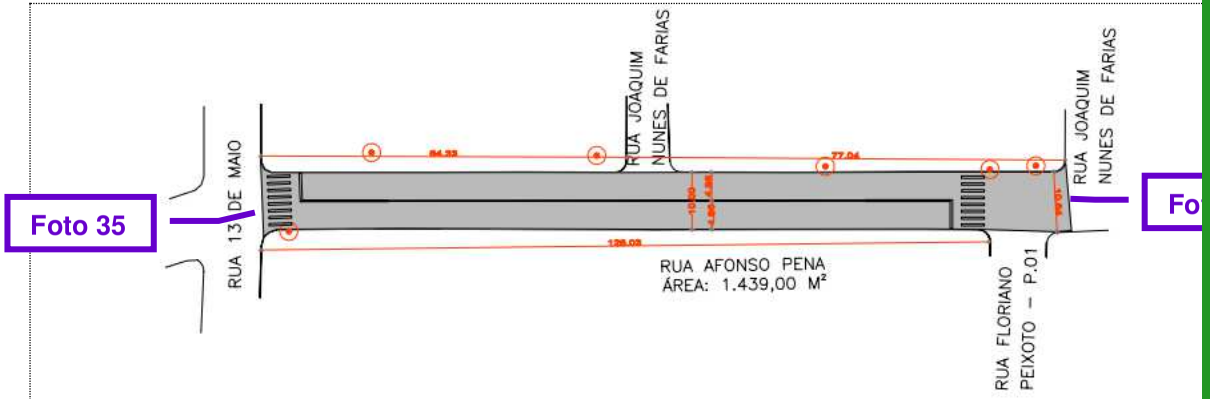

FOTOS DA RUA AFONSO PENA



Foto 34



Foto 35

Foto 36




Foto 3

FOTOS DA RUA FLORIANO PEIXOTO – Parte 1

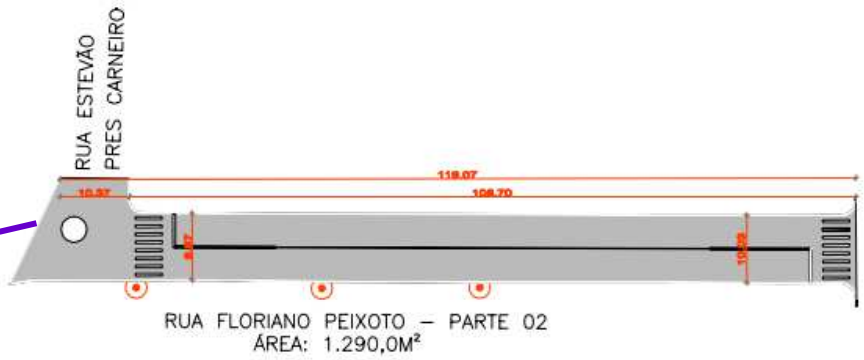


Foto 36



Foto 37

Foto 39



Fo


FOTOS DA FLORIANO PEIXOTO – Parte 2



Foto 38



Foto 39

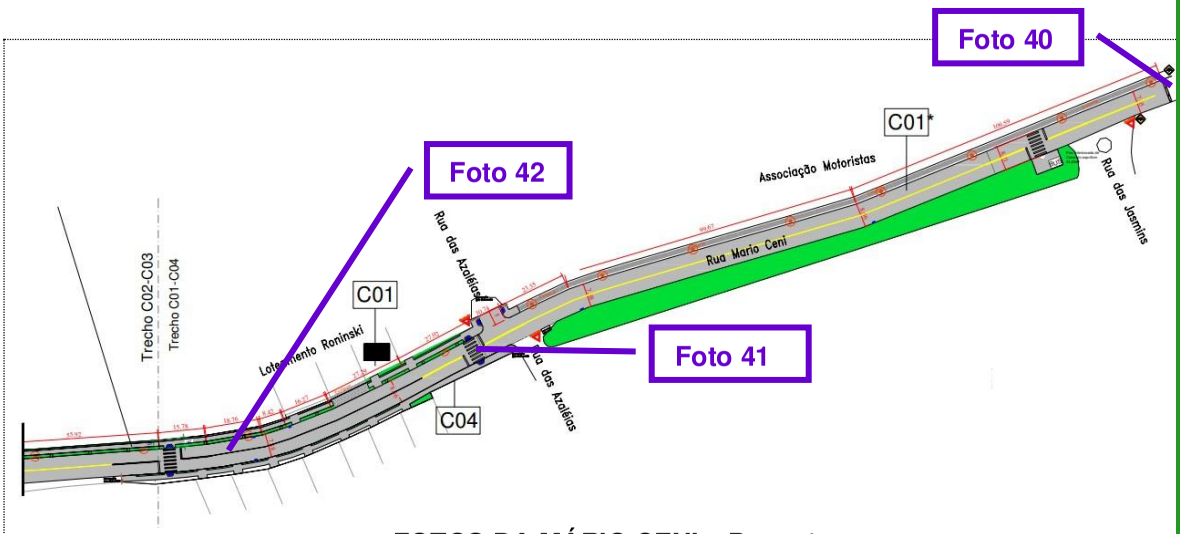

FOTOS DA MÁRIO CENI – Parte 1



Foto 40


Município de Chopinzin
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.b
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Mi
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 41



Foto 42

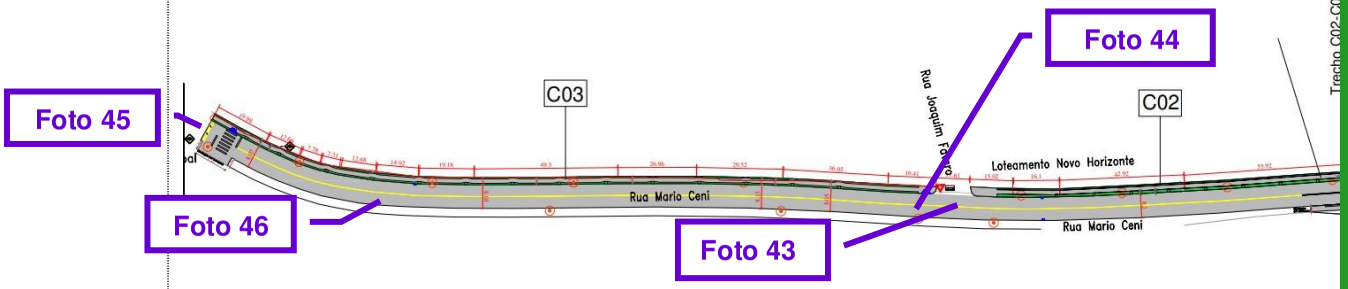

FOTOS DA MÁRIO CENI – Parte 2



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

5. MEIO-FIO E SARJETA

5.1) Execução de meio-fio e sarjeta na Rua Joaquim Fávero. As fotos 09 à 16, inseridas no item 4.1 ilustram também o item 5.1.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado

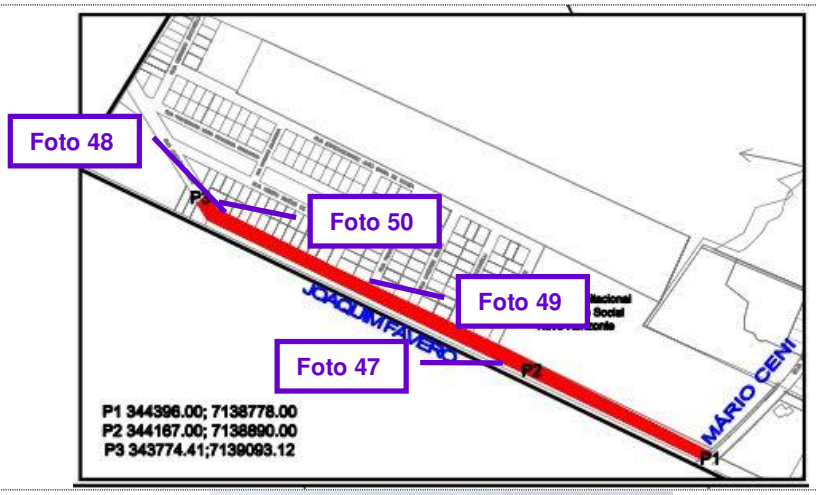




Foto 47

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

Município de Chopinzin
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.b
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Mi
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 48



Foto 49

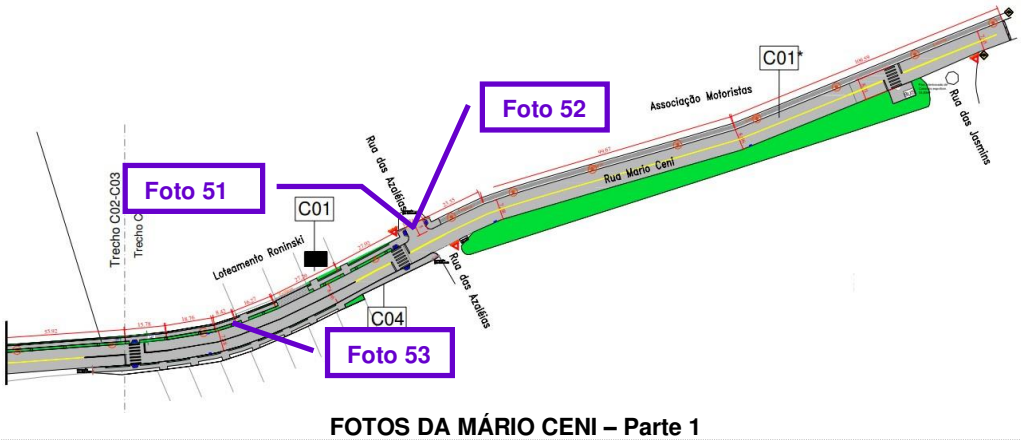


Foto 50

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

5.2) Execução de meio-fio e sarjeta na Rua Mário Ceni e na Rua Moisés Vendrúsculo. As fotos 19 a 21 e 40 a 46, inseridas no item 4.1 ilustram também o item 5.1.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Arrancamento de Meio-Fio; Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta; Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado.



FOTOS DA MÁRIO CENI – Parte 1



Foto 51

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212


Município de Chopinzin
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.b
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Mi
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 52



Foto 53

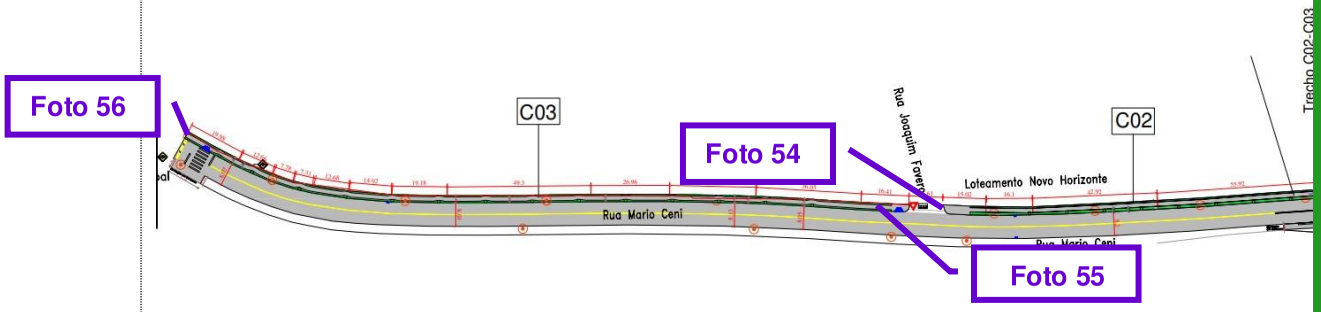

FOTOS DA MÁRIO CENI – Parte 2



Foto 54

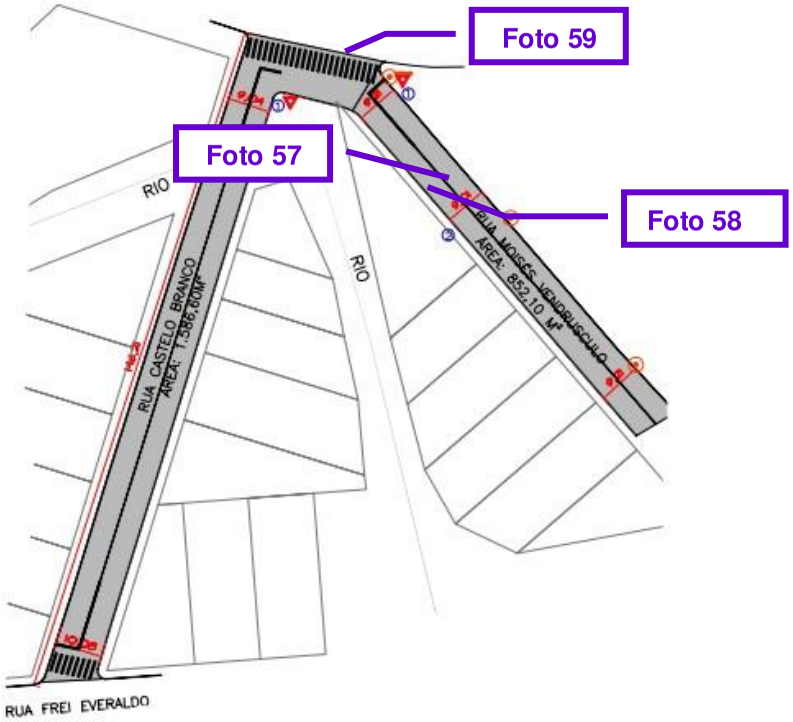


Foto 55



Foto 56

Município de Chopinzin
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.b
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Mi
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



FOTOS DA RUA MOISÉS VENDRUSCULO



Foto 57

Município de Chopinzin
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Mi
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 58



Foto 59

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

6. SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

6.1) Os Serviços de Urbanização executados na Rua Joaquim Fávero foram registrados nas fotos 09 a 16 e 48 a 50, inseridas nos itens 4.1 e 5.1.
SERVIÇOS EXECUTADOS: Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos; Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas; Aço CA-60 Dobr. e Colocação; Calçada Concreto (e = 5,00 cm); Plantio de Árvore com altura até 2m; Plantio de Grama em placas; Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2.

6.2) Os Serviços de Urbanização executados nas Rua Mário Ceni e Moisés Vendrúsculo foram registrados nas fotos 19 a 21, 40 a 46 e 51 a 59, inseridas nos itens 4.2 e 5.2.
SERVIÇOS EXECUTADOS: Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm,014m3/m); Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos; Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas; Aço CA-60 Dobr. e Colocação; Calçada Concreto (e = 6,00 cm); Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão; Plantio de Árvore com altura até 2m; Plantio de Grama em placas; Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2.

7. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

7.1) Os Serviços de Sinalização de Trânsito executados na Rua Joaquim Fávero foram registrados nas fotos 09 a 16 e 48 a 50, inseridas nos itens 4.1 e 5.1.
SERVIÇOS EXECUTADOS: Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2); Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE; Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m; Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO; Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO; Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO; Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO.

7.2) Os Serviços de Sinalização de Trânsito executados nas Rua Mário Ceni e Moisés Vendrúsculo foram registrados nas fotos 19 a 21, 40 a 46 e 51 a 59, inseridas nos itens 4.2 e 5.2.

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SERVIÇOS EXECUTADOS: Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2); Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE; Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m; Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO; Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO; Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO; Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO.

8. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item não previsto no contrato.

9. SERVIÇOS DIVERSOS

Item não previsto no contrato.


Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

10. DRENAGEM

10.1) Os Serviços de Urbanização executados na Rua Joaquim Fávero foram registrados nas fotos 09 a 16 e 48 a 50, inseridas nos itens 4.1 e 5.1.
SERVIÇOS EXECUTADOS: Reaterro e apiloamento mecânico; Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação; Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação.

10.2) Os Serviços de Urbanização executados nas Rua Mário Ceni e Moisés Vendrúsculo foram registrados nas fotos 19 a 21, 40 a 46 e 51 a 59, inseridas nos itens 4.2 e 5.2.
SERVIÇOS EXECUTADOS: Reaterro e apiloamento mecânico; Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação.

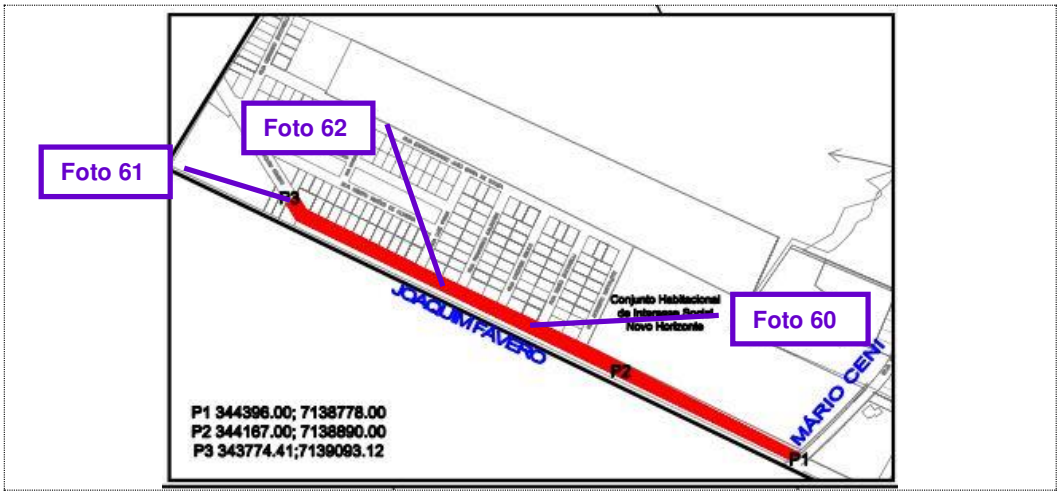

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212



Foto 60



Foto 61

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



Foto 62

11. ENSAIOS TECNOLÓGICOS

ANEXO

Chopinzinho, 06 de março de 2024.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Taiany Blachka Botelho Karl
CREA-SP 5.063.736.630/D
ART 1720226413903

Assinado por 1 pessoa: TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212 e informe o código 2E8F-92C1-B232-D212

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2E8F-92C1-B232-D212

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL (CPF 037.XXX.XXX-33) em 12/04/2024 14:39:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E8F-92C1-B232-D212
