Prefeitura Municipal
de Sulina

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/11/2025 - 01:35:59

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	Iluminação do Estádio Municipal **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 6/2023	90	21/02/2023	R$ 294.118,49	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 21/02/2023

Iluminação do Estádio Municipal

R$ 294.118,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
2286

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5189	2023	11/09/2023	12543
5188	2023	11/09/2023	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2023

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/10/2023	06	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*5*.7**-77	ART (CREA)	17**2*1**66**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*0**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5589	R$ 335.081,65	03/08/2022	
Contrato	6	2023	80.869.886/0001-43	5590	R$ 294.118,49	14/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

5591	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	100,00%
5496	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/10/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
9001529146	900152914674	1	29/08/2023	25/02/2024	

Nº5/2023
Data Inicial: 21/02/2023

Iluminação do Estádio Municipal

Documentos

R$ 294.118,49

N	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50										
3|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	40	50	10									
3|3	3	FUNDACOES	60	40										
3|4	4	ESTRUTURAS	20	50	30									
3|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	50	40									
3|6	6	COBERTURA		30	70									
3|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		40	60									
3|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	50	40									
3|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	50	30									
3|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		40	60									
3|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	20	40	40									
3|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	40	40									

N	4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50										
4|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	30	40	20	10								
4|3	3	FUNDACOES	50	40	10									
4|4	4	ESTRUTURAS	20	40	20	20								
4|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	30	40	20								
4|6	6	COBERTURA		10	70	20								
4|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		30	30	40								
4|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	30	30	30								
4|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	30	30	20								
4|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		30	40	30								
4|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	30	30	30								
4|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	40	20								

N	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	40	20									
5|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	30	10	10							
5|3	3	FUNDACOES	40	40	20									
5|4	4	ESTRUTURAS	20	20	20	20	20							
5|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	15	20	30	30							
5|6	6	COBERTURA			60	40								
5|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		10	30	30	30							
5|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	20	30	20	20							
5|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	20	30	20	10							
5|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		10	30	30	30							
5|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	20	20	30	20							
5|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	20	20	20							

N	6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	30	30									
6|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	20	10	10	10						
6|3	3	FUNDACOES	20	40	40									
6|4	4	ESTRUTURAS	10	20	20	20	20	10						
6|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	30	25	10						
6|6	6	COBERTURA			50	50								
6|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	30	30	20						
6|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	20	20	20	20						
6|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	20	20	20	20	10						
6|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			20	30	30	20						
6|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	10	20	20	20	20						
6|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	20	20	20	20	10						

N	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30	30	30	10								
7|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	20	20	10	10	10	10					
7|3	3	FUNDACOES	20	30	30	20								
7|4	4	ESTRUTURAS	10	10	20	20	20	10	10					
7|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	20	15	10					
7|6	6	COBERTURA			30	40	30							
7|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	20	20	20	20					
7|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	20	20	20	10					
7|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	20	20	20	10	10					
7|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			20	20	20	20	20					
7|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	20	20	20	20	10					
7|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	20	20	20	10	10					

N	8		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	30	20								
8|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10	10				
8|3	3	FUNDACOES	20	20	30	20	10							
8|4	4	ESTRUTURAS	10	10	10	20	20	10	10	10				
8|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	15	10	10	10				
8|6	6	COBERTURA			30	30	30	10						
8|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	20	20	20	20	10				
8|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	20	20	10	10				
8|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	20	20	10	10	10				
8|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	20	20	20	20	10				
8|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	10	20	20	20	10	10				
8|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	20	20	10	10	10				

N	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10							
9|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10	10				
9|3	3	FUNDACOES	20	20	30	20	10							
9|4	4	ESTRUTURAS	10	10	10	10	20	10	10	10	10			
9|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	20	15	10	10	10	10			
9|6	6	COBERTURA			20	20	20	20	20					
9|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	20	20	20	10	10			
9|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	10	20	10	10	10			
9|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	10	20	10	10	10	10			
9|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	20	20	20	10	10			
9|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	20	20	20	10	10	10			
9|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	20	10	10	10	10			

N	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10							
10|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10	10			
10|3	3	FUNDACOES	20	20	20	20	20							
10|4	4	ESTRUTURAS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10		
10|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10		
10|6	6	COBERTURA			20	20	20	20	20					
10|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	20	20	10	10	10		
10|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10		
10|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10		
10|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	20	20	10	10	10		
10|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	20	20	10	10	10	10		
10|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		

N	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	20	20	20	10	10						
11|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10	10			
11|3	3	FUNDACOES	20	20	20	20	20							
11|4	4	ESTRUTURAS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
11|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
11|6	6	COBERTURA			10	20	20	20	20	10				
11|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	10	20	10	10	10	10	
11|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	15	10	10	10	10	5	
11|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	5	10	10	20	10	10	10	10	5	
11|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	10	20	10	10	10	10	
11|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	15	20	10	10	10	10	5	
11|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	

N	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	20	20	20	10	10						
12|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
12|3	3	FUNDACOES	10	20	20	20	20	10						
12|4	4	ESTRUTURAS	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|6	6	COBERTURA			10	20	20	20	20	10				
12|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			5	10	15	20	10	10	10	10	5	5
12|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5

N	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50										
3|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	40	50	10									
3|3	3	FUNDACOES	60	40										
3|4	4	ESTRUTURAS	20	50	30									
3|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	50	40									
3|6	6	COBERTURA		30	70									
3|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		40	60									
3|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	50	40									
3|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	50	30									
3|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		40	60									
3|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	20	40	40									
3|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	40	40									

N	4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50	50										
4|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	30	40	20	10								
4|3	3	FUNDACOES	50	40	10									
4|4	4	ESTRUTURAS	20	40	20	20								
4|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10	30	40	20								
4|6	6	COBERTURA		10	70	20								
4|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		30	30	40								
4|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	30	30	30								
4|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	30	30	20								
4|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		30	40	30								
4|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	30	30	30								
4|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	40	20								

N	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	40	20									
5|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	30	10	10							
5|3	3	FUNDACOES	40	40	20									
5|4	4	ESTRUTURAS	20	20	20	20	20							
5|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	15	20	30	30							
5|6	6	COBERTURA			60	40								
5|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		10	30	30	30							
5|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	20	30	20	20							
5|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	20	20	30	20	10							
5|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		10	30	30	30							
5|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	20	20	30	20							
5|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20	20	20	20	20							

N	6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40	30	30									
6|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	30	20	10	10	10						
6|3	3	FUNDACOES	20	40	40									
6|4	4	ESTRUTURAS	10	20	20	20	20	10						
6|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	30	25	10						
6|6	6	COBERTURA			50	50								
6|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	30	30	20						
6|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	20	20	20	20						
6|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	20	20	20	20	10						
6|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			20	30	30	20						
6|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10	10	20	20	20	20						
6|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	20	20	20	20	10						

N	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30	30	30	10								
7|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20	20	20	10	10	10	10					
7|3	3	FUNDACOES	20	30	30	20								
7|4	4	ESTRUTURAS	10	10	20	20	20	10	10					
7|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	20	15	10					
7|6	6	COBERTURA			30	40	30							
7|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			20	20	20	20	20					
7|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	20	20	20	10					
7|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	20	20	20	10	10					
7|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			20	20	20	20	20					
7|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	20	20	20	20	10					
7|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	20	20	20	10	10					

N	8		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	30	20								
8|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10	10				
8|3	3	FUNDACOES	20	20	30	20	10							
8|4	4	ESTRUTURAS	10	10	10	20	20	10	10	10				
8|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	15	10	10	10				
8|6	6	COBERTURA			30	30	30	10						
8|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	20	20	20	20	10				
8|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	20	20	10	10				
8|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	20	20	10	10	10				
8|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	20	20	20	20	10				
8|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	10	20	20	20	10	10				
8|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	20	20	10	10	10				

N	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10							
9|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10	10				
9|3	3	FUNDACOES	20	20	30	20	10							
9|4	4	ESTRUTURAS	10	10	10	10	20	10	10	10	10			
9|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	20	15	10	10	10	10			
9|6	6	COBERTURA			20	20	20	20	20					
9|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	20	20	20	10	10			
9|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	10	20	10	10	10			
9|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	10	20	10	10	10	10			
9|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	20	20	20	10	10			
9|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	20	20	20	10	10	10			
9|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	20	10	10	10	10			

N	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	30	20	20	10							
10|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10	10			
10|3	3	FUNDACOES	20	20	20	20	20							
10|4	4	ESTRUTURAS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10		
10|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10		
10|6	6	COBERTURA			20	20	20	20	20					
10|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	20	20	10	10	10		
10|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10		
10|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	10	10	10	20	10	10	10	10		
10|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	20	20	10	10	10		
10|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	20	20	10	10	10	10		
10|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		

N	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	20	20	20	10	10						
11|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	20	10	10	10	10	10	10			
11|3	3	FUNDACOES	20	20	20	20	20							
11|4	4	ESTRUTURAS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
11|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
11|6	6	COBERTURA			10	20	20	20	20	10				
11|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	10	20	10	10	10	10	
11|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	15	10	10	10	10	5	
11|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	5	10	10	20	10	10	10	10	5	
11|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	10	20	10	10	10	10	
11|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		5	5	10	15	20	10	10	10	10	5	
11|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	

N	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12|1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20	20	20	20	10	10						
12|2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
12|3	3	FUNDACOES	10	20	20	20	20	10						
12|4	4	ESTRUTURAS	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|6	6	COBERTURA			10	20	20	20	20	10				
12|7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12|8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5
12|10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12|11	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			5	10	15	20	10	10	10	10	5	5
12|12	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5

PAM	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**																
								CONSTRUÇÃO CIVIL									
Município:	**SULINA**		**SAM**	**53**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**		**310,000.00**	**92.51%**
Projeto:	**ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO**		**LOTE nº**	**01**	**Data**	**10/28/2023**	**Dias**	**70**	**Data**	**1/16/2024**	**nº**		**Contrapartida do Proponente**		**25,081.65**	**7.49%**
Quantidade:	**0.00 m2**												**Valor Total**		335,081.65	100.00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Data Início		16/1/24	16/2/24	18/3/24	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99		
	Data Fim		15/2/24	17/3/24	17/4/24	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99	30/12/99		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3,014.86**	0.90
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		10	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**290.40**	0.09
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**331,142.47**	98.82
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		0	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**633.92**	0.19
TOTAIS	**TOTAIS**														335,081.65	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	1,394.60	1,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2,789.19	0.83%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	225.67	0.07%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R$	26.87	134.33	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	268.66	0.08%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$	2.17	10.87	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	21.74	0.01%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$	30,635.57	153,177.84	122,542.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	306,355.68	91.43%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$	2,478.68	12,393.40	9,914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	24,786.79	7.40%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB	TESOURO	R$	0.00	234.59	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	586.47	0.18%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$	0.00	18.98	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	47.45	0.01%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	32,057.03	154,941.35	123,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	92.51%
C		CONTRAPARTIDA	R$	2,593.69	12,536.08	9,951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,081.65	7.49%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	34,650.72	167,477.43	132,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,081.65	100.00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	10.34%	49.98%	39.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		335,081.65	100.00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	10.34%	60.32%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	**Assinatura:**	**Prefeito:**	**Assinatura:**	**data:**

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2.00
	PIS =	0.65
	COFINS =	3.00
	CRPB =	0.00
	TOTAL =	**5.65**
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.00	3.45
RISCOS	1.27	0.85
SEGUROS E GRANTIAS	1.00	0.48
DESPESAS FINANCEIRAS	1.39	0.85
LUCRO	8.44	5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**23.84**	**15.28**
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	**23.84%**	

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**15.28%**

GRANDES ITENS

Município:	SULINA	SAM	53
Projeto:	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	LOTE nº	01

		(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ìtens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,014.86	0.90%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0.00	0.00%
3	FUNDACOES	0.00	0.00%
4	ESTRUTURAS	0.00	0.00%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	290.40	0.09%
6	COBERTURA	0.00	0.00%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	0.00	0.00%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	331,142.47	98.82%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	0.00	0.00%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	633.92	0.19%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	0.00	0.00%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	0.00	0.00%
	TOTAL GERAL 0.00	335,081.65	100.00%

Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
			0.00

103072

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA — SINAPI MAIO 2022 - SEM DESONERAÇÃO — SINAPI MAIO 2022 - SEM DESONERAÇÃO

ESCRITÓRIO REGIONAL	:	0
SUBPROJETO	:	CONSTRUÇÃO CIVIL
PROTOCOLO	:	0
ARQ Nº	:	0
LOCAL	:	0
BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS	:	15.28%
BDI (%) - SERVIÇOS	:	23.84%
DESCONTO (%)	:	0.00%

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: SULINA — **SAM** 53

Projeto : ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO — **LOTE nº** 01

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL QUANT	UNIT	(R$) - SEDU	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS	ORÇAMENTO APROVADO QUANT	UNIT	Paranacidade (R$)	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**								**3.014.86**					**3.014.86**
1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	0		0.00										
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	0		0.00										
COMPOSIÇÃO 11368	DRSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM APRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	2434.48	3.014.86	1.00	3.014.86	3.014.86	3.014.86		1.00	3.014.86	3.014.86	3.014.86	
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**	0	0.00	0.00					**290.40**					**290.40**
5.1		ALVENARIA	0	0.00	0.00										
5.1.12		ENCUNHAMENTO	0	0.00	0.00										
103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	58.62	72.60	4.00	72.60	290.40	290.40		4.00	72.60	290.40	290.40	
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**	0	0.00	0.00					**331.142.47**					**331.142.47**
8.1		ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA	0	0.00	0.00										
8.1.7		POSTES	0	0.00	0.00										
100598	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	772.15	956.23	6.00	956.23	5.737.38	5.737.38		6.00	956.23	5.737.38	5.737.38	
8.2		INSTALAÇÕES ELETICAS	0	0.00	0.00										
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA	0	0.00	0.00										
101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	2344.09	2.902.92	1.00	2.902.92	2.902.92	2.902.92		1.00	2.902.92	2.902.92	2.902.92	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES	0		0.00										
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS	0		0.00										
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	11.42	14.14	900.00	14.14	12.726.00	12.726.00		900.00	14.14	12.726.00	12.726.00	
8.2.5		CABOS	0		0.00										
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV	0		0.00										
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MMº, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.36	12.76	2.000.00	12.76	25.520.00	25.520.00		2.000.00	12.76	25.520.00	25.520.00	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMº, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16.13	19.98	1.500.00	19.98	29.970.00	29.970.00		1.500.00	19.98	29.970.00	29.970.00	
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MMº, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51.60	63.90	150.00	63.90	9.585.00	9.585.00		150.00	63.90	9.585.00	9.585.00	
8.2.8		CAIXAS	0		0.00										
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	UN	164.67	203.93	10.00	203.93	2.039.30	2.039.30		10.00	203.93	2.039.30	2.039.30	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA	0		0.00										
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1321.07	1.636.01	1.00	1.636.01	1.636.01	1.636.01		1.00	1.636.01	1.636.01	1.636.01	
8.2.11		DISJUNTORES	0		0.00										
8.2.11.2		BIPOLARES	0		0.00										
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	71.93	89.08	1.00	89.08	89.08	89.08		1.00	89.08	89.08	89.08	
8.2.11.3		TRIPOLARES	0		0.00										
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	182.13	225.55	6.00	225.55	1.353.30	1.353.30		6.00	225.55	1.353.30	1.353.30	
8.2.11.4		OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR	0		0.00										
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	502.46	622.25	1.00	622.25	622.25	622.25		1.00	622.25	622.25	622.25	
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA	0		0.00										
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO	0		**0.00**										
95589	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	139.20	172.39	16.00	172.39	2.758.24	2.758.24		16.00	172.39	2.758.24	2.758.24	
8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO	0		**0.00**										
95588	SINAPI	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	183.83	227.66	6.00	227.66	1.365.96	1.365.96		6.00	227.66	1.365.96	1.365.96	
8.3.4		CORDOALHA	0		**0.00**										
95589	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	153.85	190.53	6.00	190.53	1.143.18	1.143.18		6.00	190.53	1.143.18	1.143.18	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**	0		0.00								0.00		
1	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LM/W) , PARA USO EXTERNO COM CURVA IES E CATÁLOGO TÉCNICO, DIVIDIDA EM 10 MÓDULOS DE 100W, INCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6902.03	8.547.48	24.00	8.547.48	205.139.52	205.139.52		24.00	8.547.48	205.139.52	205.139.52	
41199	SINAPI-I	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	689.45	853.81	1.00	853.81	853.81	853.81		1.00	853.81	853.81	853.81	
2	COMPOSIÇÃO	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	96.19	119.12	4.00	119.12	476.48	476.48		4.00	119.12	476.48	476.48	
41180	SINAPI-I	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	3663.87	4.537.34	6.00	4.537.34	27.224.04	27.224.04		6.00	4.537.34	27.224.04	27.224.04	
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**	0		**0.00**					**633.92**					**633.92**
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS	0		0.00										
10.1.3		CHAPISCO	0		0.00										
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.67	5.78	8.00	5.78	46.24	46.24		8.00	5.78	46.24	46.24	
10.4		PINTURAS	0		0.00										
10.4.2		EMASSAMENTO	0		0.00										
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13.85	17.16	8.00	17.16	137.20	137.20		8.00	17.16	137.20	137.20	
10.4.3		MASSA ÚNICA	0		0.00										
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	33.64	41.68	8.00	41.68	333.28	333.28		8.00	41.68	333.28	333.28	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA	0		0.00										
95623	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	11.83	14.65	8.00	14.65	117.20	117.20		8.00	14.65	117.20	117.20	

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidad	unitario	Total
1	**Composição**		**1**	**LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LM/W) , PARA USO EXTERNO COM CURVA IES E CATÁLOGO TÉCNICO - DIVIDIDA EM 10 MÓDULOS DE 100W,**	**INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA**	**UN**	**1**		**8547.48**
	Composiç	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	20.03	20.03
	Composiç	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	25.67	25.67
	Cotação	SINAPI	42243	PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1	8501.78	8501.78
2	**Composição**			**DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO**		**UN**	**1**		**96.19**
		SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO	UN		1	81,92	81.92
		SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENC	H		0.2734	23.51	6.427634

		SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPL	H		0.2734	28.68	7.841112



LUMINARE LED
*Travessa Palmeiras, 143 - **FONE (46)99111-8623***
CEP 85506-410 – Pato Branco– Pr – CNPJ 40.829.540/0001-05

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:		**SULINA**							
Projeto :		**ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO**							
CÓDIGO	**ORÍGEM**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UD**	**PU TAB**	**PU+BDI**	**PROJETO ORIGINAL**			
X						**QUANT**	**UNIT**	**(R$) - SEDU**	**(R$) - PM**
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**							
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	2434,48	2.646,44	1,00	2.646,44	2.646,44	2.646,44
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							
5.1		ALVENARIA							
5.1.12		ENCUNHAMENTO							
103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	58,62	63,72	4,00	63,72	254,88	254,88
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							
8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA							
8.1.7		POSTES							
100588	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	772,15	839,38	6,00	839,38	5.036,28	5.036,28
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							
101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	2344,09	2.548,18	1,00	2.548,18	2.548,18	2.548,18
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	11,42	12,41	900,00	12,41	11.169,00	11.169,00

ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
luciane@quessada.net
Luminare LED – EIRELI



LUMINARE LED
*Travessa Palmeiras, 143 - **FONE (46)99111-8623***
CEP 85506-410 – Pato Branco– Pr – CNPJ 40.829.540/0001-05

8.2.5		CABOS							
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV							
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,30	11,20	2.000,00	11,20	22.400,00	22.400,00
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,13	17,53	1.500,00	17,53	26.295,00	26.295,00
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,60	56,09	150,00	56,09	8.413,50	8.413,50
8.2.8		CAIXAS							
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	164,67	179,01	10,00	179,01	1.790,10	1.790,10
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1321,07	1.436,09	1,00	1.436,09	1.436,09	1.436,09
8.2.11		DISJUNTORES							
8.2.11.2		BIPOLARES							
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	71,93	78,19	1,00	78,19	78,19	78,19
8.2.11.3		TRIPOLARES							
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	182,13	197,99	6,00	197,99	1.187,94	1.187,94
8.2.11.4		OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR							
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	502,46	546,21	1,00	546,21	546,21	546,21
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO							
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	139,20	151,32	16,00	151,32	2.421,12	2.421,12
8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO							
96988	SINAPI	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	183,83	199,84	6,00	199,84	1.199,04	1.199,04
8.3.4		CORDOALHA							
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	153,85	167,25	6,00	167,25	1.003,50	1.003,50
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							
1	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LM/W) , PARA USO EXTERNO COM CURVA IES E CATÁLOGO TÉCNICO - DIVIDIDA EM 10 MÓDULOS DE 100W, INCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6902,03	7.502,98	24,00	7.502,98	180.071,52	180.071,52
41199	SINAPI-I	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	689,45	749,48	1,00	749,48	749,48	749,48
2	COMPOSIÇÃO	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	96,19	104,56	4,00	104,56	418,24	418,24

ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
luciane@quessada.net *Luminare LED – EIRELI*



LUMINARE LED
*Travessa Palmeiras, 143 - **FONE (46)99111-8623***
CEP 85506-410 - Pato Branco - Pr - CNPJ 40.829.540/0001-05

41180	SINAPI-I	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	3663,87	3.982,87	6,00	3.982,87	23.897,22	23.897,22
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
10.1.2		CHAPISCO							
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,67	5,08	8,00	5,08	40,64	40,64
10.4		PINTURAS							
10.4.2		EMASSAMENTO							
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13,85	15,06	8,00	15,06	120,48	120,48
10.4.3		MASSA ÚNICA							
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	33,64	36,57	8,00	36,57	292,56	292,56
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							
95623	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	11,83	12,86	8,00	12,86	102,88	102,88
x		**TOTAL GERAL**							**294.118,49**

40.829.540/0001-05

LUMINARE LED EIRELI
Tv. Palmeiras, 143
Industrial
Pato Branco 85.506-410

LUMINARE LED EIRELI – CNPJ 40.829.540/0001-05
LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04

ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA PR-188644/D

25,69892S 52,71671W
535 Rua União da Vitória
Sulina
Paraná

10 de mai. de 2023 20:30:18
Rua Dom Pedro I
Sulina PR
85565-000
Brasil

med01.xls

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

MUNICIPIO : **SULINA**
PROJETO : **ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**
CONVÊNIO :
CONTRATO EMPRESTIMO Nº :
EMPRESA VENCEDORA : **LUMINARE LED EIRELI**
CONTRATO EMPREITADA Nº : 06/2023 DATA : 01/02/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO : **R$ 292.111,25**
SAM : **N 53**
LOTE : **N 01**

MEDIÇÃO Nº: 1
DATA DA MEDIÇÃO : 22/05/2023
ORDEM DE SERVIÇO N.º : 02 2023
DATA : 02/02/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO % MÊS	PREVISTO (R$) MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBI	50,00%	1.323,22	100,00%	2.646,44	2.646,44
02	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	10,00%	25,48	100,00%	254,88	254,88
03	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROT	10,00%	28.865,33	100,00%	288.653,37	288.653,37
04	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS		-	100,00%	556,56	556,56
05				-		-	-
06				-		-	-
07				-		-	-
08				-		-	-
09				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
13				-		-	-
14				-		-	-
15				-		-	-
16				-		-	-
17				-		-	-
18				-		-	-
19				-		-	-
20				-		-	-
21				-		-	-
22				-		-	-
23				-		-	-
24				-		-	-
25				-		-	-
26				-		-	-

Importa a presente medição no valor total de **R$ 292.111,25**
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº, TP 0006/2022 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977
Assinado de forma digital por ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977
Dados: 2023.07.13 09:00:18 -03'00'

Ana Terez Gonçalves Vieira
Engenheira Eletricista
Empresa Executora

Luciano S. Santiago
Engenheiro Civil
Fiscalização Municipal

PAULO HORN
Prefeito Municipal

med01.xls

PREFITURA MUNICIPAL DE SULINA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	CASCAVEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
PARCELA	1	DATA	26/05/2023

MUNICIPIO:	SULINA	Mês	maio				
SUBPROJETO:	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	SAM	53	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITERA:	LUMINARE LED EIRELI	Lote	01	Nº	jun/23	Nº	02 2023
		Ano	2023	DATA:	01/02/2023	DATA	02/02/2023

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS / ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							-	-	-
	1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-	-	-
	COMPOSIÇÃO 113	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS	UN	1,00	100,00%	0,0091	0,91%	2646,44	2.646,44	2.646,44	-
	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-	-	-
	5.1	ALVENARIA							-	-	-
	5.1.12	ENCUNHAMENTO							-	-	-
	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPE	M2	4,00	100,00%	0,0009	0,09%	63,72	254,88	254,88	-
	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
	8.1	ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA							-	-	-
	8.1.7	POSTES							-	-	-
	100588	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMI	UN	6,00	100,00%	0,0172	1,72%	839,38	5.036,28	5.036,28	-
	8.2	INSTALAÇÕES ELÉTICAS							-	-	-
	8.2.2	ENTRADA DE ENERGIA							-	-	-
	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM	UN	1,00	100,00%	0,0087	0,87%	2548,18	2.548,18	2.548,18	-
	8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES							-	-	-
	8.2.3.4	ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							-	-	-
	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	900,00	100,00%	0,0382	3,82%	12,41	11.169,00	11.169,00	-
	8.2.5	CABOS							-	-	-
	8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV							-	-	-
	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	2000,00	100,00%	0,0767	7,67%	11,20	22.400,00	22.400,00	-
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAI	M	1500,00	100,00%	0,0900	9,00%	17,53	26.295,00	26.295,00	-
	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORN	M	150,00	100,00%	0,0288	2,88%	56,09	8.413,50	8.413,50	-
	8.2.8	CAIXAS							-	-	-
	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS	UN	10,00	100,00%	0,0061	0,61%	179,01	1.790,10	1.790,10	-
	8.2.9	QUADROS DE ENERGIA							-	-	-
	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BA	UN	1,00	100,00%	0,0049	0,49%	1436,09	1.436,09	1.436,09	-
	8.2.11	DISJUNTORES							-	-	-
	8.2.11.2	BIPOLARES							-	-	-
	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	78,19	78,19	78,19	-
	8.2.11.3	TRIPOLARES							-	-	-
	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INST	UN	6,00	100,00%	0,0041	0,41%	197,99	1.187,94	1.187,94	-
	8.2.11.4	OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR							-	-	-
	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN	UN	1,00	100,00%	0,0019	0,19%	546,21	546,21	546,21	-
	8.3	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							-	-	-
	8.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO							-	-	-

med01.xls

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILA							-	-	-
	1	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE ALTA LUMINOSIDADE (1000W C/ 125 LM/W) , PARA USO EXTER	UN	24,00	100,00%	0,6164	61,64%	7502,98	180.071,52	180.071,52	-
	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150	UN	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	749,48	749,48	749,48	-
	2	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (	UN	4,00	100,00%	0,0014	0,14%	104,56	418,24	418,24	-
	41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1	UN						-	-	-
	41216	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN TIPO B-1,5	UN	6,00	100,00%	0,0749	7,49%	3648,33	21.889,98	21.889,98	-
	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-	-	-
	10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							-	-	-
	10.1.2	CHAPISCO							-	-	-
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER D	M2	8,00	100,00%	0,0001	0,01%	5,08	40,64	40,64	-
	10.4	PINTURAS							-	-	-
	10.4.2	EMASSAMENTO							-	-	-
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,00	100,00%	0,0004	0,04%	15,06	120,48	120,48	-
	10.4.3	MASSA ÚNICA							-	-	-
	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂN	M2	8,00	100,00%	0,0010	0,10%	36,57	292,56	292,56	-
	10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							-	-	-
	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIO	M2	8,00	100,00%	0,0004	0,04%	12,86	102,88	102,88	-
									-	-	-
									-	-	-
		% PREVISTO :			% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	292.111,25	292.111,25	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$	292.111,25
Medição Acumulada:	R$	-
Total Anterior:	R$	-
Valor Desta Medição:	R$	292.111,25

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Ana Terez Gonçalves Vieira
Engenheira Eletricista
Empresa Executora

ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977
Assinado de forma digital por ANA TEREZA GONCALVES VIEIRA:00965471977
Dados: 2023.07.13 08:54:58 -03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro Civil
Fiscalização Municipal

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	**SULINA**
PROJETO/LOTE	**Nº 53 / LOTE Nº01**
PROGRAMA	**PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**
CONTRATADA	**LUMINARE LED EIRELI**
CONTRATO Nº	**06/2023**
OBJETO	**ESTÁDIO MUNICIPAL**

MEDIÇÃO Nº	**01**
DATA DA VISTORIA	**26/05/2023**

Iluminação do estádio municipal

MAPA / CROQUI / PLANTA BAIXA COM A MARCAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO

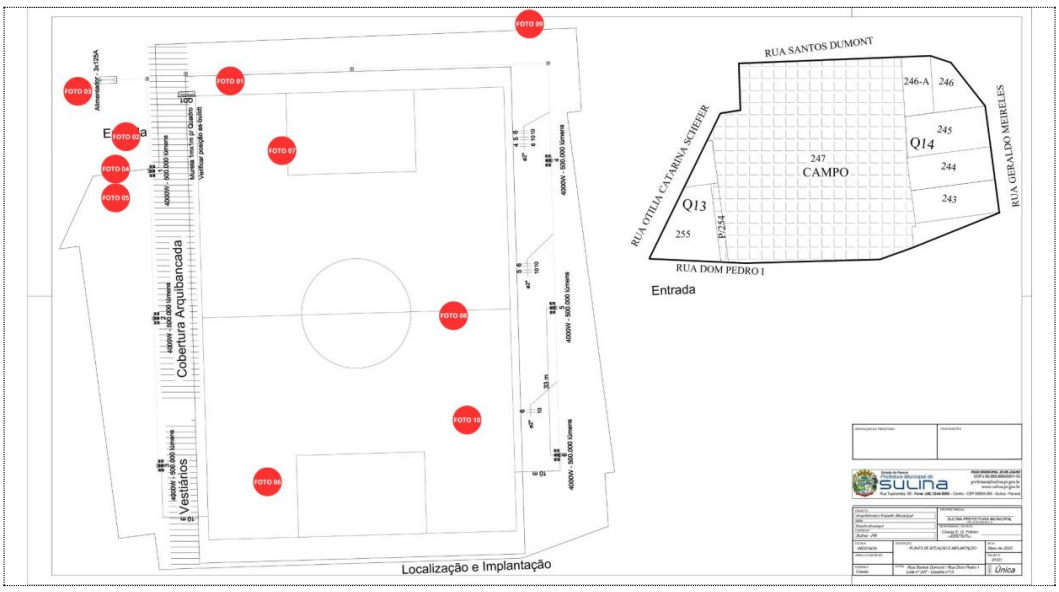

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PLACA DA OBRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01

FOTO 02

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

FOTO 03

FOTO 04

FOTO 05

FOTO 06

FOTO 07

FOTO 08

FOTO 09

FOTO 10

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - **Fone: (46) 3244-8000** - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

FOTO 11

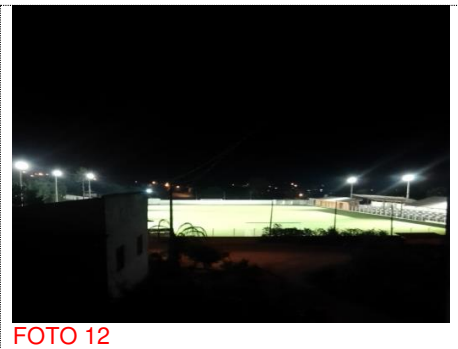

FOTO 12

Sulina, 26 de maio de 2023.

_____
Luciano S. Santiago
CREA-PR: 31879/D
ART de fiscalização: 1720230729820

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.015.29146/74-001 **Período: 27/02/2023 a 31/07/2023**
Endereço: RUA OTILIA CATARINA SCHEFFER, 247, CENTRO, SULINA/PR, 85565-000
Contribuinte: LUMINARE LED LTDA
CNPJ: 40.829.540/0001-05

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil:

I - que consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou sobre o qual tenha sido proferida decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencido; e

II - que não consta débito inscrito em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, conforme disposto no art. 206 do CTN.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever outros débitos que vierem a ser apurados, referentes à obra de construção civil objeto da aferição.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br> ou <https://www.gov.br/pgfn/pt-br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 09:12:49 do dia 29/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2024.
Código de controle da certidão: **B573.5EDA.D420.9FC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

paranacidade

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:
SULINA

SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
55451	53	1	22/05/2023

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO
LUMINARE LED EIRELI

CNPJ/ CPF
40829540000105

Nº CONTRATO:
06/2023

VALOR:
R$ 292.111,25 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Iluminação do estádio municipal

LOCALIZAÇÃO:
RUA OTÍLIA CATARINA SCHEFER - LOTE 247 NO PERÍMETRO URBANO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Construção de ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL com a execução dos serviços de: serviços preliminares e administração de obra; Alvenaria; Instalações Elétricas, Revestimentos e damis itens e especificações constantes em projetos.

Em vinte e um de agosto do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Ana Tereza Gonçalves Vieira
Eng. Eletricista - CREA PR nº 188.644/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Luciano S. Santiago
Eng. Civil - CREA PR nº 31.789/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

PAULO HORN
PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Sulina, 21 de agosto de 2023

Gildete Cristina Bonetti Vescovi
Arq. Urb. - CAU nº A19081-0
Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

PARANACIDADE

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:
SULINA

SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
55451	53	1	22/05/2023

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO
LUMINARE LED EIRELI

CNPJ/ CPF: 40829540000105

Nº CONTRATO: 06/2023

VALOR:
R$ 292.111,25 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Iluminação do estádio municipal

LOCALIZAÇÃO:
RUA OTÍLIA CATARINA SCHEFER - LOTE 247 NO PERÍMETRO URBANO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Construção de ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL com a execução dos serviços de: serviços preliminares e administração de obra; Alvenaria; Instalações Elétricas, Revestimentos e damis itens e especificações constantes em projetos.

Em vinte e dois de maio do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório da obra acima referida,
executada em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 90 (noventa) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.

Ana Tereza Gonçalves Vieira
Eng. Eletricista - CREA PR nº 188.644/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Luciano S. Santiago
Eng. Civil - CREA PR nº 31.789/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

PAULO HORN
PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Sulina, 22 de maio de 2023

Gildete Cristina Bonetti Vescovi
Arq. Urb. - CAU nº A19081-0
Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE
