Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:07:00

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2025	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PASSO DO SOL CONVENIO 955848/2024/MAPA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 145/2025	540	21/07/2025	R$ 816.000,00	100,00%

Nº6/2025
Data Inicial: 21/07/2025

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PASSO DO SOL CONVENIO 955848/2024/MAPA



R$ 816.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30378

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4059	2025	29/07/2025	12249
4018	2025	29/07/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4061	01/11/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/01/2027	145/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*5**28**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*3**06**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*3**06**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*0*.4**-97	ART (CREA)	17**2*5**06**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001388	R$ 883.323,10	30/08/2024	
Contrato	145	2025	76.995.414/0001-60	9001389	R$ 816.000,00	03/06/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001390	Medição	1	Jurisdicionado	25/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	44,30%
9001390	Medição	2	Jurisdicionado	24/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	44,30%
9001390	Medição	3	Jurisdicionado	24/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	44,30%
9001412	Medição	4	Jurisdicionado	24/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	64,76%
9001412	Medição	5	Jurisdicionado	24/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	64,76%
9001434	Medição	6	Jurisdicionado	14/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	86,75%
9001449	Medição	7	Jurisdicionado	22/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	100,00%
9001449	Medição	8	Jurisdicionado	22/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	100,00%
9001449	Medição	9	Jurisdicionado	22/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	100,00%
9001522	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/08/2026			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900257731079					

Nº6/2025
Data Inicial: 21/07/2025

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PASSO DO SOL CONVENIO 955848/2024/MAPA

Documentos



R$ 816.000,00









1020debd-bfee-4ad4-9f14-33bacd46eae1



1d2f0fa7-126a-4b27-b6d0-cc085ce27496




24/02/2026, 12:23
-25.814836,-52.441452
Chopinzinho PR
85560-000


24/02/2026, 12:24
-25.815323,-52.441392
Chopinzinho PR
85560-000

4da37dad-b333-47f9-8dd2-d752e0b4e4ac



7385b736-3344-42ed-9001-44865402fac5




24/02/2026, 12:22
-25.814890,-52.441443
Chopinzinho PR
85560-000

16cd657d-fd77-49bc-8274-77c54a2185a5



75a6a934-2ac8-4d3d-b622-619940a3e402



77c3f562-e388-4d63-9c27-074f17e82f36



8d6b272b-2e53-4cfa-bb6b-9472b784362a



a2cbe272-ca17-45d3-a725-237defc96df9




250bc4f1-cdc7-40e8-8f35-091b771974ef




9a496bc6-2959-42a3-a97b-3b2d9ebb4f1a

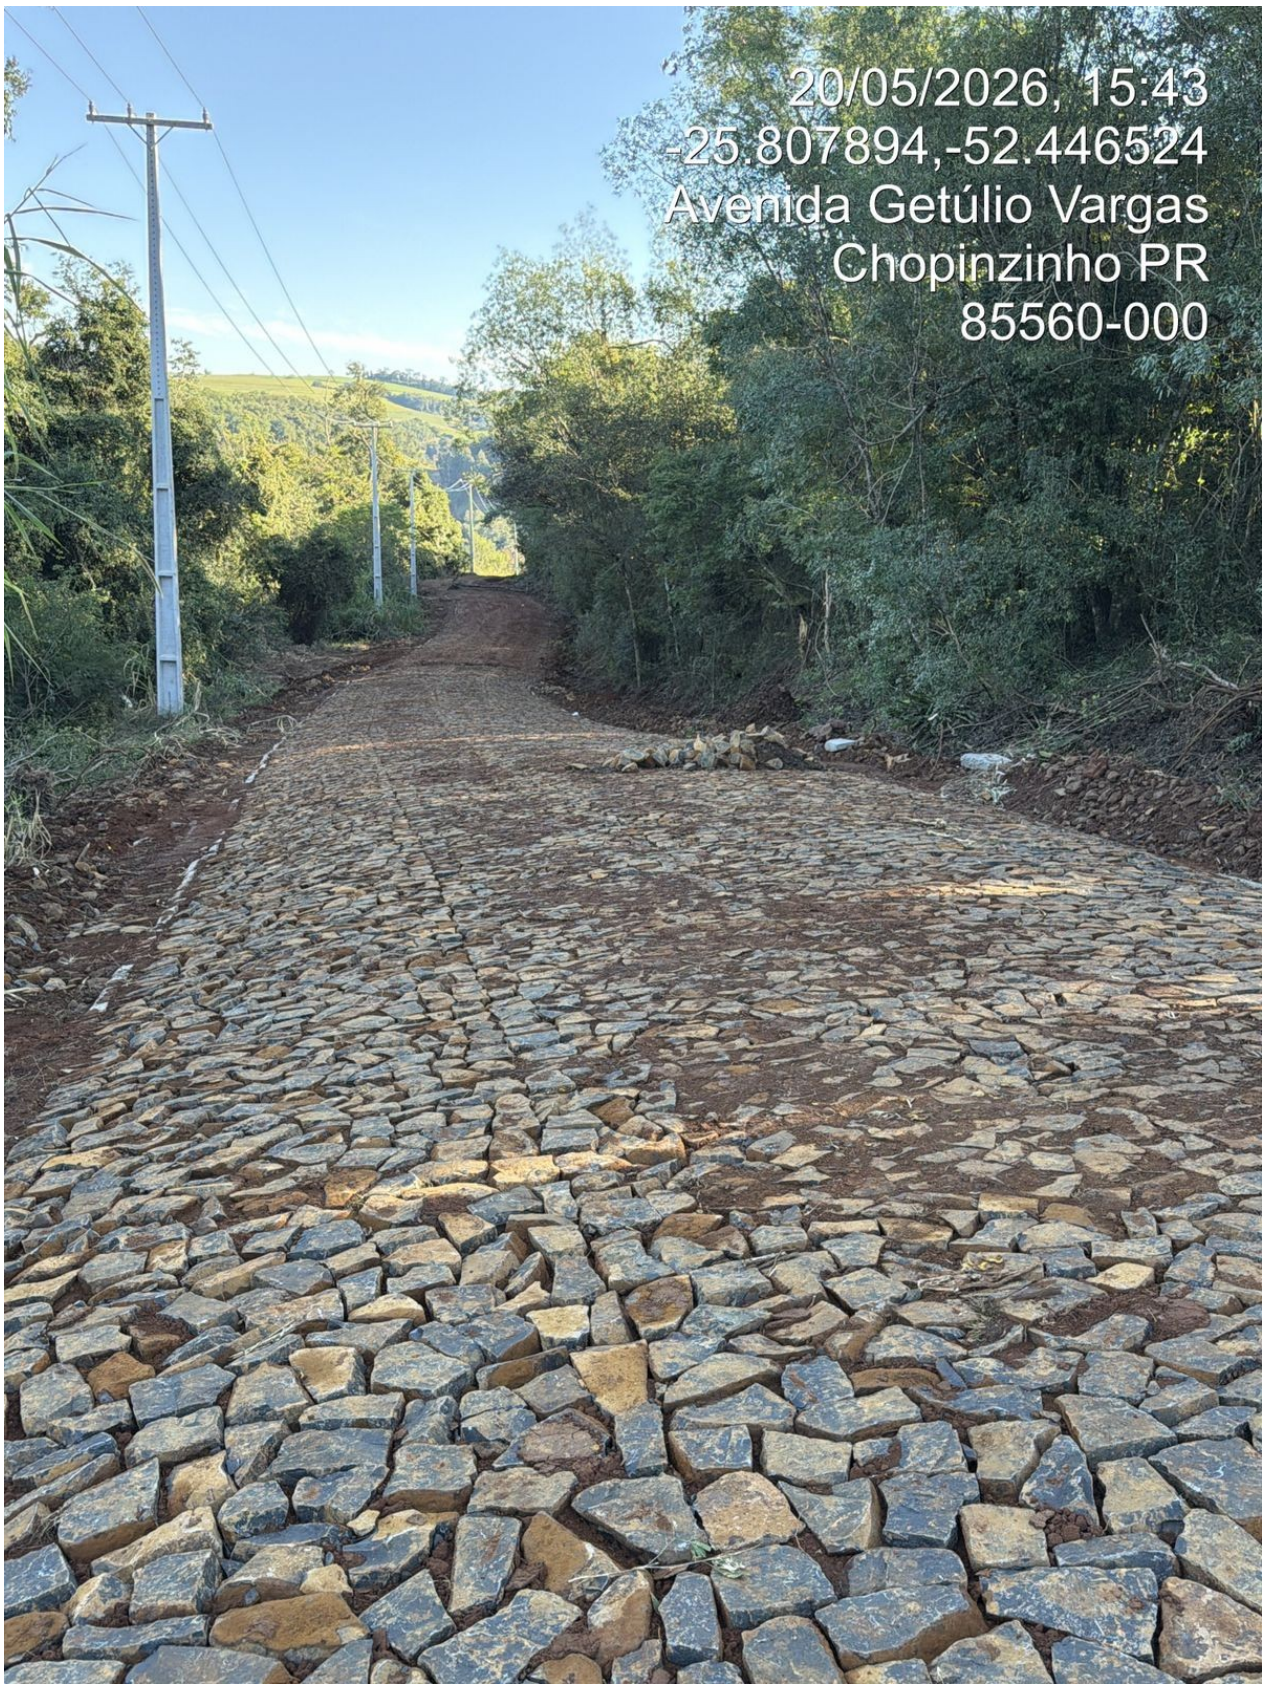


20/05/2026, 15:43
-25.807894,-52.446524
Avenida Getúlio Vargas
Chopinzinho PR
85560-000

ba04aa29-6feb-42b5-8589-78fae07b34a4

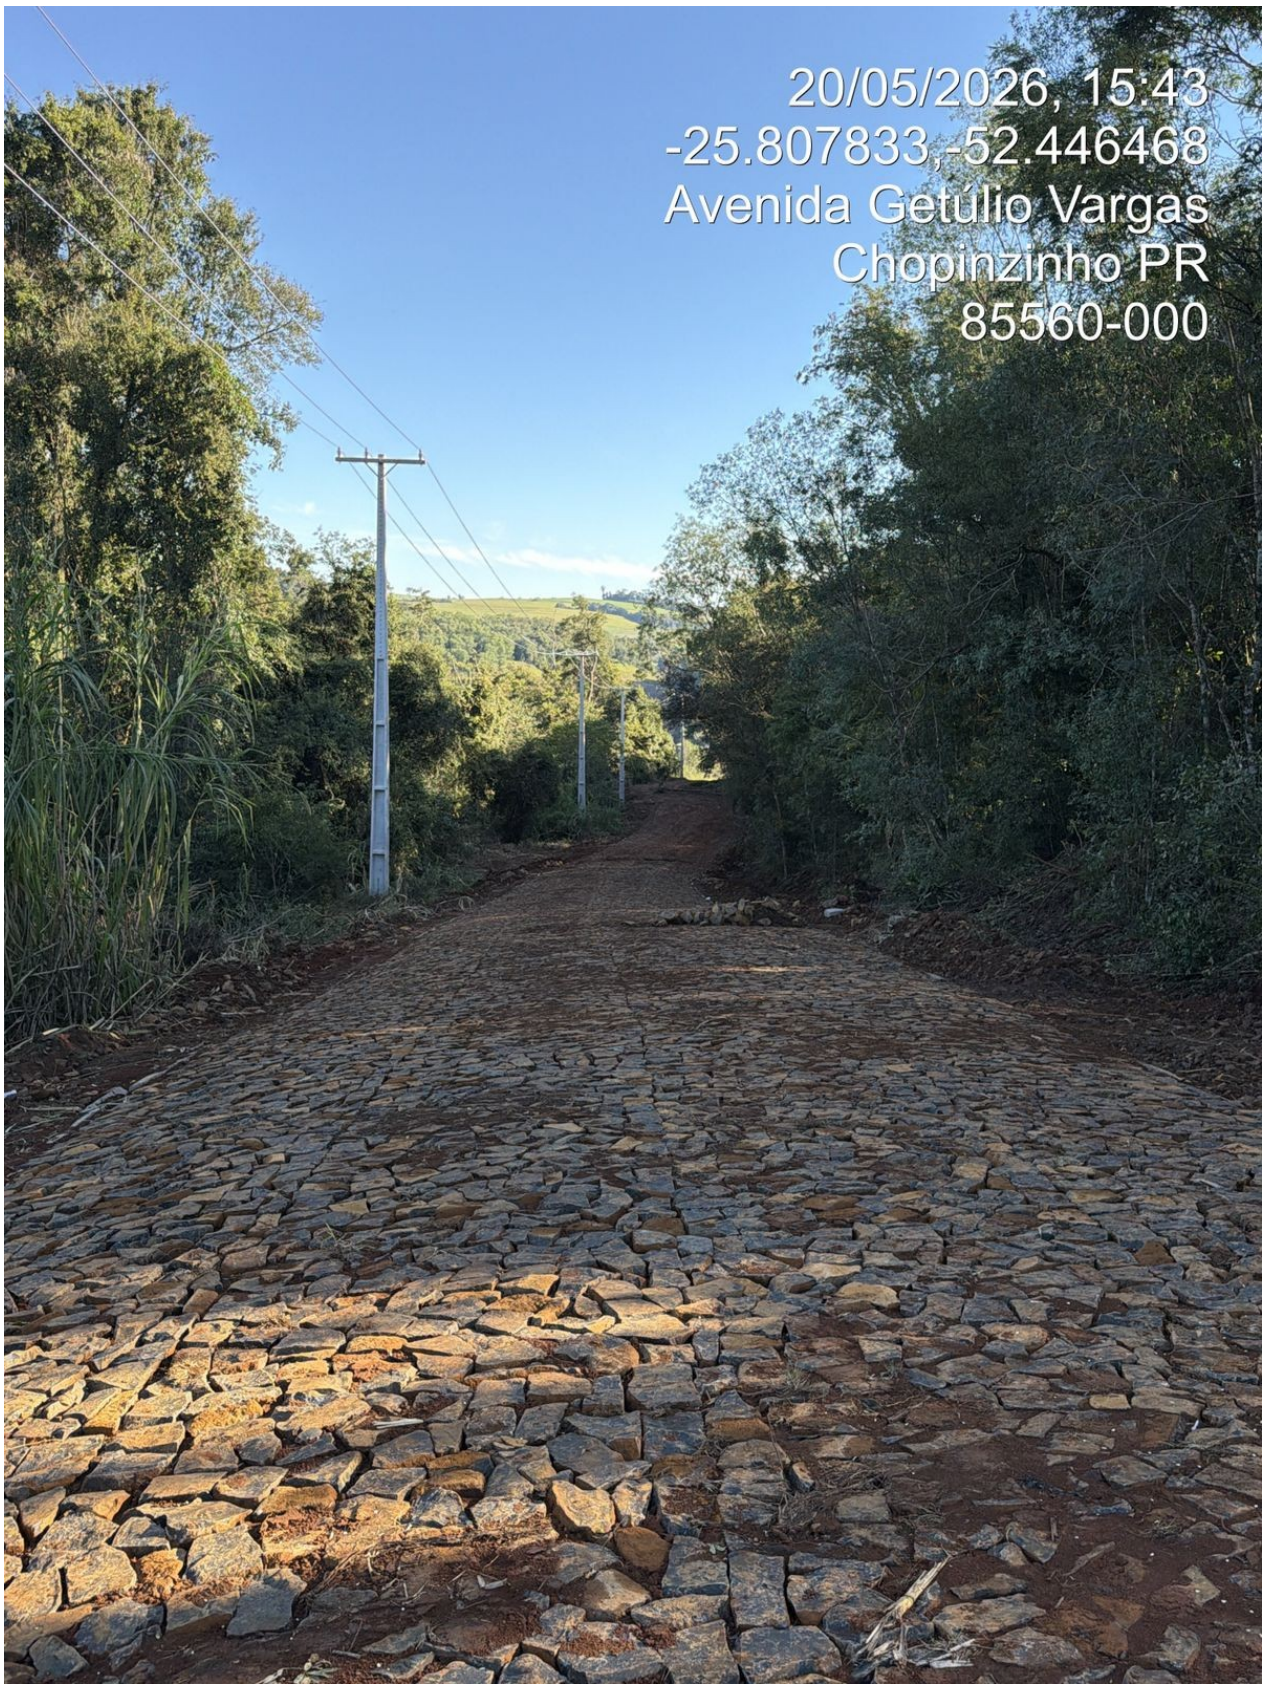

ca18a9eb-4afc-47c9-95bb-faddc00c17dd

