Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:36:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2020	LAR DOS IDOSOS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 252/2020	240	01/10/2020	R$ 599.000,00	100,00%

Nº17/2020
Data Inicial: 01/10/2020

LAR DOS IDOSOS



R$ 599.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
39282

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4139	2020	01/10/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1028	2703	01/10/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/11/2022	252/2020	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*9*.2**-39	RRT (CAU)	94**8*6	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*5**30**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.*8*.3**-60	ART (CREA)	17**2*1**39**	Orçamento	Sim
CPF	71*.*3*.3**-20	ART (CREA)	17**2*3**46**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000806	R$ 781.398,40	20/02/2020	
Contrato	252	2020	76.995.414/0001-60	9000807	R$ 599.000,00	12/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000813	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	0,80%

9000837	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	8,19%
9000859	Medição	3	Jurisdicionado	17/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	10,87%
9000859	Medição	4	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	10,87%
9000859	Medição	5	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	10,87%
9000897	Medição	6	Jurisdicionado	11/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	27,29%
9000907	Medição	7	Jurisdicionado	28/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	38,39%
9000907	Medição	8	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	38,39%
9000907	Medição	9	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	38,39%
9000939	Paralisação	10	Jurisdicionado	05/07/2021			
9000963	Medição	11	Jurisdicionado	10/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	49,92%
9000963	Medição	12	Jurisdicionado	15/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	49,92%
9000963	Medição	13	Jurisdicionado	15/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	49,92%
9000981	Medição	14	Jurisdicionado	15/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	55,73%
9000990	Medição	15	Jurisdicionado	14/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	68,81%
9000990	Medição	16	Jurisdicionado	10/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	68,81%
9001007	Medição	17	Jurisdicionado	31/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	77,98%
9001017	Medição	18	Jurisdicionado	28/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	79,63%
9001026	Paralisação	19	Jurisdicionado	16/05/2022			
9001045	Medição	20	Jurisdicionado	19/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	88,20%
9001045	Medição	21	Jurisdicionado	22/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	88,20%
9001070	Medição	22	Jurisdicionado	08/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	100,00%
9001070	Medição	23	Jurisdicionado	28/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 252/2020	100,00%
9001097	Conclusão	24	Jurisdicionado	09/11/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900046263677	900046263677001	1	20/09/2022	19/03/2023	

Nº17/2020
Data Inicial: 01/10/2020

LAR DOS IDOSOS

Documentos



R$ 599.000,00


30 de setembro de 2020
S 25° 51' 51"; W 52° 31' 36"


30 de setembro de 2020
S 25° 51' 51", W 52° 31' 36"


30 de setembro de 2020
S 25° 51' 51", W 52° 31' 36"


30 de setembro de 2020
S 25° 51' 51" W 52° 31' 35"


CONSTRUÇÃO DO LAR
DOS IDOSOS ETAPA 1
Valor Total da Obra: R$ 599.000,00
Localidade: Bairro São Cesaro
Município: Chopinzinho -Paraná
Objeto: Construção do Lar dos Idosos - Etapa 1, com Área de 481,0 m²
Contratada: Conrato Engenharia e Construções EIRELI
Início da Obra: 13/08/2020
Término da Obra: 13/05/2021
Processo licitatório: 119/220 - TP 09/2020
Denúncias, reclamações, e elogios: ouvidoria.gov.br
RECURSO FINISA
CONTRATO
Nº 0533314-78
2020/10/05


3 de novembro de 2020
S 25° 51' 51" W 52° 31' 36"


3 de novembro de 2020
S 25° 51' 51" W 52° 31' 35"


3 de novembro de 2020
S 25° 51' 52", W 52° 31' 35"


3 de novembro de 2020
S 25° 51' 51", W 52° 31' 35"


30 de setembro de 2020
S 25° 51' 51", W 52° 31' 35"


2020/12/17


2020/12/17


2020/12/17


2020/12/17


2020/12/17


CONSTRUÇÃO DO LAR
DOS IDOSOS ETAPA 1
2021/03/11


2021/03/11


2021/03/11


2021/03/11


2021/03/11


2021/04/27


2021/04/27


12/04/2021


2021/04/27


2021/04/27


09/09/2021


09/09/2021


09/09/2021


09/09/2021


09/09/2021


09/09/2021


15/12/2021


15/12/2021


15/12/2021


15/12/2021


15/12/2021


15/12/2021


CONSTRUÇÃO DO LAR
DOS IDOSOS ETAPA 1
14/01/2022


14/01/2022


14/01/2022


14/01/2022

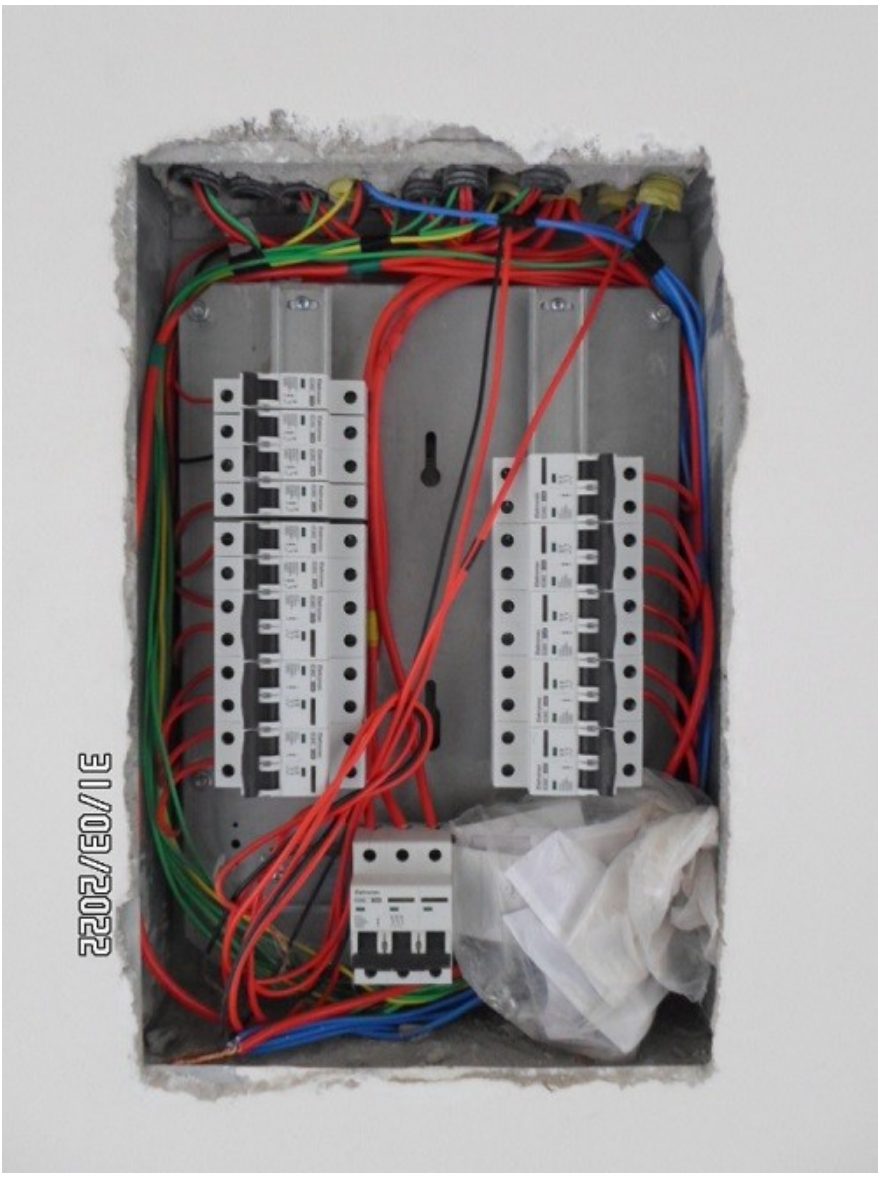

14/01/2022


14/01/2022


FIORI
31/03/2022


31/03/2022


31/03/2022


31/03/2022


31/03/2022


31/03/2022


28/04/2022


28/04/2022


28/04/2022


28/04/2022

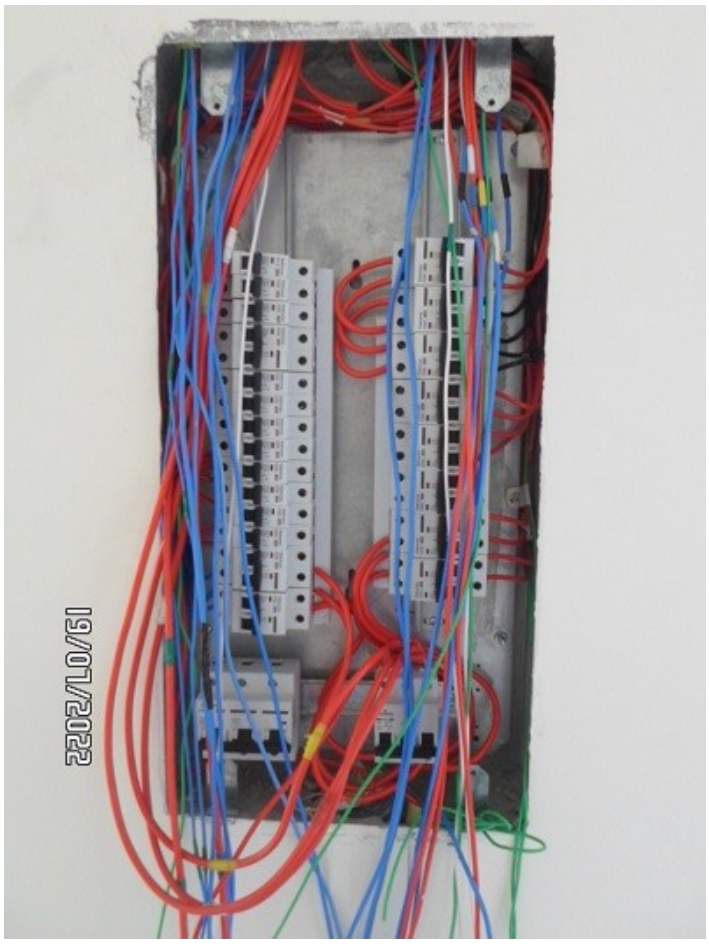

28/04/2022


28/04/2022


19/07/2022


19/07/2022


19/01/2022


19/01/2022


19/07/2022


19/07/2022


08/09/2022


08/09/2022


08/09/2022


08/09/2022


08/09/2022


08/09/2022
