Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:07

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COMUNIDADE BUGRE ALTO<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 204/2025 | 480 | 01/01/2026 | R$ 3.000.000,00 | 56,11% |

Nº2/2026
Data Inicial: 01/01/2026

# CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COMUNIDADE BUGRE ALTO



R$ 3.000.000,00

## Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 45315 |

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 6344 | 2025 | 26/11/2025 | 12249 |
| 6345 | 2025 | 26/11/2025 | 12249 |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1018 | 4061 | 01/01/2026 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 01/12/2027 | 204/2025 | Contrato |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 04*.*0*.0**-07 | ART (CREA) | 17**2*6**22** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 04*.*9*.2**-39 | RRT (CAU) | 14**3*3* | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 04*.*9*.2**-39 | RRT (CAU) | 14**3*3* | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*0*.4**-97 | ART (CREA) | 17**2*7**00** | Execução de Obra | Sim |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9001401 | R$ 3.816.934,19 | 12/02/2025 | |
| Contrato | 204 | 2025 | 76.995.414/0001-60 | 9001402 | R$ 3.000.000,00 | 05/08/2026 | 56,11% |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001403 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 15/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 3,38% |
| 9001415 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 04/02/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 15,30% |
| 9001415 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 04/03/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 15,30% |
| 9001438 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 14/04/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 25,64% |
| 9001452 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 21/05/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 50,68% |
| 9001452 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 21/06/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 50,68% |
| 9001452 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 21/07/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 50,68% |
| 9001525 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 03/08/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 56,11% |
| 9001525 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 03/09/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 204/2025 | 56,11% |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900268241971 | | | | | |

Nº2/2026
Data Inicial: 01/01/2026

# CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COMUNIDADE BUGRE ALTO

## Documentos



R$ 3.000.000,00

# PLACA3


Aqui tem trabalho do Governo Federal
DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELEOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR
Construção do Centro Cultural da Comunidade de Bugre Alto
Agentes Participantes: Ministério do Turismo e Município de Chopinzinho - PR
Início da obra: 18/08/2025 Término da obra: 11/12/2026
Valor Total da Obra: R$3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)
Comunidade: Bugre Alto
Município de Chopinzinho - PR - Contrato de Repasse nº953371/2023/MTUR/CAIXA
Objeto: Construção do Centro Cultural da Comunidade Bugre Alto
Empresa: Marjon Artefatos de Concreto LTDA
Responsável Técnico: Jonatan Luiz Guerra - CREA:PR-148.977/D
BRASIL
CAIXA
MINISTÉRIO DAS CIDADES
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

# WhatsApp Image 2026-01-09 at 10.16.05



# WhatsApp Image 2026-01-09 at 10.16.33



# WhatsApp Image 2026-01-09 at 10.16.48



# WhatsApp Image 2026-01-09 at 10.17.00



# WhatsApp Image 2026-01-09 at 10.41.20 (1)



# WhatsApp Image 2026-01-09 at 10.41.22 (1)



1a770f88-c477-4c62-b920-1cd591f755ca




27/01/2026, 11:00
-25.825580,-52.391355
Chopinzinho PR
85560-000


27/01/2026, 11:02
-25.825951,-52.391113
Chopinzinho PR
85560-000


27/01/2026, 11:06
-25.825844,-52.390889
Chopinzinho PR
85560-000

601a1f26-e1b3-420d-94a1-a3041d94c22f




27/01/2026, 11:07
-25.825448,-52.391046
Chopinzinho PR
85560-000
Aqui tem trabalho do Governo Federal
Construção do Centro Cultural da Comunidade de Bugre Alto
BRASIL
CAIXA
MINISTÉRIO DAS CIDADES
GOVERNO FEDERAL
BRASIL


234c753c-b969-46b1-9ccc-5b8190c31632



2c61ff1a-166e-4632-afb5-a49908029a5f



2d9eea1a-41e5-417c-b4df-4f60653c8e25

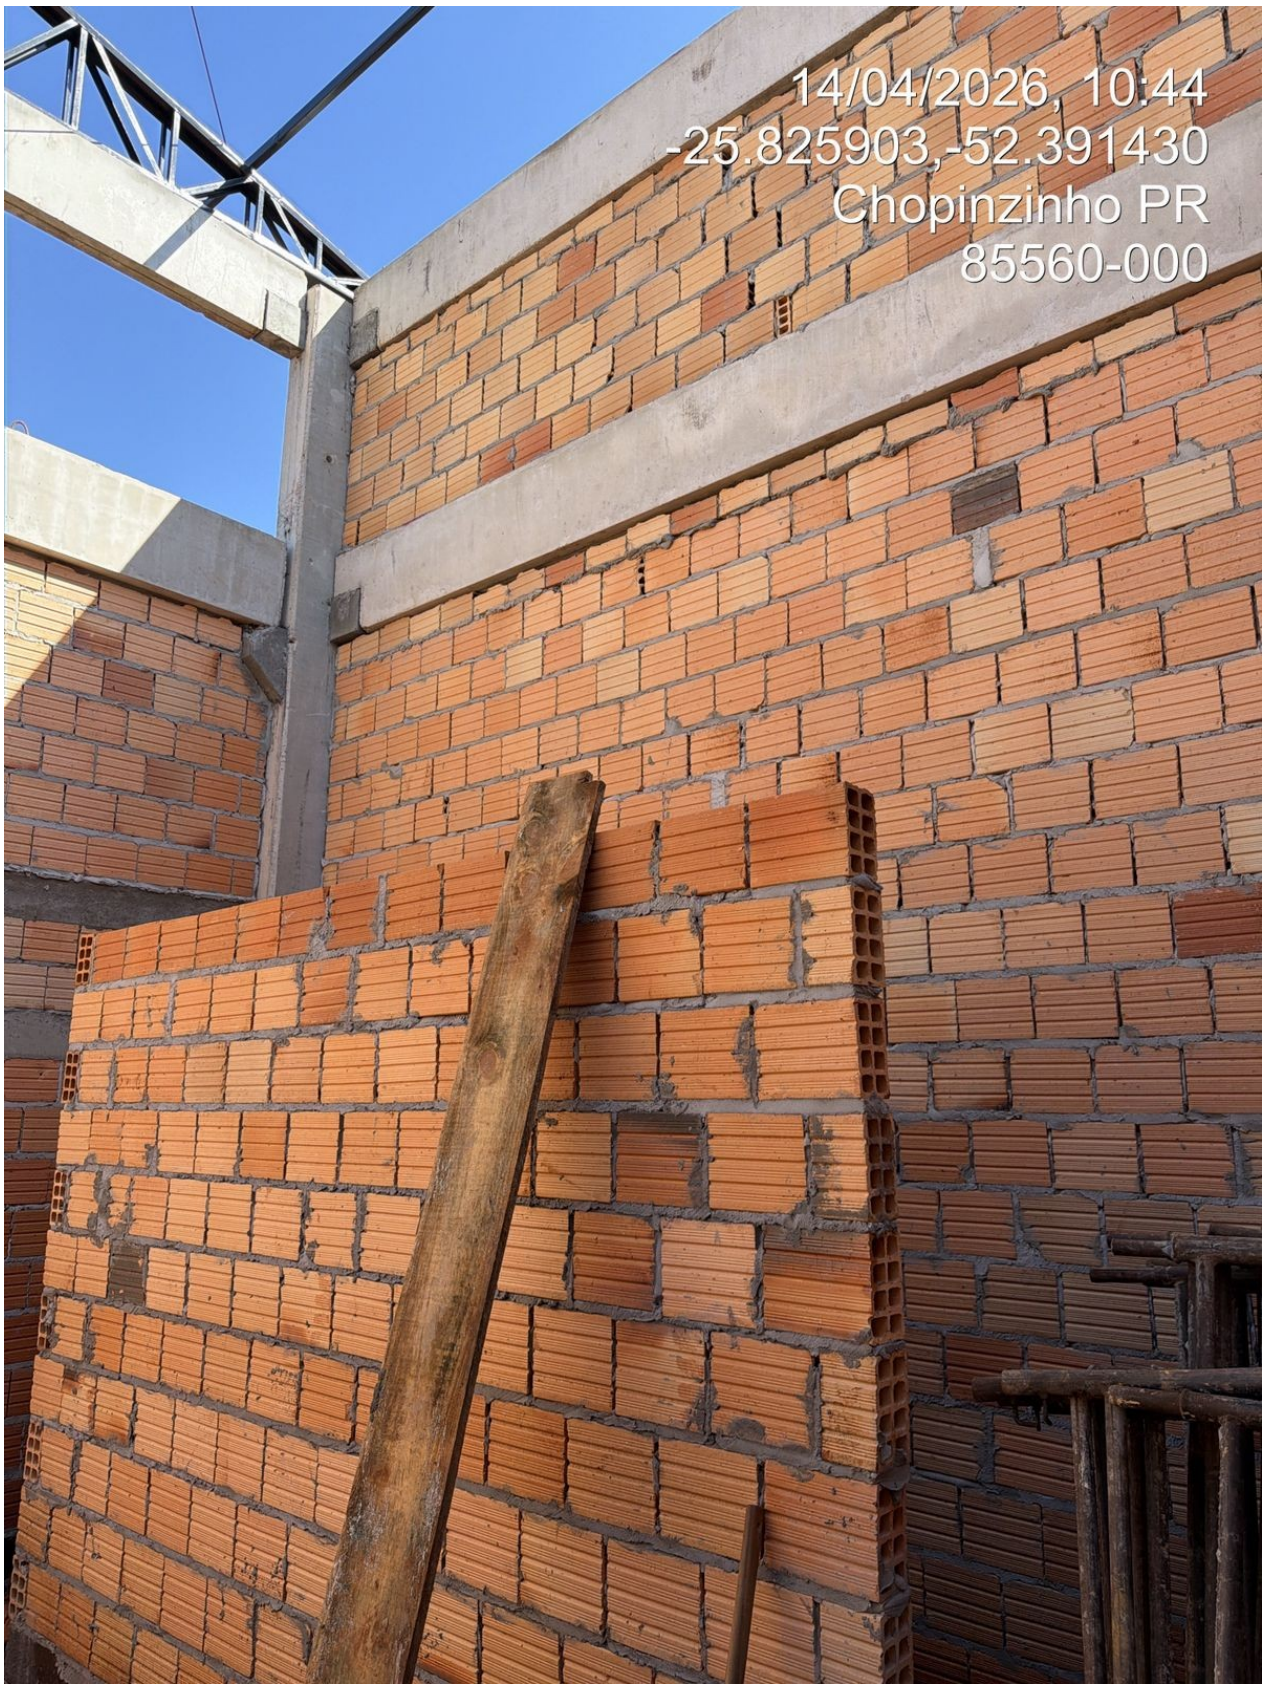

4a4abb52-0091-4a91-be96-d16b086c4455



514e492d-9ef0-47ae-bd6e-ba1afaa81c77



61acb76b-db44-4283-9041-238340dcb831



6931b806-4320-428f-81af-a0c11b0521b5



a156e40f-051c-48de-b1c7-01b9f84b38d1



a821d2b9-2ce4-4479-b98c-97afea564bc4



a8f2d188-01a9-4b91-b637-2d1e47a05650




bf790aed-118c-4f7a-ab68-6bd0eb01e743



c2ce3882-4e9e-46bf-b881-bb50e873f01c



c81f91d8-ac24-40b7-a2b3-591b6f482281

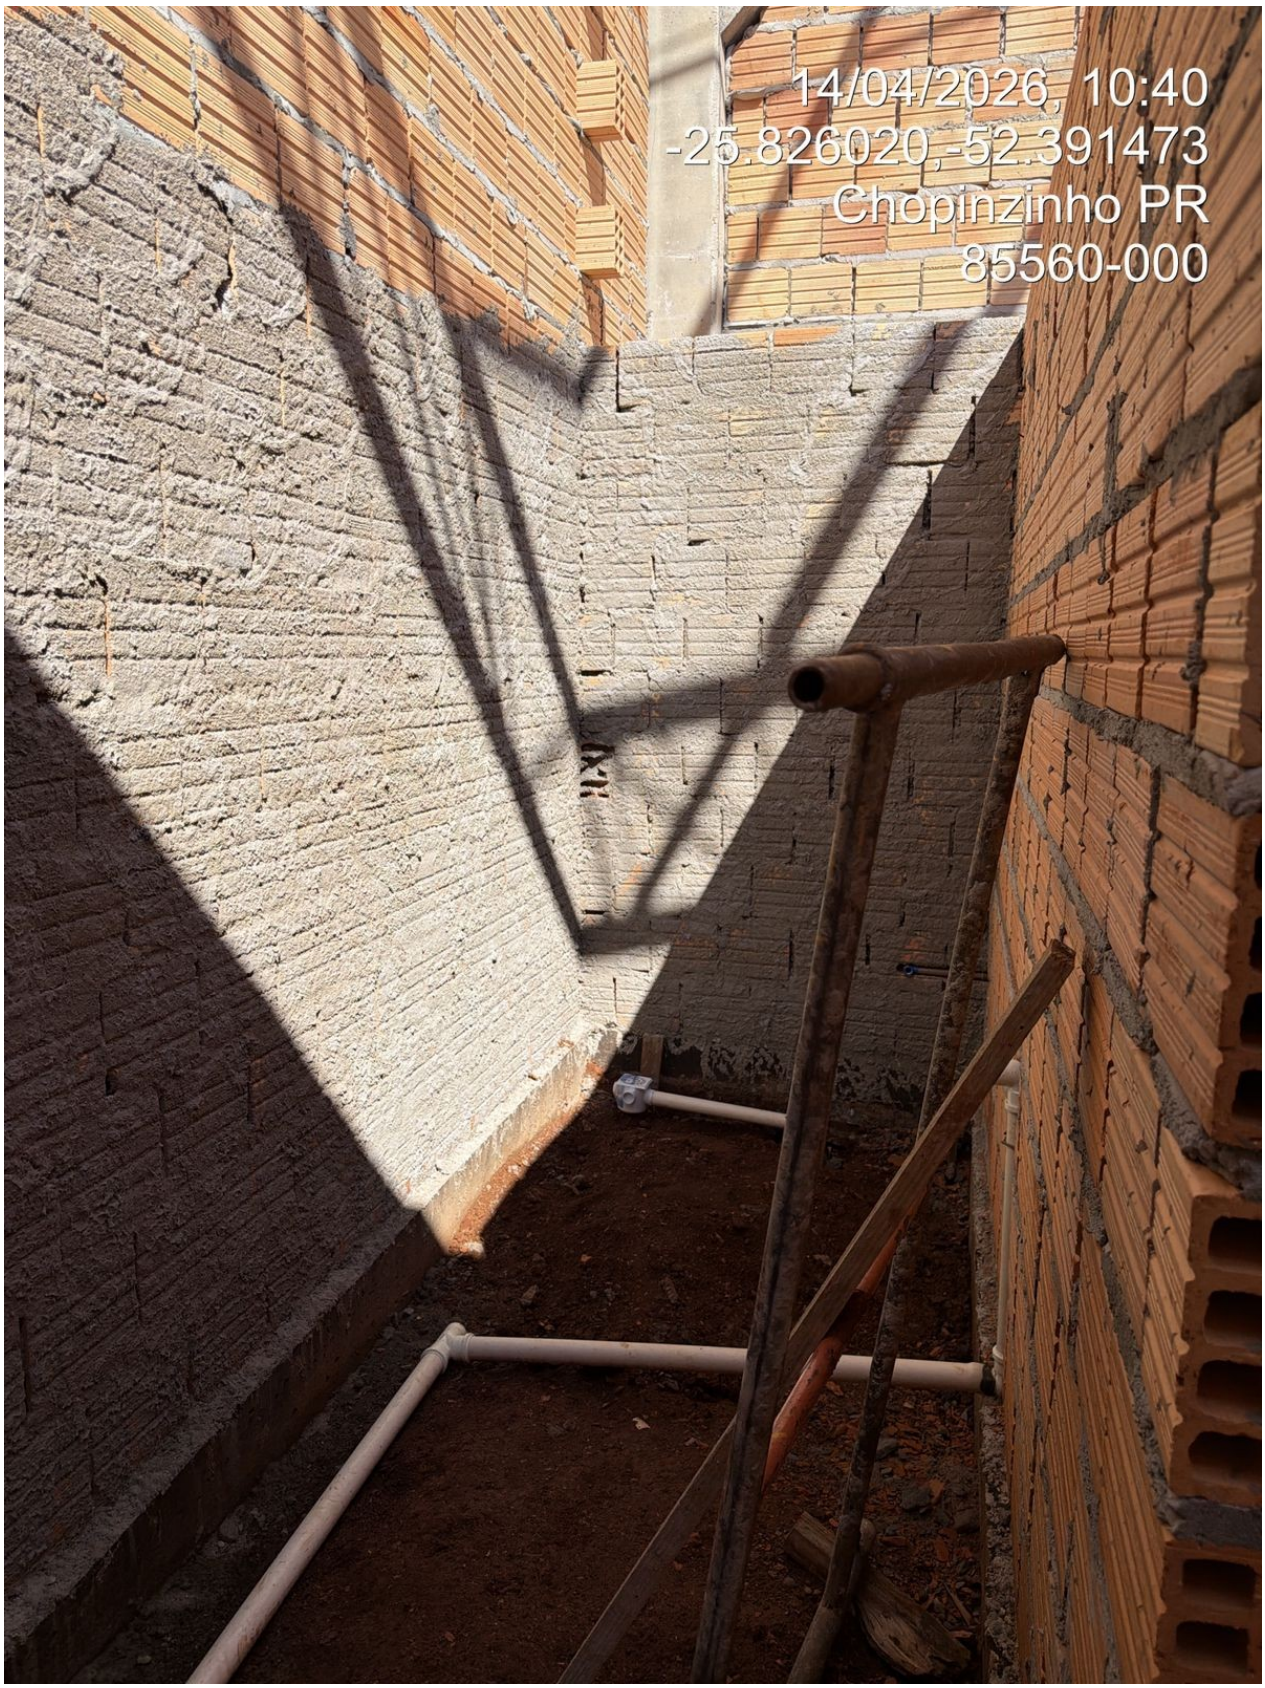

ce9f94ea-a0f6-4237-97aa-aaba4303d9d1



# DJI_0003



# DJI_0007



# WhatsApp Image 2026-05-07 at 10.10.04



# WhatsApp Image 2026-05-07 at 10.15.18



# WhatsApp Image 2026-05-07 at 10.19.09




WhatsApp Image 2026-07-28 at 16.04.10 (12)



# WhatsApp Image 2026-07-28 at 16.04.10 (15)



# WhatsApp Image 2026-07-28 at 16.04.10 (17)

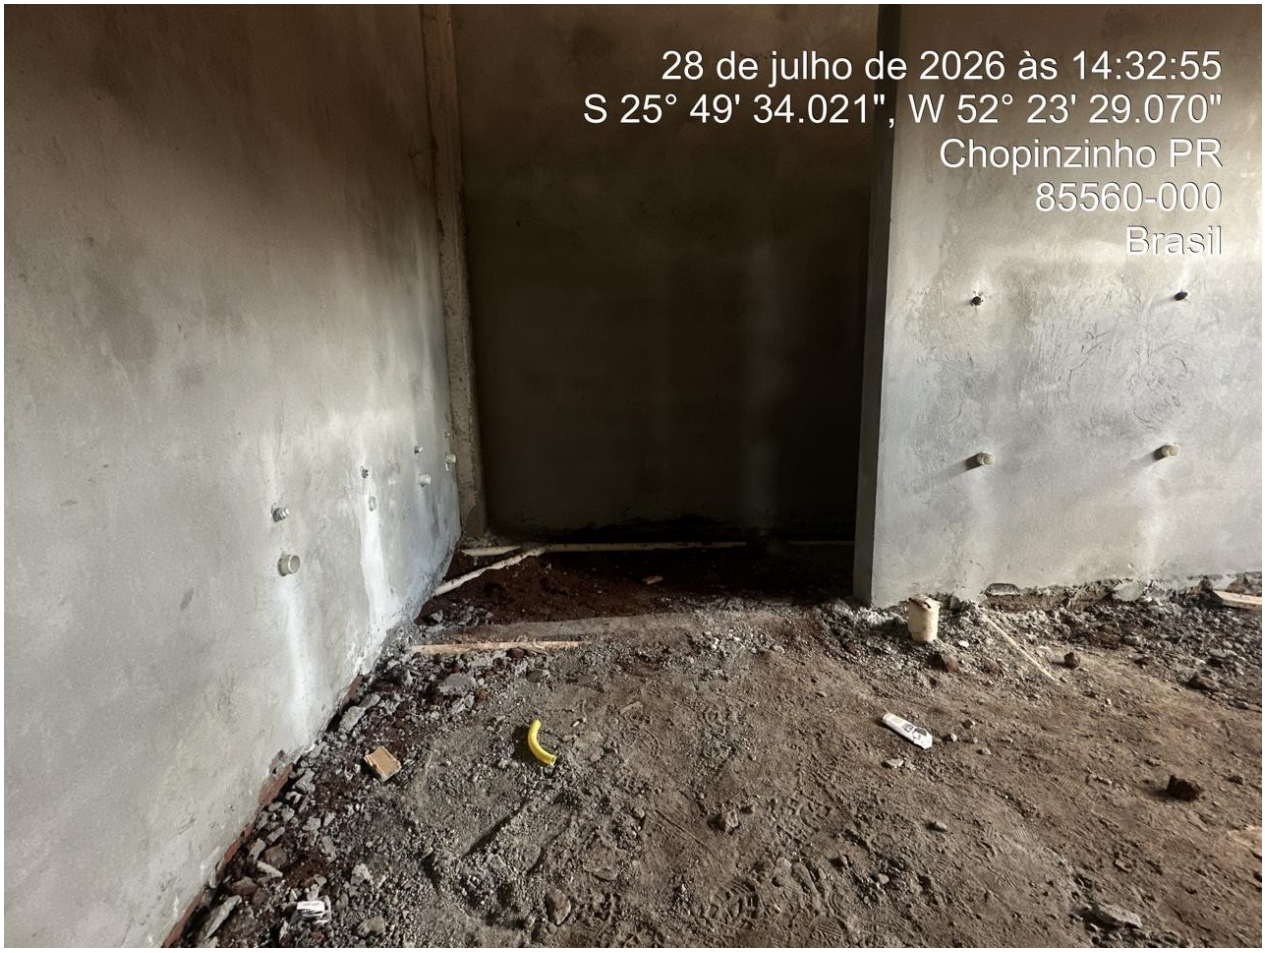

# WhatsApp Image 2026-07-28 at 16.04.10 (3)



# WhatsApp Image 2026-07-28 at 16.04.10 (8)

