Prefeitura Municipal
de Sulina

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 20/10/2026 - 21:21:02

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2026	Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa Moradia Digna **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 4/2026	365	25/02/2026	R$ 2.707.929,11	29,88%

Nº4/2026
Data Inicial: 25/02/2026

Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa Moradia Digna



R$ 2.707.929,11

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10003673

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3241	2026	07/05/2026	12543
3242	2026	07/05/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/05/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/06/2027	04	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**77**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.*1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**77**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*0*.4**-84	RRT (CAU)	16**9*4*	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*1**29**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5893	R$ 2.735.225,63	22/05/2025	
Contrato	4	2026	80.869.886/0001-43	5894	R$ 2.707.929,11	13/01/2026	29,88%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

5895	Medição	1	Jurisdicionado	25/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2026	5,73%
5922	Medição	2	Jurisdicionado	03/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2026	11,17%
5935	Medição	3	Jurisdicionado	03/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2026	21,84%
5943	Medição	4	Jurisdicionado	03/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2026	29,88%

Nº4/2026
Data Inicial: 25/02/2026

Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa Moradia Digna

Documentos



R$ 2.707.929,11






Aqui tem trabalho do Governo Federal
NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR
Construção de Unidades Habitacionais do ''. Programa moradia digna'' em alvenaria convencional
AGENTES PARTICIPANTES: MINISTÉRIO DAS CIDADES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA DE SULINA - PR
INÍCIO DA OBRA: 06/04/2026 | TÉRMINO: 06/04/2027
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 2.707.929,11
COMUNIDADE: MUNICÍPIO DE SULINA
MUNÍCIPIO: SULINA - PR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO CENTRO - RUA PROJETADA 1 E RUA PROJETADA 3 NA CIDADE DE SULINA - PR.
BRASIL
CAIXA
MINISTÉRIO DAS CIDADES
GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,474"S 52°43'29,892"W
14 de maio de 2026 10:25





Medição da obra

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1104105-49	983416	MUNICIPIO DE SULINA	Programa Moradia Digna	GODOIS CONSTRUTORA LTDA	04/2026

Medição: 1 **Período:** 06/04/2026 a 30/04/2026 **% Realizado Período.:** 5,73% **% Realizado Acum.:** 5,73%

← Filtro	Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1																	
F	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1																							
F	3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1																	
F	4	PILARES, VIGAS E LAJES																									
F	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS																									
F	6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
F	7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
F	8	TELHADOS																									
F	9	REVESTIMENTOS INTERNOS																									
F	10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
F	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																									
F	12	FORROS																									
F	13	PINTURA																									
F	14	CERAMICA																									
F	15	CIMENTADOS																									
F	16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
F	17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
F	18	HIDRÁULICA																									
F	19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
F	20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
F	21	LIMPEZA																									

		Data das Medições											
		30/04/2026											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	155.074,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
	R$	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41	155.074,41

SULINA
Local

quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

GODOIS CONSTRUTORA LTDA:21697836000167
Assinado de forma digital por GODOIS CONSTRUTORA LTDA:21697836000167
Dados: 2026.05.25 10:50:49 -03'00'

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 10:19:45 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR - 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

Medição da obra

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICIPIO DE SULINA	1104105-49	983416				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Programa Moradia Digna	SULINA		2.707.929,11	0,00	2.707.929,11	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Adiantada	abr-26	0,00%		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	0	0	un	09/2025		2.707.929,11	-	155.074,41	155.074,41	5,73%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(5,73%)	(5,73%)	
					Repasse		2.707.929,11	-	155.074,41	155.074,41	
					Contrapartida		-	-	-	-	**5,73%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**2.707.929,11**	**-**	**155.074,41**	**155.074,41**	

SULINA
Local

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901

Representante Tomador
Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEMARI DA MOTTA FINGER
Data: 22/05/2026 13:40:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Social
Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER
Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 10:31:55 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

Responsável Financeiro
Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT
Cargo: TESOUREIRA

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT
Data: 25/05/2026 08:12:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

SULINA - PARANÁ
vale a pena crescer e viver aqui

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PLACA DE OBRA

Termo de Compromisso nº 983416/2025 - Operação 1104105-49 - Programa Moradia Digna - Provisão de unidades habitacionais



Sulina, 30 de abril de 2026.

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 10:31:22 -03'00'

Luciano S. Santiago
Eng. Civil fiscal da obra


Aqui tem trabalho do Governo Federal
NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR
Construção de Unidades Habitacionais do ''. Programa moradia digna'' em alvenaria convencional
AGENTES PARTICIPANTES: MINISTÉRIO DAS CIDADES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA DE SULINA - PR
INÍCIO DA OBRA: 06/04/2026 | TÉRMINO: 06/04/2027
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 2.707.929,11
COMUNIDADE: MUNICÍPIO DE SULINA
MUNÍCIPIO: SULINA - PR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO CENTRO - RUA PROJETADA 1 E RUA PROJETADA 3 NA CIDADE DE SULINA - PR.
BRASIL
CAIXA
MINISTÉRIO DAS CIDADES
GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO
















VOTORAN















Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício n°: 06/2026

SULINA, 30 de junho de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1104105-49 - TransfereGOV nº 983416

Objeto: Construção de Unidade Habitacionais
Proponente / Tomador: MUNICIPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 2.707.929,11**	**R$ 289.057,39**	**R$ 591.470,41**
Contrapartida Financeira:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Outros:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Investimento:	**R$ 2.707.929,11**	**R$ 289.057,39**	**R$ 591.470,41**
Execução Física:	**-**	**10,67%**	**21,84%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.02 10:06:46 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICIPIO DE SULINA	1104105-49	983416				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Programa Moradia Digna	SULINA		2.707.929,11	0,00	2.707.929,11	**3**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Adiantada	**jun-26**	**0,00%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	0	0	un	09/2025	3	2.707.929,11	302.413,02	289.057,39	591.470,41	21,84%
					(%)		(100,00%)	(11,17%)	(10,67%)	(21,84%)	
					Repasse		2.707.929,11	302.413,02	289.057,39	591.470,41	
					Contrapartida		-	-	-	-	**21,84%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**2.707.929,11**	**302.413,02**	**289.057,39**	**591.470,41**	

SULINA

Local GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.02 10:06:18 -03'00'

Representante Tomador
Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 30 de junho de 2026

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.02 10:06:09 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

Responsável Social
Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER
Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Responsável Financeiro
Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT
Cargo: TESOUREIRA

Medi 20 casas

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1104105-49	983416	MUNICIPIO DE SULINA	Programa Moradia Digna	GODOIS CONSTRUTORA LTDA	04/2026

Medição: 3 **Período:** #VALOR! **% Realizado Período.:** 10,67% **% Realizado Acum.:** 21,84%

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇAO em que os eventos foram concluídos																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	2	3	3																				
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3											
4	PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3											
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3											
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
8	TELHADOS																									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS																									
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																									
12	FORROS																									
13	PINTURA																									
14	CERAMICA																									
15	CIMENTADOS																									
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
18	HIDRÁULICA																									
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
21	LIMPEZA																									

		Data das Medições											
		30/04/2026	29/05/206	30/06/2026									
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	5,73%	5,44%	**10,67%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	155.074,41	147.338,61	**289.057,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	5,73%	11,17%	**21,84%**	21,84%	21,84%	21,84%	21,84%	21,84%	21,84%	21,84%	21,84%	21,84%
	R$	155.074,41	302.413,02	**591.470,41**	591.470,41	591.470,41	591.470,41	591.470,41	591.470,41	591.470,41	591.470,41	591.470,41	591.470,41

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.03 07:35:01 -03'00'

SULINA
Local

terça-feira, 30 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR - 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
SULINA - PARANÁ
Vale a pena crescer e viver aqui

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	GODOIS CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº	04/2026
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA DIGNA EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM 47,46 M² DE ÁREA CONSTRUIDA CADA, CONTENDO DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO E VARANDA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITARIAS, HIDRAULICAS, TUDO CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS
MEDIÇÃO Nº	03
DATA DA VISTORIA	30/06/2026
DATA DA MEDIÇÃO	30/06/2026
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720261982927

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









Medi 20 casas


Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

SULINA - PARANÁ
Vale a pena crescer e viver aqui





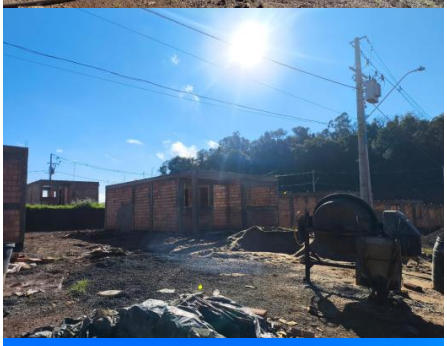




LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.15 11:23:23 -03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro fiscal da obra

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1104105-49	983416	MUNICIPIO DE SULINA	Programa Moradia Digna	GODOIS CONSTRUTORA LTDA	04/2026

Medição: 4 **Período:** 01/07/2026 a 31/07/2026 **% Realizado Período.:** 8,04% **% Realizado Acum.:** 29,88%

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇAO em que os eventos foram concluídos																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	2	3	3	4	4																		
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4				
4	PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4							
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4		4	4							
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
8	TELHADOS																									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS																									
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																									
12	FORROS																									
13	PINTURA																									
14	CERAMICA																									
15	CIMENTADOS																									
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
18	HIDRÁULICA																									
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
21	LIMPEZA																									

		Data das Medições											
		30/04/2026	29/05/206	30/06/2026	31/07/2026								
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	5,73%	5,44%	10,67%	**8,04%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	155.074,41	147.338,61	289.057,39	**217.744,06**	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	5,73%	11,17%	21,84%	**29,88%**	29,88%	29,88%	29,88%	29,88%	29,88%	29,88%	29,88%	29,88%
	R$	155.074,41	302.413,02	591.470,41	**809.214,47**	809.214,47	809.214,47	809.214,47	809.214,47	809.214,47	809.214,47	809.214,47	809.214,47

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global **ração**

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2026.07.31 10:25:55 -03'00'

SULINA
Local

sexta-feira, 31 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR - 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

DAISE MARTINAZZO:07 Assinado de forma digital por DAISE MARTINAZZO:07280240984

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICIPIO DE SULINA	1104105-49	983416				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Programa Moradia Digna	SULINA		2.707.929,11	0,00	2.707.929,11	**4**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Adiantada	**jul-26**	**0,00%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	0	0	un	09/2025	4	2.707.929,11	591.470,41	217.744,06	809.214,47	29,88%
					(%)		(100,00%)	(21,84%)	(8,04%)	(29,88%)	
					Repasse		2.707.929,11	591.470,41	217.744,06	809.214,47	
					Contrapartida		-	-	-	-	**29,88%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**2.707.929,11**	**591.470,41**	**217.744,06**	**809.214,47**	

SULINA
Local

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Dados: 2026.07.31 10:25:20 -03'00'

Representante Tomador
Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 31 de julho de 2026
Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2026.07.31 10:25:35 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

Responsável Social
Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER
Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Responsável Financeiro
Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT
Cargo: TESOUREIRA


Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br


SULINA - PARANÁ
Vale a pena crescer e viver aqui

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	GODOIS CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº	04/2026
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA DIGNA EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM 47,46 M² DE ÁREA CONSTRUIDA CADA, CONTENDO DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO E VARANDA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITARIAS, HIDRAULICAS, TUDO CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS
MEDIÇÃO Nº	04
DATA DA VISTORIA	31/07/2026
DATA DA MEDIÇÃO	31/07/2026
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720261982927

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

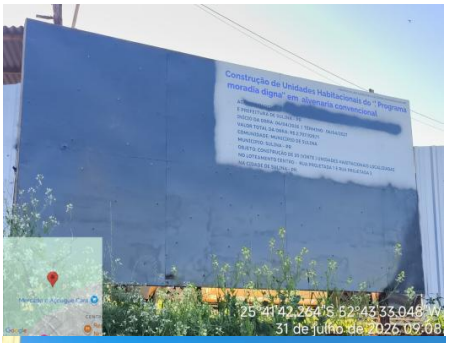



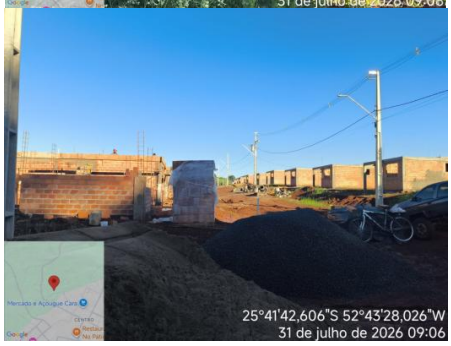




Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

SULINA - PARANÁ
Vale a pena crescer e viver aqui





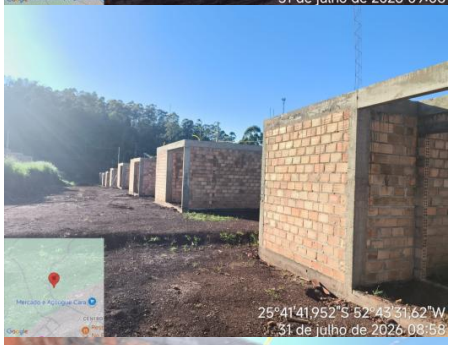











Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

SULINA - PARANÁ
Vale a pena crescer e viver aqui


















Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

SULINA - PARANÁ
Vale a pena crescer e viver aqui





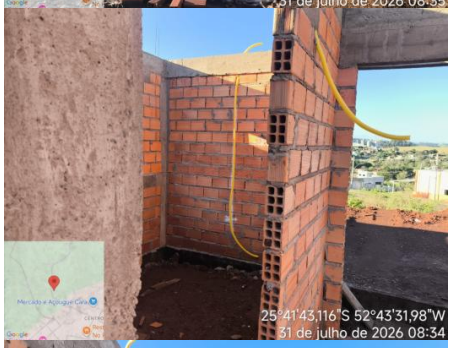







LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.31 10:39:46 -03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro fiscal da obra


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'43,122"S 52°43'31,932"W
31 de julho de 2026 08:34


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'43,104"S 52°43'31,962"W
31 de julho de 2026 08:34


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,924"S 52°43'32,376"W
31 de julho de 2026 08:34


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'43,11"S 52°43'31,986"W
31 de julho de 2026 08:34


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'43,116"S 52°43'31,98"W
31 de julho de 2026 08:34


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'43,116"S 52°43'31,98"W
31 de julho de 2026 08:34


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,792"S 52°43'31,788"W
31 de julho de 2026 08:35


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,654"S 52°43'31,356"W
31 de julho de 2026 08:35


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,666"S 52°43'31,338"W
31 de julho de 2026 08:35


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,624"S 52°43'31,002"W
31 de julho de 2026 08:35


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'43,116"S 52°43'31,98"W
31 de julho de 2026 08:34


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,594"S 52°43'30,516"W
31 de julho de 2026 08:35


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,498"S 52°43'29,898"W
31 de julho de 2026 08:36


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,528"S 52°43'29,724"W
31 de julho de 2026 08:36


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,57"S 52°43'31,224"W
31 de julho de 2026 08:51


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,87"S 52°43'31,188"W
31 de julho de 2026 08:51


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,624"S 52°43'30,918"W
31 de julho de 2026 08:35


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,678"S 52°43'30,942"W
31 de julho de 2026 08:57


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,69"S 52°43'30,852"W
31 de julho de 2026 08:57


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,522"S 52°43'31,704"W
31 de julho de 2026 08:57


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'41,952"S 52°43'31,62"W
31 de julho de 2026 08:58


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'40,578"S 52°43'28,188"W
31 de julho de 2026 09:03


Mercado e Açougue Cara
Google
25°41'42,336"S 52°43'32,586"W
31 de julho de 2026 09:05



Piracanjuba
Bela
Google
Mercado e Açougue Cara
25°41'42,546"S 52°43'28,446"W
31 de julho de 2026 09:06


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,558"S 52°43'28,47"W
31 de julho de 2026 09:06


Mercado e Açougue Cara
CENTRO
Google
25°41'42,606"S 52°43'28,026"W
31 de julho de 2026 09:06


Piracanjuba
Bela
Google
Mercado e Açougue Cara
25°41'42,582"S 52°43'28,41"W
31 de julho de 2026 09:06


Construção da Unidades Habitacionais do " Programa
moradia digna" em alvenaria convencional
Mercado e Açougue Cara
Google
25°41'42,24"S 52°43'33,054"W
31 de julho de 2026 09:08

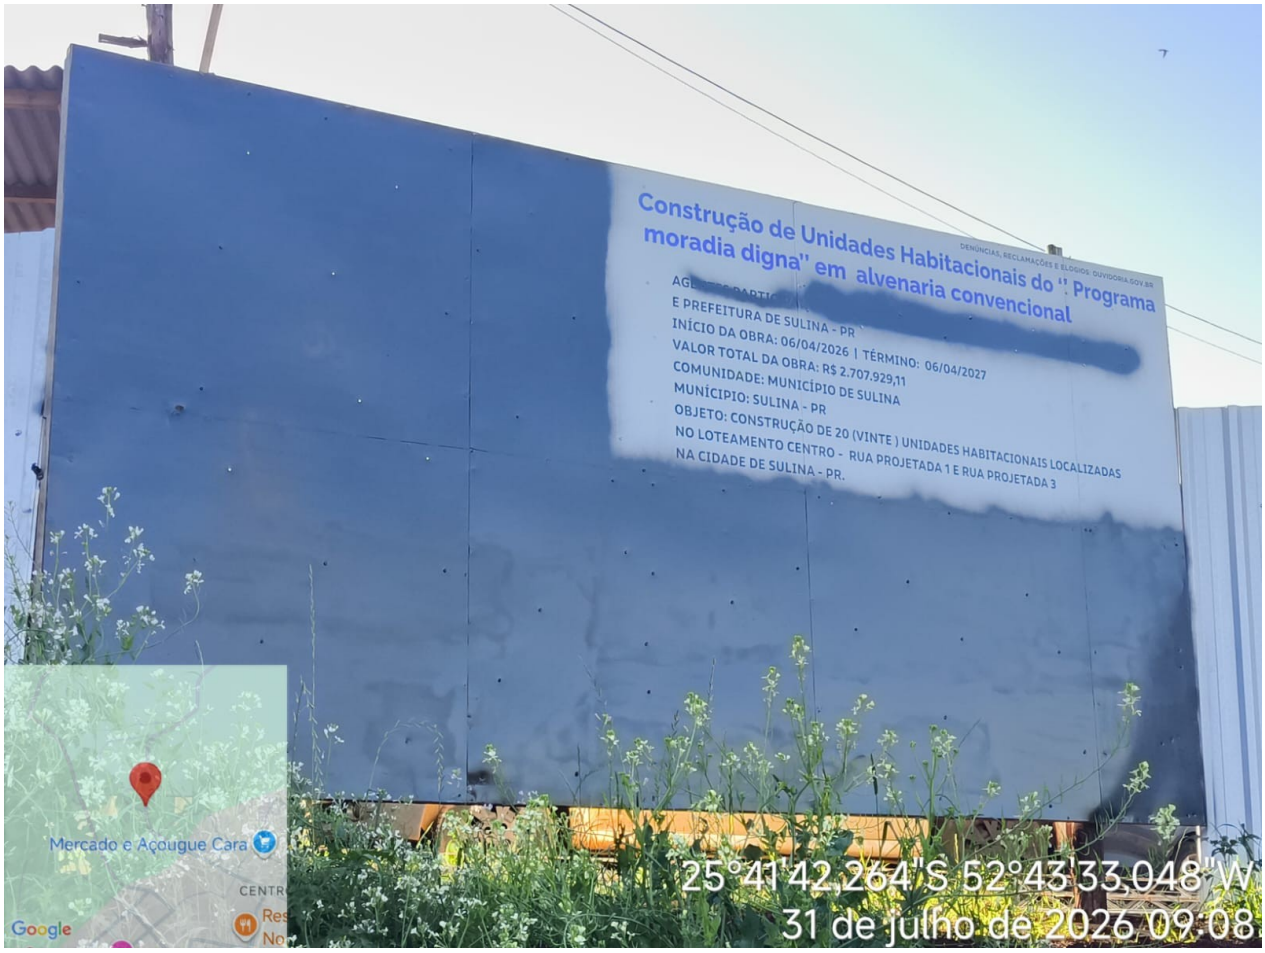
Construção de Unidades Habitacionais do " Programa moradia digna" em alvenaria convencional
E PREFEITURA DE SULINA - PR
INÍCIO DA OBRA: 06/04/2026 | TÉRMINO: 06/04/2027
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 2.707.929,11
COMUNIDADE: MUNICÍPIO DE SULINA
MUNICÍPIO: SULINA - PR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO CENTRO - RUA PROJETADA 1 E RUA PROJETADA 3 NA CIDADE DE SULINA - PR.
Mercado e Açougue Cara
Google
25°41'42,264"S 52°43'33,048"W
31 de julho de 2026 09:08
