Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:07:04

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E QUADRA DE AREIA<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 356/2025 | 90 | 09/04/2026 | R$ 586.436,93 | 100,00% |

Nº8/2026
Data Inicial: 09/04/2026

# REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E QUADRA DE AREIA



R$ 586.436,93

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 27864; 45437 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1432 | 2026 | 09/03/2026 | 12249 |
| 1433 | 2026 | 09/03/2026 | 12249 |
| 5942 | 2026 | 18/09/2026 | 12249 |
| 5943 | 2026 | 18/09/2026 | 12249 |
| 5940 | 2026 | 18/09/2026 | 12249 |
| 6425 | 2026 | 30/09/2026 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1020 | 4724 | 01/05/2026 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 09/01/2027 | 356/2025 | Contrato |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*6**63** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.*8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*6**63** | Orçamento | Sim |
| CPF | 04*.*0*.0**-07 | ART (CREA) | 17**2*0**86** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 10*.*7*.4**-50 | ART (CREA) | 17**2*0**05** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9001441 | R$ 586.436,93 | 21/10/2025 | |
| Contrato | 356 | 2025 | 76.995.414/0001-60 | 9001442 | R$ 557.114,90 | 11/12/2025 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001443 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 15/05/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 356/2025 | 53,32% |
| 9001443 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 15/06/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 356/2025 | 53,32% |
| 9001497 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 16/07/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 356/2025 | 63,87% |
| 9001526 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 19/08/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 356/2025 | 81,67% |
| 9001535 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 23/09/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 356/2025 | 100,00% |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900281746676 | | | | | |

Nº8/2026
Data Inicial: 09/04/2026


# REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E QUADRA DE AREIA

## Documentos




R$ 586.436,93

30fc2703-1cab-4b87-984f-1a973e3601fc

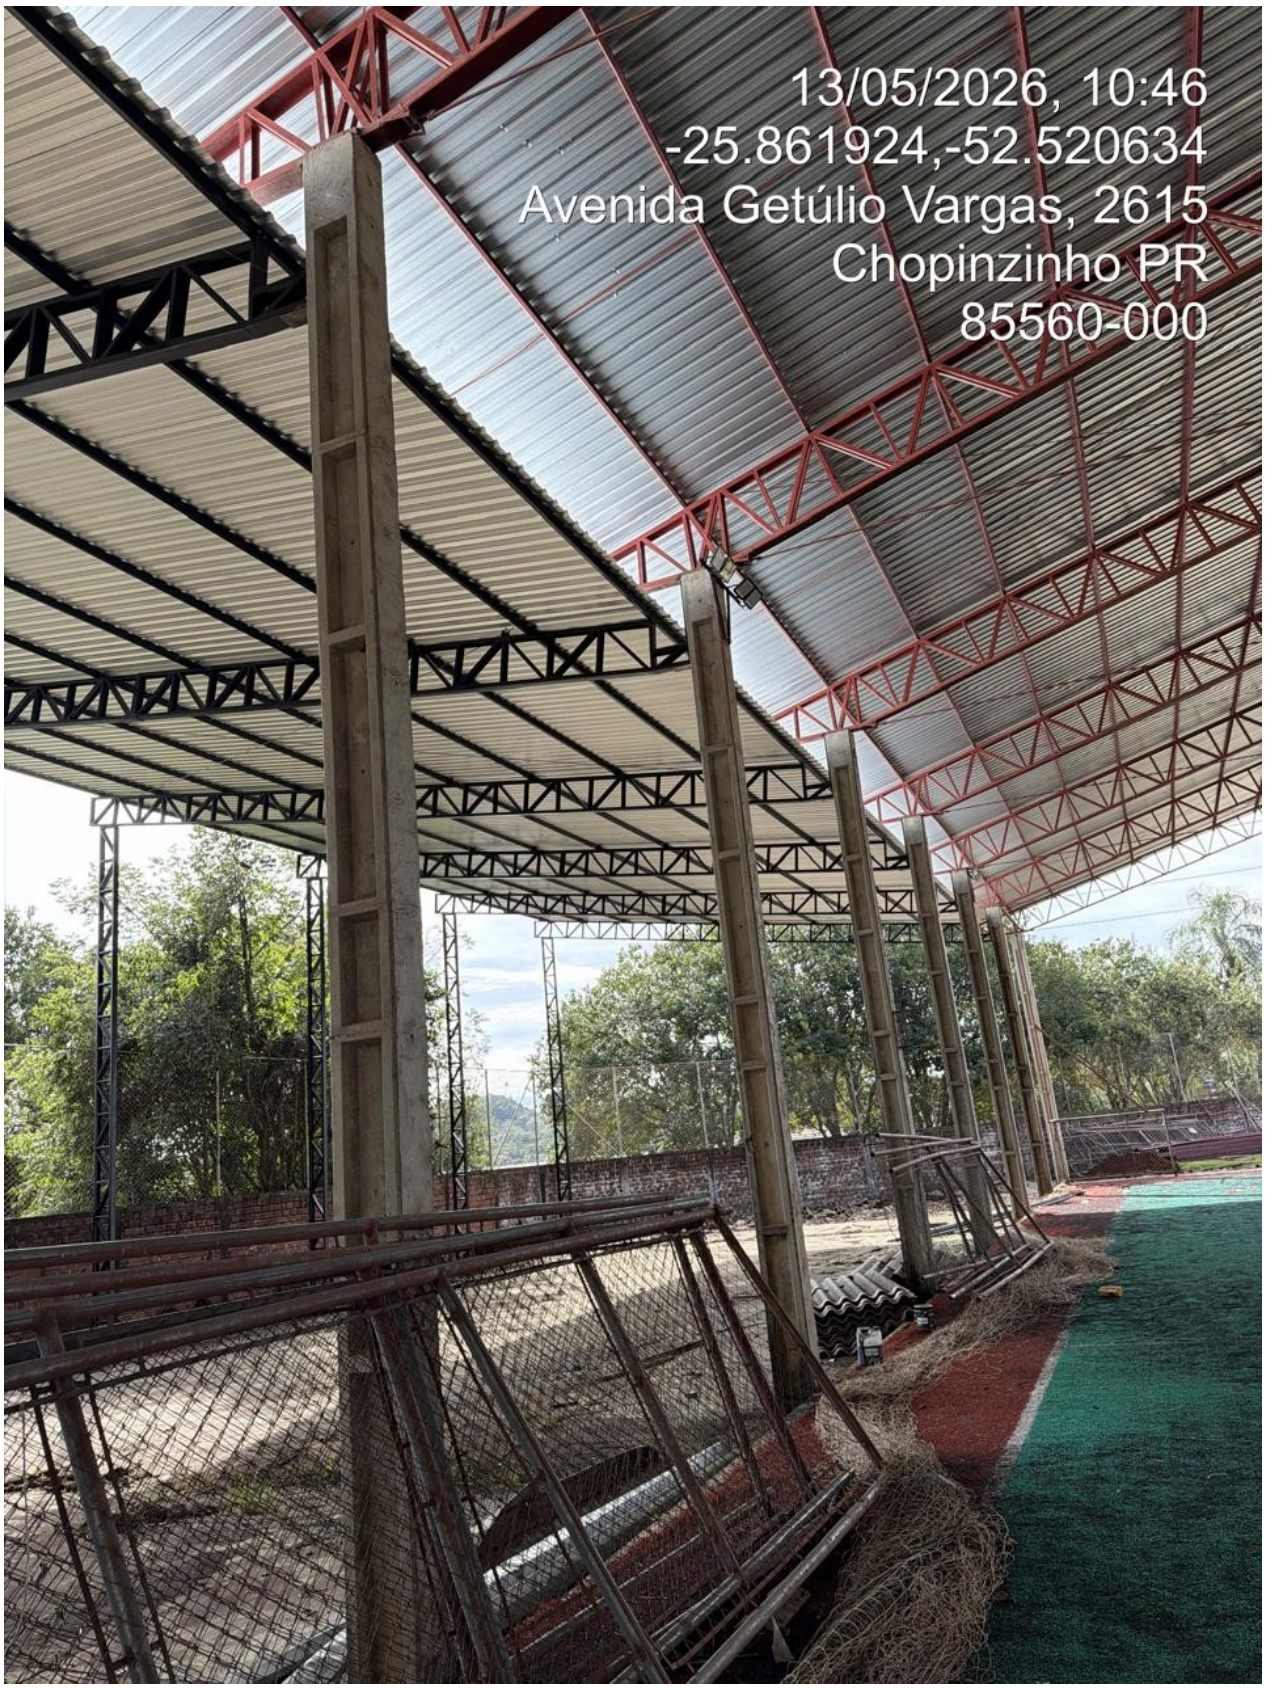


13/05/2026, 10:45
-25.861864,-52.520440
Avenida Getúlio Vargas
Chopinzinho PR
85560-000

43845afb-7980-4ca8-a91b-2b9bc0c2b330

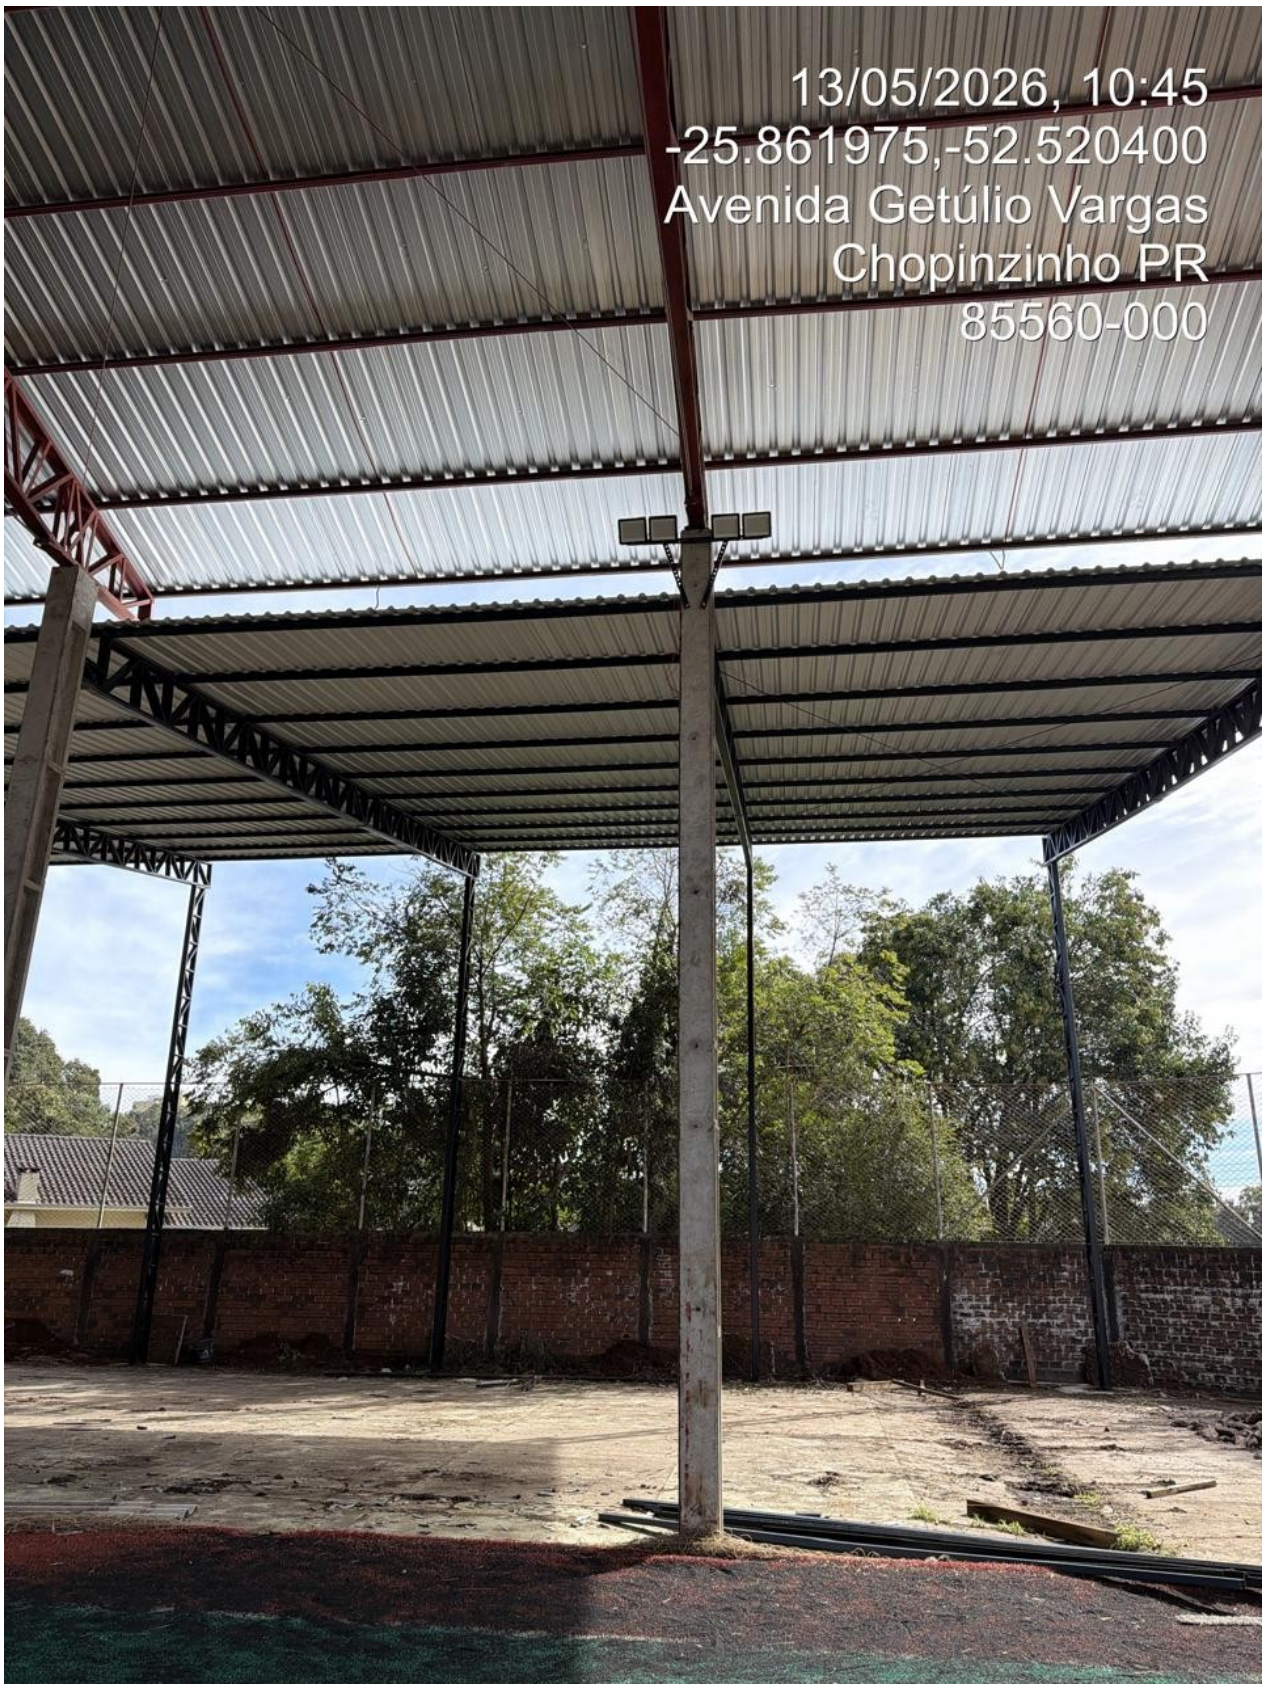

73ccd100-87ee-45a4-b627-82a738aa6130




13/05/2026, 10:45
-25.861787,-52.520463
Avenida Getúlio Vargas
Chopinzinho PR
85560-000

b32bbb7c-c87b-4371-8218-abf6876bad1b



dccb80ea-5364-4537-a819-ef473d442621




13/05/2026, 10:46
-25.861843,-52.520606
Avenida Getúlio Vargas
Chopinzinho PR
85560-000

eda1d0ce-569e-4cdd-baa0-346d46acd025



# WhatsApp Image 2026-07-14 at 15.11.59



# WhatsApp Image 2026-07-14 at 15.12.03



# WhatsApp Image 2026-07-14 at 15.12.05 (1)



# WhatsApp Image 2026-07-14 at 15.12.06 (2)



# WhatsApp Image 2026-07-14 at 15.12.07 (1)



# WhatsApp Image 2026-08-19 at 13.27.01 (2)



# WhatsApp Image 2026-08-19 at 13.27.02



# WhatsApp Image 2026-08-19 at 13.27.03



# WhatsApp Image 2026-08-19 at 13.27.04 (3)



# WhatsApp Image 2026-08-19 at 13.27.05 (1)

