Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:49:49

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
22	2026	OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DEFESA CIVIL **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 125/2026	180	08/05/2026	R$ 370.039,89	62,85%

Nº22/2026
Data Inicial: 08/05/2026

OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DEFESA CIVIL



R$ 370.039,89

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45660

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3513	2026	09/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1047	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/05/2027	125/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**04**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**04**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**54**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*3**80**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001505	R$ 370.139,89	17/03/2026	
Contrato	125	2026	76.995.414/0001-60	9001506	R$ 370.039,89	08/05/2026	62,85%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001507	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2026	13,66%

9001508	Medição	2	Jurisdicionado	10/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2026	39,70%
9001543	Medição	3	Jurisdicionado	10/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2026	62,85%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900291457777					

Nº22/2026
Data Inicial: 08/05/2026

OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DEFESA CIVIL

Documentos



R$ 370.039,89










Reforma e Adequação da Sede da Defesa Civil
Valor da obra: R$ 370.039,89
Local: Rua Getúlio Vargas, Chopinzinho/PR
Fonte de recurso: Recursos próprios
Prazo de execução: 180 dias
Empresa Exec.: B-ENG Construtora LTDA
CNPJ Empresa Exec.: 45.185.415/0001-15
Contrato nº 125/2026
Área total: 376,80 m²
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
DEFESA CIVIL

24d0fb51-7b42-4ef3-8eb3-db0aa8a93444




3d19d72d-0e90-4cda-9797-1bcae111c8ba



5673cb5c-3c8a-4c11-90f0-44b718bd7bb5



5fd64fe4-31b3-42d6-af98-5d0bc33e536b

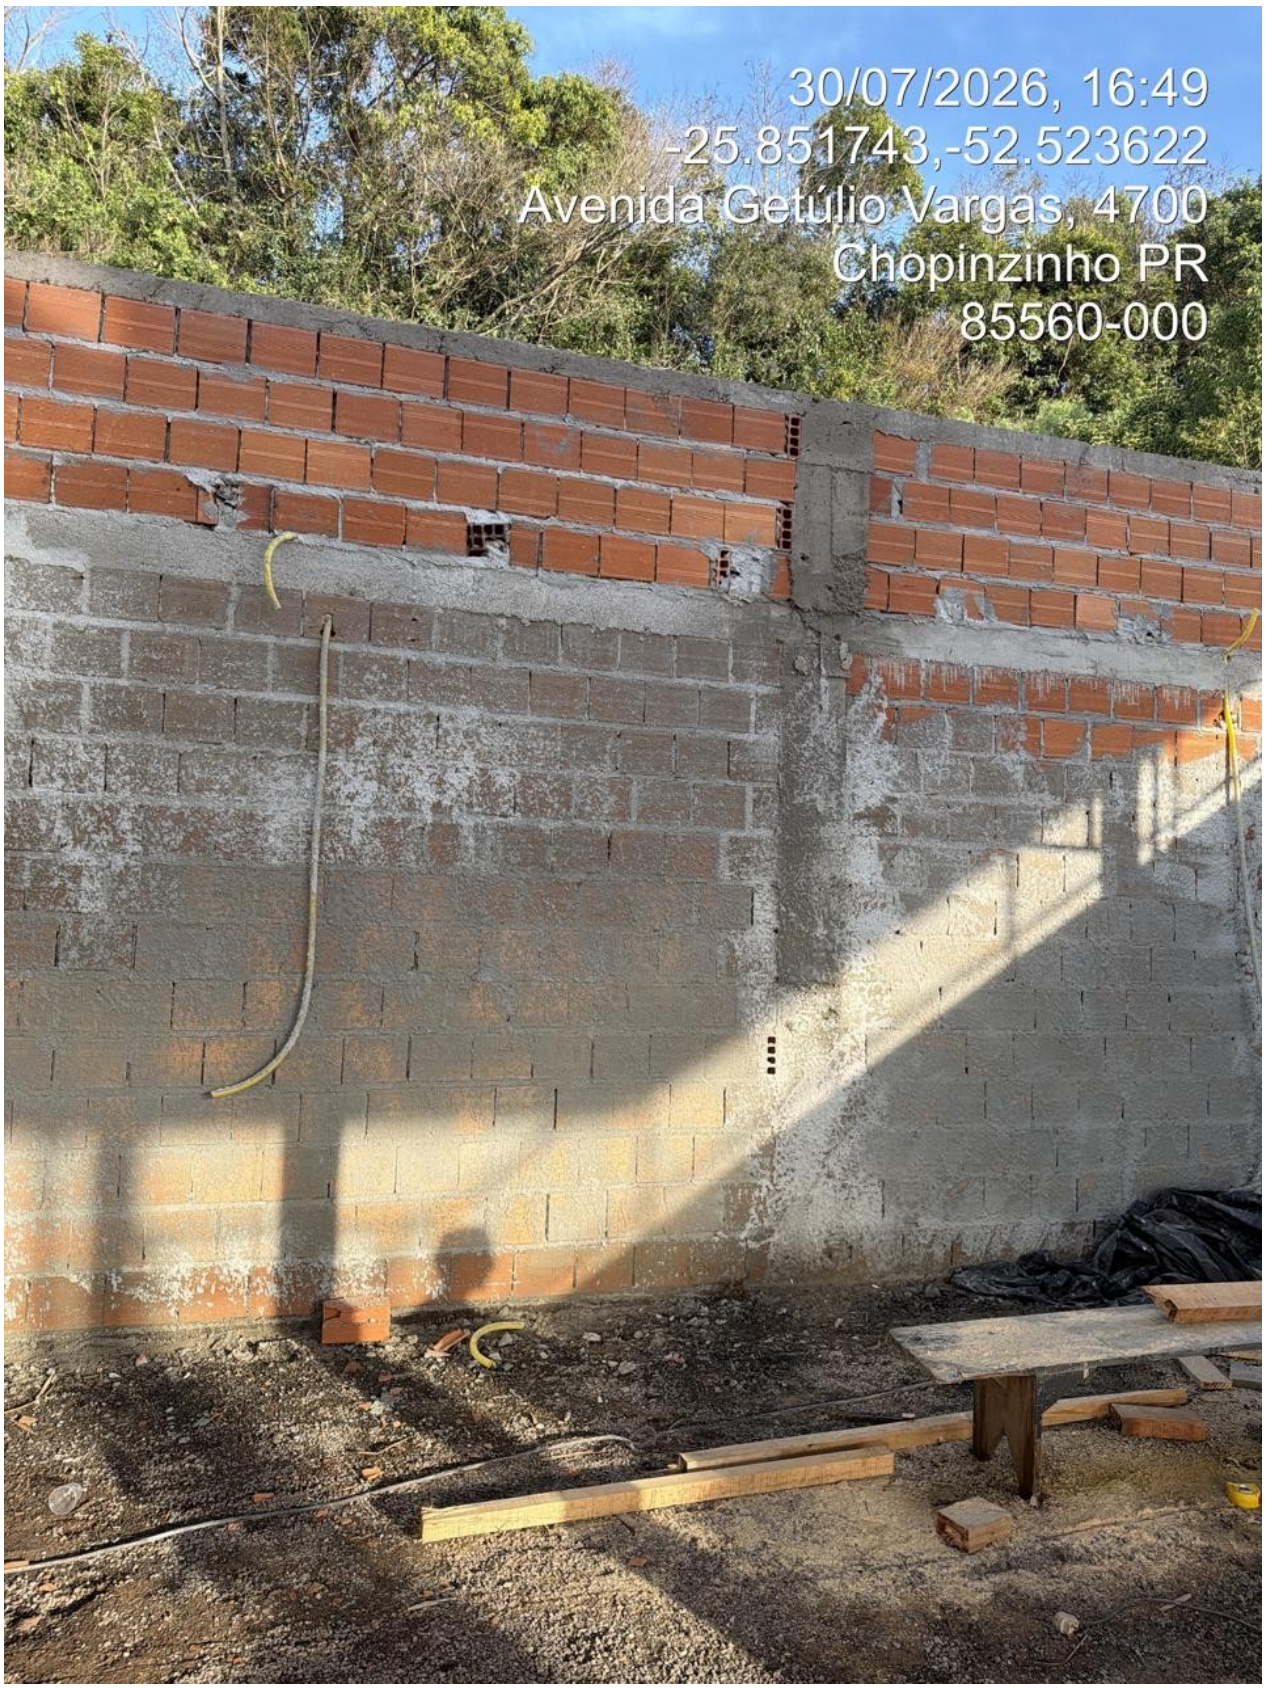

77f4fab8-822c-4705-966a-139679e98b88

